

BioBui(L)t

Txema

El proceso-documentos
Julio 2013-Noviembre 2014

versión beta 01

Elaborado por: Valentina Maini

Para: la asociación BaM

Prologo

Este documento es una relación de los pasos realizados alrededor de **15 meses** de intensa actividad de individuos, colectivos y empresas que permitieron la auto-construcción del edificio conocido como Espai Txema situado en la calle Montalegre 4, de Barcelona.

El arco temporal cubierto por el documento arranca en julio 2013 y termina en diciembre 2014. Estas dos fechas de “inicio” y “final” no corresponden a la historia completa del proyecto, corresponden con el **inicio y el final de una etapa marcada por la ausencia de un equipo gestor estable y con roles definidos.**

El arco de tiempo que aquí se documenta se ha dividido en **fases** que corresponden a inicio y final de **etapas** de desarrollo del proyecto. Los cambios de etapa corresponden a :

- cambios internos al proyecto: los espacios, herramientas, recursos personales
- cambios externos al proyecto: calendario del programa PladeBuits, calendario de gestiones económico-fiscales.

Los **cambios** internos y externos han coincidido siempre. Esta coincidencia no es casualidad, tampoco corresponde a un diseño planificado. La coincidencia corresponde coherentemente a un proceso que , teniendo en todo momento el objetivo temporal y programático presentado en la propuesta de concurso, se ha gestionado a partir del criterio del desarrollo orgánico en función de los **recursos y capacidades** (materiales y espirituales) disponibles.

Cada capítulo de este documento corresponde a una fase. La fecha de inicio y final de cada fase no es el resultado de un análisis realizada a posteriori. A lo largo del proceso de obra se comunicó el cambio de fase a todos los participantes mediante el cambio de título y numeración en el los eventos.

En este documento se ha querido privilegiar el orden temporal de los eventos como hilo de Ariadna para conducir por el desarrollo de los procesos, así el título de cada sección/evento es una fecha. Se mantiene el título original del evento en el subtítulo de cada sección.

El trabajo realizado para este trabajo ha consistido en:

- reunir en un único “contenedor” la información utilizada a lo largo del proceso para desarrollar la obra.

- escribir textos de introducción de cada capítulo y pies a fotos

La información aquí reunida ha sido, toda, publicada con anterioridad, ahora bien conviene especificar los datos siguientes:

- los **textos de convocatoria** a los eventos se han enviado por mail-list a todos los participantes registrados y se han publicado en el grupo abierto de facebook “Voluntarios del BaM”
- las **fotos** de los eventos , durante el proceso fueron publicada en redes sociales en forma de video archivado en la lista de reproducción del canal youtube de la asociación BaM, la notificación de publicación de los videos fue enviada a todos los participantes y co-financiadores
- los **textos de seguimiento** aparecen a lo largo de desarrollo de fase de crowdfunding y fueron recibidos por todos los co-financiadores y publicados en la pagina facebook de BaM
- los **documentos** se presentaron en ocasión de eventos y quedaron publicados en la plataforma on-line **Trello** utilizada por participantes integrados de forma activa en proceso de desarrollo del proyecto.

A lo largo de todo el proceso hubo muchos contactos particulares entre participantes y entre estos y empresas participantes contactos realizados por teléfono, mail, whatsapp o encuentros, con el objetivo de encontrar algún material o herramienta o capacidad profesional necesario para la obra. Los contenidos y resultados de estos contactos han sido compartidos, entre los participantes activos ,a lo largo de todo el proceso, mediante la plataforma **Trello**.

La gestión de los diferentes canales de comunicación ha sido un factor determinante a lo largo de todo el proceso. Podemos distinguir entre canales con **administración necesaria** (Pagina Web, Pagina Facebook, Eventbrite, Mailchimp, Youtube, Twitter, Goteo) - canales **de administración opcional** (Grupo Voluntarios Facebook, Trello) - canales de **comunicación personal publica** (Eventos) - canales de **comunicación privada** (Whatsapp, Telefono, Mail, Encuentros Personales).

A lo largo de los 15 meses de proceso ,toda la información necesaria para la toma de decisiones ha sido compartido en canales no administrados y abiertos a personas interesadas. Dos decisiones que se tomaron en el marco de la comunicación privada interna a la asociación BaM: la compra de material para responder a imprevisto y el presupuesto -programa para solicitud de subvención al Ayuntamiento de Barcelona

Notas de Lectura

Este documento está pensado para ser leído con la aplicación **ibook** disponible para OSX-iOS- WINDOWS. Esta aplicación permite integrar de forma interactiva documentos y fotos. La lectura en formato **pdf** eliminará la posibilidad de acceder al índice y a los contenidos multimedia.

Este documento es un **registro de actividades y documentos producidos** a lo largo de las mismas disponibles al colectivo de participantes. No representa un análisis de las mismas ni es un análisis del proceso realizado pero constituye la base documental mínima necesaria para que cualquier participante pueda recordar y revivir la experiencia vivida y también es la base documental mínima necesaria para que cualquier investigador de procesos participativos pueda estudiar el caso.

La lectura del proceso que se propone es por orden **cronológico**. En el Cap.3 correspondiente a la Fase 1 hay breves textos de presentación narrativa en cada sección que comentan el desarrollo realizado y se muestra el registro de las personas participantes en cada evento. A partir del Cap. 4 el texto de introducción se limita a una introducción de la fase al principio de cada capítulo.

Se ha decidido **dejar la “narrativa”** de introducción a partir del capítulo 4 , dejando que sean solo los textos enviados en las convocatorias a hablar para poner en mas evidencia el esfuerzo y los límites de la comunicación del proyecto realizada durante su proceso.

Las **dinámicas** del proceso a lo largo de todos los 15 meses son ya todas presentes en la primera fase de re-diseño especialmente en referencia a la modalidad de participación y gestión. En particular podemos señalar :

- casi nunca las **personas registradas** corresponden a las **personas realmente presentes** en los eventos

- hay **personas no registradas** que han participado activamente, su participación queda documentada en fotos del evento
- en cada evento aparecen personas que no han participado en eventos anteriores
- todas las personas registradas participan en varios eventos
- ninguna persona participa a todos los eventos
- solo 2 personas de un total de 230 participantes registrados han mantenido participación constante a lo largo de todas las fases y todos los eventos (en la primera fase fueron 4 de 53)
- evento después de evento se ha incrementado el alcance de los canales de comunicación que han ido incorporando nuevos participantes
- una sola persona a participado de forma pro-activa (gestión y producción) en **todos los canales de comunicación**
- los videos de youtube con las fotos de obra publicadas después de cada evento han sido esenciales para mantener el lazo con los co-financiadores en fase de crowdfunding , con los participantes no comprometidos con el proyecto que han podido seguir su desarrollo paso a paso aun sin “narrativa “ y con agentes externos que se han ido acercando conforme el proyecto adquiría mas visibilidad
- los eventos y la presencia en el espacio físico han sido el motor esencial para la integración en el proyecto de nuevas personas-nuevas energía -nuevos recursos
- la plataforma on-line Trello ha sido crucial para mantener en contacto y comunicados los participantes comprometidos con el proceso y que no tenían la posibilidad de participar físicamente en lo eventos, seguir y contribuir en el proceso de diseño, gestión y toma de decisiones. La publicación de dicha comunicación comprometería la privacidad de los participantes.
- en cada fase la plataforma Trello ha ido integrando nuevos participantes comprometidos en la organización y desarrollo.
- en cada fase se ha debatido sobre criterios y limitaciones de acceso a la plataforma, criterios y limitaciones que fueron cambiando en cada fase.

OpenSpace

Fase 1. Re- diseño Julio Septiembre 2013

En esta fase el proyecto se abre a tod@s los interesad@s. Es una fase crucial en la cual:

- se redefine el diseño del edificio a realizar
- se prepara la campaña de **crowdfunding**
- se experimenta con todo el potencial positivo y negativo del proceso

La situación del proyecto en el momento de iniciar esta fase se puede definir como resultados de los eventos y procesos acontecidos en la fase anterior.

En el mes de Junio sabemos que:

- el proyecto ha sido aprobado por el Ayuntamiento
- la fecha inicial prevista para entrar en el solar se va aplazando y no esta definida
- el Ayuntamiento espera los documentos para la solicitud de licencia de obra
- la Asociación BaM ha conseguido la subvención del Colegio de Arquitectos que otorga al proyecto 7500€ a gastar entro el 2013.
- el ingreso de la subvención será posterior a la presentación de las facturas y justificación de actividades
- la Asociación BaM ha realizado varios encuentros con las personas integrantes el equipo de concurso miembros de la asociación misma u de las otras entidades participantes
- entre las entidades y personas integrantes el equipo de concurso se registra la baja de un partner: Meridiano 70 y Medio
- dos de los 4 miembros de la junta de BaM han manifestado su imposibilidad a participar en el desarrollo del proyecto
- hay muchas personas externas a BaM y a las entidades colaboradoras del concurso que han manifestado su interés en el proyecto y están solicitando participar en él

Indice de decisiones elaboradas en eventos de esta fase

BioBui(L)t-01:

- integración de la demanda de participación recibida
- definición de objetivos e intereses temáticos

BioBui(L)t-02:

- visita al solar
- comprobación medidas y contexto del solar

BioBui(L)t-03:

- visión de objetivos y datos disponibles
- elaboración individual de propuesta de proyecto

BioBui(L)t-04:

- definición áreas temáticas de interés personal
- selección aspectos más atractivos de las propuestas de proyecto

BioBui(L)t-05:

- organización de las propuestas de proyecto según modelo de implantación en el solar
- elección del modelo de **ocupación** preferido entre las tipologías presentes entre las varias propuestas

BioBui(L)t-06:

- organización de las propuestas de proyecto según modelo de implantación en el solar
- elección del modelo de **planta** preferido entre las tipologías presentes entre las varias propuestas

BioBui(L)t-07:

- elaboración de detalles constructivos por cada muro/material

BioBui(L)t-08:

- evaluación del recorrido realizado y ensayo video para crowdfunding

BioBui(L)t-09:

- grabación video de crowdfunding
- re-bautizo del proyecto en homenaje a Txema de Miguel

Section 1

02|07|13

BioBui(L)t-01

Este evento marca el inicio de la fase de rediseño participativo del proyecto. La dinámica de organización, comunicación y producción de contenidos que se establece en este primer encuentro se mantendrá y se perfeccionará a lo largo de todos los encuentros que definen esta fase.

El esquema de proceso de cada convocatoria de los eventos ha sido el siguiente:

1. Convocatoria a evento presencial por mail via **Eventbrite** + Publicación evento en Redes Sociales de la Asociación : Pagina Facebook y Grupo Voluntarios BaM en Facebook. La convocatoria implica la elaboración de un texto y de una imagen de “portada” o **Cartel** del evento
2. Preparación del evento y del espacio: presentaciones ppt, materiales para trabajar: papel-rotuladores-post.it, etc..., coordinación con equipo de gestión del **Casal de Barri Pou de la Figuera**
3. Participación y documentación fotográfica del evento
4. Montaje de documentación fotográfica del evento en video
5. Envío de mail a todos los asistentes al evento (via **Eventbrite**) con comentarios de retorno y enlace al video colgado en **Lista de Reproducción** dedicada al proyecto en Youtube
6. Evaluación y definición programa de siguiente convocatoria

En esta fase cada convocatoria ha correspondido a un paso concreto en la re-definición del diseño, basado en las conclusiones de la convocatoria anterior.

Cada evento es un momento con entidad y valor propio en si concluso. Cada evento define un “**feedback**” - retorno y un “**feedforward**” - consecuencias que determinan en gran medida las características del paso/evento siguiente.

Los 6 pasos mencionados en esta fase han sido llevados a cabo por una sola persona. Puntualmente los **asistentes** a los eventos han participado en la preparación y limpieza del espacio antes y después de cada evento.

Vamos presentar el rastro de datos y documentos todos publicados

Cartel 3.1



Todas las actividades en el Casal de Barri se deben anunciar colgando carteles en la puerta y son accesibles a cualquier ciudadano

Agenda del Evento

Junio 26, 27, 30 envío mail - eventbrite convocatoria + grupo facebook

Julio 01 envío mail - eventbrite a los asistentes

Julio 02 evento en Pou de la Figuera 4 horas de duración

Julio 04 publicación de **video** "acta" del evento en lista de reproducción youtube

Julio 04 mail - eventbrite de retorno a los asistentes

Julio 09 convocatoria siguiente evento



Figura 3.1

Imagen del proyecto de concurso elegida para ilustrar la convocatoria del evento

56 Invitaciones enviadas- 34 pedidos confirmados

Texto Convocatoria -Junio 26 (6 días antes del evento)

Estamos aprendiendo a usar herramienta Eventbrite y no nos deja colgar imágenes y videos como nos gustaría:-) De momento os enviamos esta convocatoria en este formato para ayudarnos a tener lista de quien participa a los eventos y volver a contactar con mas facilidad.

En este evento vamos a trabajar sobre el proyecto de sala BioBui(L)t presentado por BaM.

Vamos a probar la modalidad de organización de la reunión en **OpenSpace!**

Al final del evento celebraremos un encuentro fiesta con miembros de entidades afines EcoUnion y Permacultura Barcelona!

Os esperamos!

Equipo BaM

Mails a los asistentes

Julio 01: Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola! Que bonito el interés que ha despertado esta convocatoria!

ya tenemos las plazas cubiertas ...pero los que se apunten en la lista de espera podrán entrar también!(tenemos sala grande...por acústica no queremos ser más de 30 ahora somos 27) ..

La reunión será en formato taller open-space, es la primera vez que usamos esta metodología!! Mucha curiosidad!!

Lo importante es que sepáis que no se necesita nada para participar... solo vuestra presencia y pasión /curiosidad por una forma de construir más sana y bonita.

La primera media hora os presentaremos el proyecto y la metodología open-space. Esperemos empezar puntuales.

Nos vemos Mañana! Gracias de nou a tod@s!!

PD:

No hace falta imprimir las entradas!! estamos aprendiendo a usar esta herramienta!! Igualmente si alguien tiene ganas de imprimir su entrada..genial así comprobamos el sistema!!

Julio 04: Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Estimad@s Asistentes a BioBui(L)t 01,

Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por vuestra valiosa y entusiasmante participación en este primer taller de "revisión y seguimiento" participativo del proyecto BioBui(L)t.

Esperamos que la experiencia haya sido bonita e interesante para vosotr@s!

Próxima cita el 16.7 en maravilloso espacio de SiteSize, os enviaremos invitación la semana que viene.

Aquí abajo tenéis un pequeño montaje de fotos (si queréis compartir vuestras fotos genial!!!..podéis enviar por mail).

Muchas gracias de nuevo i fins aviat!! Ha sido un placer

PD: Sandra Martin y Lara Moreno asistieron pero no dejaron su mail ¿alguién las conoce y puede reenviar y/o pedir que se pongan en contacto con BaM al mail

info@bamconf.org

aquí peño montaje foto...muy mejorable :-)

<http://youtu.be/XOn72dl7O0U>

Docs. Evento 3.1 Presentación realizada durante el evento



17.00-17.30

-Intro BioBui(L)T
-Intro OpenSpace

17.30 18.15

Inicio Open Space

18.15 19.30

Reuniones

19.30 20.30

Conclusiones

Los Medios del evento

Espacio y medios del Casal

Sala de aprox. 90m2
Proyector y Pantalla
Sillas, Mesas
Gestión llaves

Medios propios

Ipad
Iphone

Medios adquiridos

Papel Kraft, Rotuladores, Post-It, Etiquetas
Impresión de etiquetas

Documentos Preparados

Presentación Keynote-PowerPoint
Esquema presentación dinámica
OpenSpace
Etiquetas Registro de Asistentes

Software empleado

Plataforma EventBrite, Facebook
Keynote09, Pages09
Penultimate, Iphoto
Youtube

Autores imágenes y documentos

Valentina Maini:
Cartel, Presentación ppt, Memoria Gráfica del Concurso Fotos, Video, Textos


Gemma Paone:
Visualización de TimeLine propuesta de Proyecto presentada para el concurso

Jelena Grujic:
Visualización 3D de propuesta de Proyecto presentada para el concurso

Portada de inicio con agenda del evento

Fotos Evento 3.1

Los Participantes después de Brainstorming inicial se organizan por mesas temáticas



Los Asistentes Registrados

(no todos los asistentes registrados resultaron efectivamente presentes por toda la duración del evento) en blanco las personas cuyo CV o Nombre se presentó en la documentación del concurso.

Albert Aira Pérez,
Angel Estevez,
Beatriz Cristobal Rodriguez,
Benjamí Aguilar,
Carmelo Gómez Pons,
Cristina Coronil Belloso,
Fatima Ramos
Cristina Casali Taberner
Elena Guim

Elisabet Silvestre
Elvira Pujol

Gaspar Alloza Ginés
Inma Bernardos
Iván Aguilar Lardies

Joan Vila Puig

Júlia de Orovio

Gemma Paone

Iciar Sen López
Lia Urdaneta
Maria Laura Del Tonto
Mar Dombriz Mendoza
Martin Krug
Michela Pes
Miguel Muelas
Paqui Sánchez Bermúdez
Susana Giménez
Sarah Daher
Sonia Hernandez
Susana Osés Aguilar
Teresa Bofill

Toni Solanas Cánovas

Txema De Miguel

Valentina LiPuma

Valentina Maini

Section 2
16|07|13
BioBui(L)t-02

Este evento en principio **estaba pensado para realizarse en espacio de la entidad colaboradora SiteSize** . En cambio se transforma en una vista al solar.

Se mantiene la fecha prevista pero se modifica el programa del evento.

Esta será una dinámica (mantener la fecha y cambiar el program) muy frecuente a lo largo de todo el proyecto. Una dinámica que ha sido tan eficaz cuanto difícil de compartir en su valor y en sus consecuencias entre los participantes al proyecto.

Una dinámica que, según una imagen de Brian Robertson, se puede explicar en toda su eficacia si se compara la gestión de procesos a lo que significa ir en bicicleta: cuando vamos en bicicleta estamos realizando de forma automática continuos ajustes de rumbo, maniobrando el manillar o las marchas o la fuerza en los pedales, si tuviéramos que planificar estos ajustes antes de subir a la bici se trasformaría en una pesadilla lo que de otra forma resulta una operación natural aunque implique procesos cognitivos complejos. Por otro lado es evidente también con la metáfora de la bicicleta que aun cambiando ritmos y/o dirección es esencial que se mantenga el movimiento, que el paso no se quede a medio realizar, que el pedal no se bloquee.

En el caso particular de este evento el proceso de convocatoria sigue las **pautas ya descritas** el cambio de programa se ajusta a las siguientes circunstancias:

- La demanda de contacto con el espacio real había sido muy fuerte en **evento precedente**, la falta de datos y visión del contexto es un



Primer encuentro colectivo en el espacio, vista mirando al Macba .

obstáculo al desarrollo de propuestas concretas.

- No se dispone de programa de actividad concreto preparado a tiempo para pre-disponer el espacio ofrecido por SiteSize y realizar la convocatoria con “orden del día” y/o objetivo concreto
- La ambición de las ideas propuestas en el Open Space sugieren la oportunidad de un saludable contacto con el espacio real y los retos de autoconstrucción en pleno centro urbano.

Agenda del Evento

Julio 09 envío mail - eventbrite convocatoria + grupo facebook

(en esta fecha también se envía convocatoria para evento siguiente previsto para el 23 de Julio)

Julio 16 evento en c/**Montalegre** 4 2horas de duración

Julio 16 publicación de **video** “acta” del evento en lista de reproducción youtube

Julio 16 mail - eventbrite de retorno a los asistentes

41 Invitaciones enviadas- 24 Pedidos confirmados -18 Participantes

Texto Convocatoria -Julio 9 (5 días antes del evento)

Hola a tod@s, Continúa el viaje hacia BioBui(L)t! Próximas etapa: "Composición de Lugar"

16.7 Martes a las 8.15 de la mañana visita al solar en compañía de representantes del Ayuntamiento

Mediremos con nuestras manos y pies el espacio. Comentaremos los trabajos previos que realizará el ayuntamiento y

Tendremos más experiencia y datos para preparar el "Full Immersion Design Workshop" de la semana siguiente!

Os esperamos!

ahhh! hemos habilitado la opción de "donación" para los eventos...así si queréis podéis aportar via paypal o en efectivo el mismo día ... la voluntad.... podríamos decir un "mini crowdfunding" para el proyecto...no es obligatorio

Mail a los asistentes -Julio 16 (mismo día del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Ha sido una primera hora de la mañana fantástica!! aquí tenéis el enlace a montaje fotos de esta mañana! Graci@s a todos!!

Esperamos confirmar el lugar y el programa/materiales de trabajo del próximo BioBui(L)t.03 entre mañana y jueves!!

<http://youtu.be/MMgVkmTEjFI>

Fins Aviat!

Los Medios del evento

Espacio y medios de c/Montalegre

Gestión llaves con Ayuntamiento

Medios propios

Cámaras de fotos

Iphone

Cinta Metrica

Medios adquiridos

-

Documentos Preparados

-

Software empleado

Plataforma EventBrite, Facebook

Iphoto

Youtube

Autores imágenes y documentos

Alvaro-Arnau:

Foto de portada del capitulo

Valentina Maini:

Fotos, Video, Textos Convocatoria

Miquel René:

Fotos

Fotos Evento 3.2

Vista del solar : valla blanca instalada por Ayuntamiento en marco de proyecto **Pla de Buits** (es visible la valla antigua pre-existente)



Los Asistentes Registrados y los Participantes

En blanco las personas cuyo CV o Nombre se presentó en la documentación del concurso. En gris personas que realizaron el registro pero no asistieron al evento. En Rojo personas que aparecieron sin realizar el registro

Alicia Tornos
Arnau Bujons
Beatriz Cristobal Rodriguez,
Carmelo Gómez Pons,
Cristina Coronil Belloso,
Fatima Ramos
Cristina Casali Taberner
Elena Guim

Elvira Pujol

Gaspar Alloza Ginés
Inma Bernardos
Iván Aguilar Lardies

Jonathan Minchin

Joan Vila Puig

Júlia de Orovio
Kathrin Pongratz
Lia Urdaneta
Maria Laura Del Tonto
Michela Pes
Miguel Muelas
Paqui Sánchez Bermúdez
Susana Giménez
Sarah Daher

Sonia Hernandez

Susana Osés Aguilar
Sandra Martin Lara
Arnau (Amigo de Julia)

Txema De Miguel

Valentina LiPuma

Valentina Maini

Section 3

23|07|13

BioBui(L)t-03


En BioBui(L)t-02 hemos comprobado el atractivo y reto de la relación con la iglesia y hemos descubierto que es necesario mantener un paso en “nuestro solar” que permita acceder al patio detrás de la iglesia misma, como puede verse en plano topográfico del ayuntamiento que conseguimos obtener.

El Tiempo apremia, para Setiembre hay que presentar documentos de proyecto para obtención de licencia de obras. Para octubre está prevista la concreta cesión del solar (en realidad habrá aplazamientos hasta noviembre).

Y apremia también la preocupación por la financiación.

En este momento el proyecto dispone de 0€ en caja. La ayuda del Colegio de arquitectos solo se otorgará una vez realizado el gasto.

En BioBui(L)t-01 se ha definido un programa de construcción mucho más ambicioso del programa previsto en el concurso se ha pasado de propuesta “monomaterial” a demanda de integración de varios materiales de interés y competencia de los participantes.

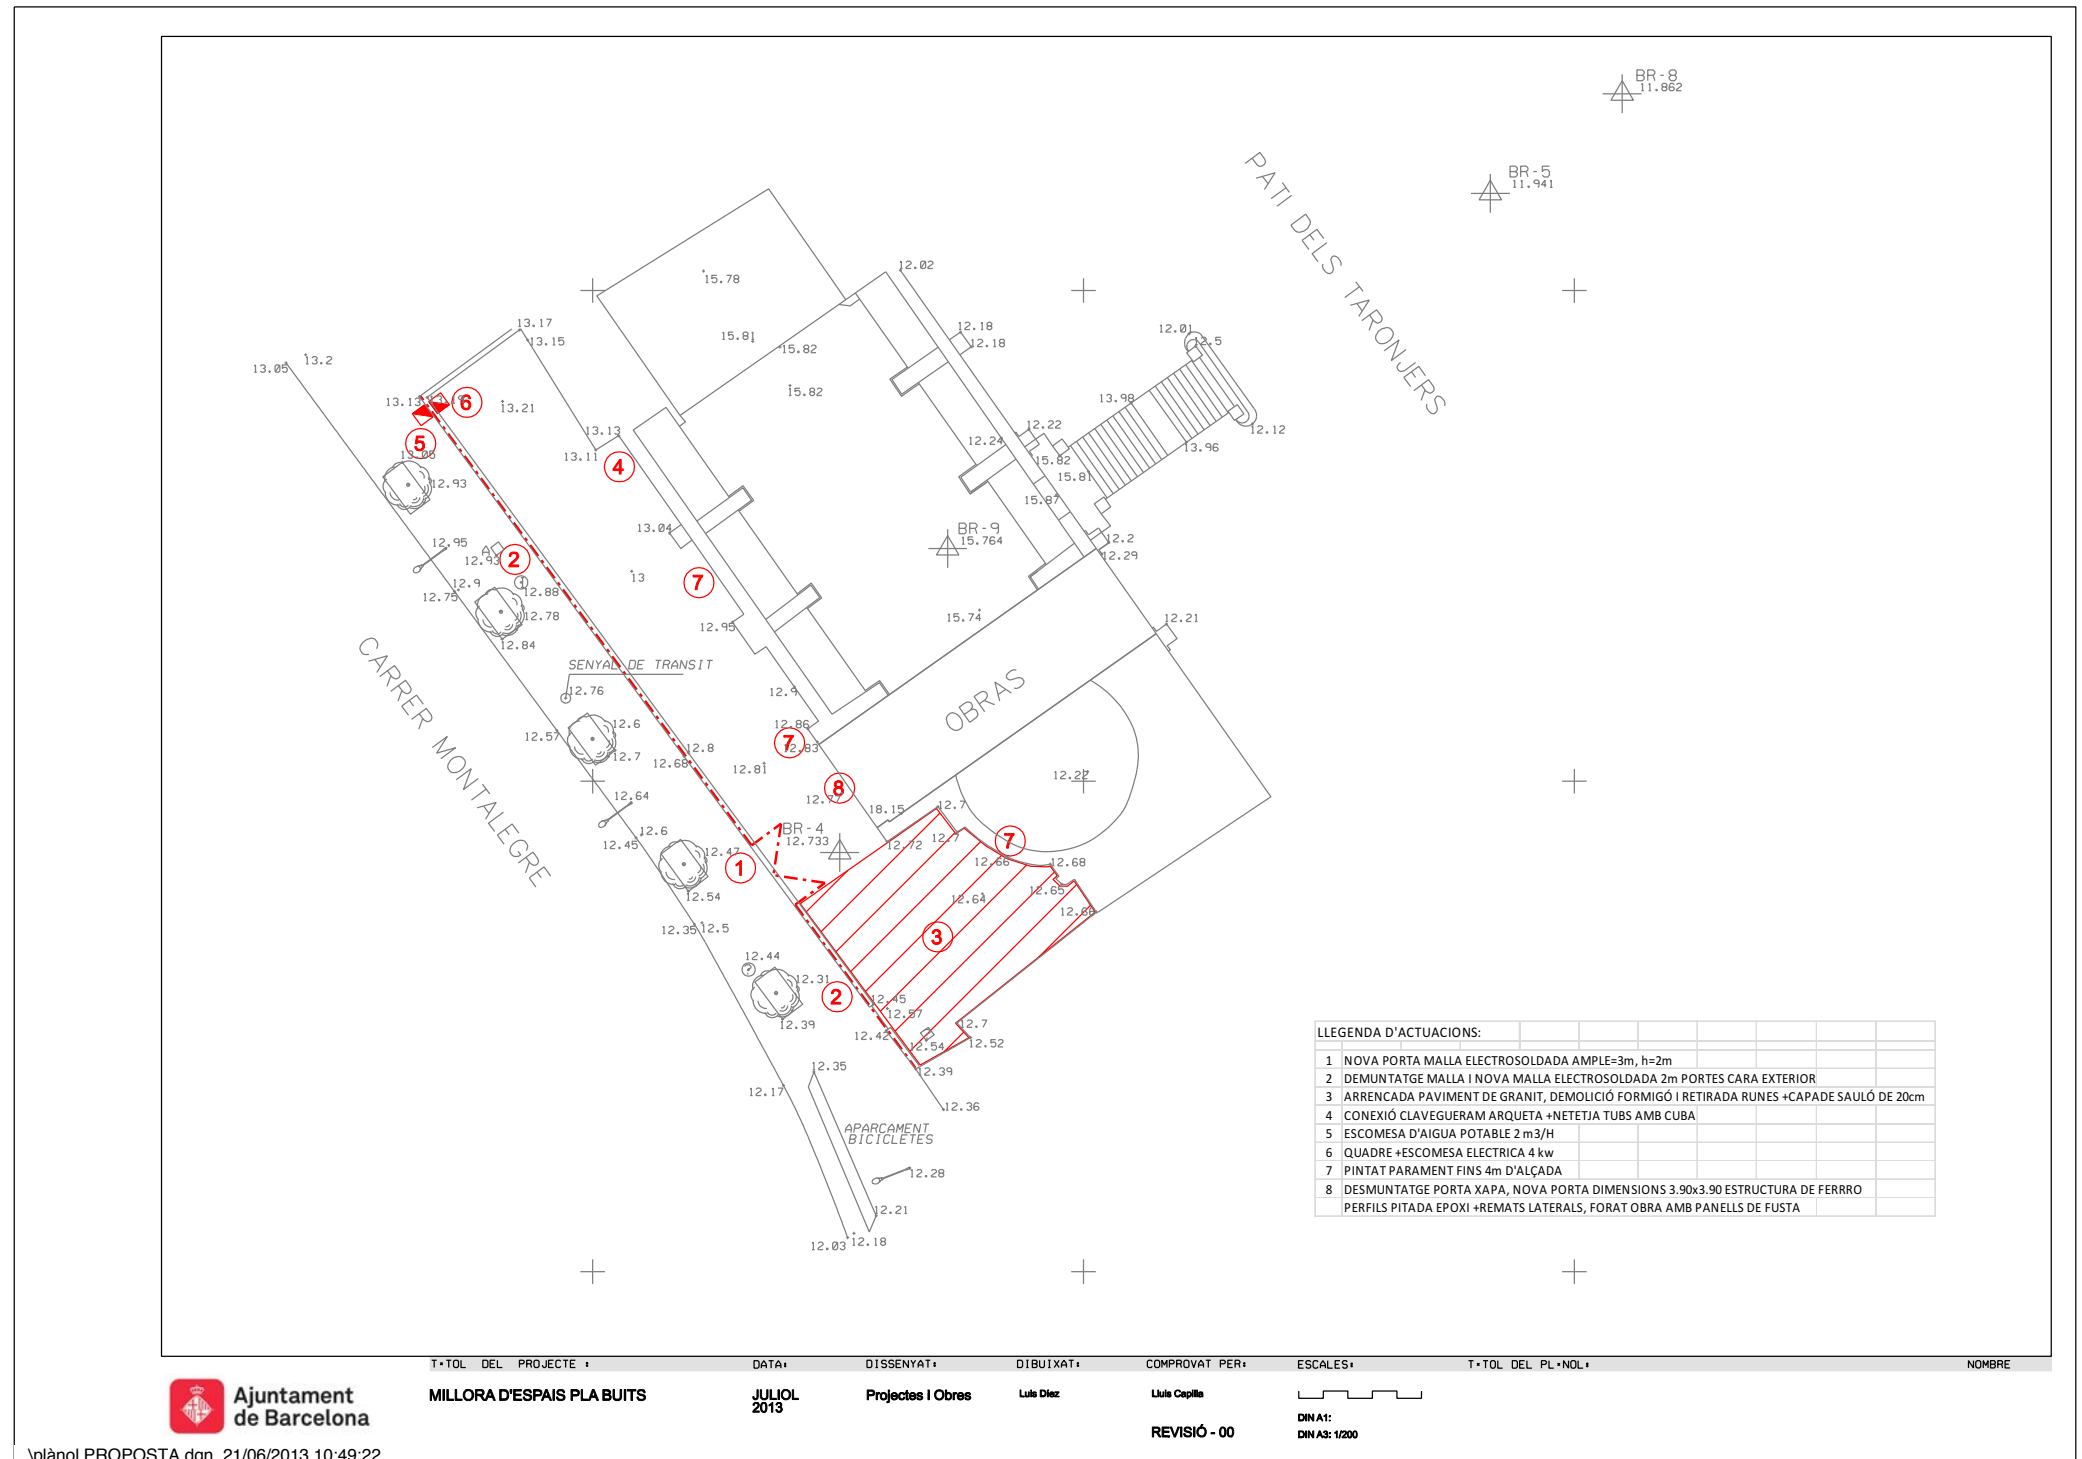

Agenda del Evento

Julio 09 envío mail - eventbrite convocatoria

Julio 18 envío mail - eventbrite convocatoria + grupo facebook

Julio 22 envío mail - eventbrite convocatoria + grupo facebook

Julio 23 evento en Pou de La Figuera 5horas

Julio 23 publicación de **video** "acta" del evento en lista de reproducción youtube

Julio 24 mail - eventbrite de retorno a los asistentes y convocatoria evento siguiente previsto para el 30 de Julio

44 Invitaciones enviadas- 25 Pedidos confirmados -18 Participantes

Texto Convocatoria -Julio 9 (14 días antes del evento)

El tercer encuentro hacia BioBui(L)t será un momento importante en la definición de proyecto! Después del BioBui(L)t.01- OpenSpace y el BioBui(L)t.02 de Composición de Lugar en este encuentro trataremos de hacer un proyecto en toda regla de forma colectiva!! para ellos seguiremos una modalidad de trabajo intensiva. Individual y Colectiva cada uno podrá expresar su visión/particular única...

Un saludo,

BaM Bioarquitectura Mediterránea

Texto Convocatoria -Julio 22 (recordatorio 1 día antes)

El tercer encuentro hacia BioBui(L)t será un momento importante en la definición de proyecto! Después del BioBui(L)t.01- OpenSpace y el BioBui(L)t.02 de Composición de Lugar en este encuentro trataremos de hacer un proyecto en toda regla de forma colectiva!! para ellos seguiremos una modalidad de trabajo intensiva. Individual y Colectiva cada uno podrá expresar su visión/particular única... Tenemos material preparado para el encuentro: @Alvaro @Valentina LiPuma @Elena @Sandra @Gaspar @Michela @Julia han estado compartiendo y profundizando en los temas del BioBui(L)t.02, tenemos problemillas con internet y no podemos enviar todo antes pero estará a disposición el martes!

Hay 20 personas apuntadas...y todavía tenemos espacio...pero es muy importante que los que quieran participar se apunten ...para preparar el pequeño taller! Si tenéis un lapiz /boli preferido para vuestros proyectos...traer lo que os pueda servir para elaborar proyecto (a mano)... un abrazo a tod@s y hasta mañana!

Texto mail a los asistentes y Convocatoria - Julio 24 (6 días antes del evento)

Hola a tod@s!

Después de **BioBui(L)t.01** "Open Space" de definición programa, **BioBui(L)t.02** "Medidas relativas" y **BioBui(L)t.03** "Composición de lugar"....seguimos con BioBui(L)t.04 . "Estructura".

El próximo martes en el casal del Barri Pou de la Figuera nos proponemos:

- **Conocer**-10 a 10.30 aprox: Organizar la definición de proyecto/actividad en grupos de interés de 10 a 10.30 aprox:

La idea es organizarnos según modelos de "guerrilla" pero transparente: pequeños grupos de 3 ágiles y de movimiento rápido ...pero a diferencia de modelos "clandestinos" cada grupo tiene elemento de contacto/cadena de transmisión con otros grupos.... y comunicación constante con "espina dorsal".... vamos a crear red neuronal y cadena transmisión nervios/ músculos :-)

Territorio: Recogida Información contexto y preparación charla Open air "entrada en parcela"

Materiales: Seguimiento detalles de proyecto/mediciones/suministro/logística

Innovación: Preparación campaña crowdfunding con todas entidades colaboradoras

Formación: Reparto talleres de obra y gestión de grupos de trabajo

Legislación: Seguimiento pla de seguretat y preparación ensayo

- **Actuar:** 10.30 a 13.30: Análisis de las propuestas presentadas en BioBui(L)t.03 y elección de Volúmenes y programa:

Presentación propuestas por familias- Recursos Disponibles- Esbozo calendario fases de construcción

Reflexión/decisión ¿Con que nos quedamos?

El reto es: seleccionar lo mejor de cada propuesta e integrar con coherencia los elementos que nos interesa en una propuesta única.....proyecto colectivo con agilidad!!

- **Imaginar:** 13.30 a 14.30: Visiones "Estructuras Recíprocas".... compartiremos la inspiración y veremos como participar en taller con Re-Cooperar/LaSalle estructuras recíprocas en Fabra i Coats entre 12 y 17 de Septiembre.

Acordaros de registrar vuestra entrada y sobre todo añadir vuestro perfil a la herramienta **sharetribe** la Tribú Compartida de BioBui(L)t...cualquier duda que tengáis para registraros en esta herramienta de intercambio.... podéis enviar "mail a organizador"...

Nos vemos el Martes!


...disculpar todavía está pendiente actualizar imágenes con logos de nuevas entidades colaboradoras :

Red de Construcción con Paja, Permacultura Barcelona y ESFA

Docs. Evento 3.2 Presentación preparada para el evento Introducción al evento



Se empieza recordando los pasos anteriores (se repiten imágenes de BioBui(L)t-01)



Los Medios del evento

Espacio y medios de Pou de La Figuera

Gestión llaves con equipo Pou
Pantalla-Proyector
Mesas-Sillas

Medios propios

Iphone, Ipad

Medios adquiridos

Papel Cebolla
Fotocopias plano topografico del ayuntamiento
Fotocopias Croquis de Alzado del Solar

Documentos Preparados

Presentación power point

Software empleado

Plataforma EventBrite, Facebook
Keynote-Iphoto
Safari, Youtube
Ecotec (Valentina Li Puma)

Autores imágenes y documentos

Alvaro, Sandra Martin, Elena Guim:
Mapas de archivo histórico,
Enlaces a documentación

Valentina Maini:
Presentación power point,
Fotos documentación evento,
Video,
Textos Convocatoria

Valentina LiPuma:
Estudio Solar

(Julia de Orovio ya ha enviado por mail avances de su trabajo de mapeado del barrio, su trabajo no se presenta en este evento ya que no afecta el diseño)

Los Asistentes Registrados y

Fotos Evento 3.3 Las propuestas de diseño



Después del repaso de pasos previos (1h) cada participante dispone de 2h para elaborar una propuesta, en la última hora del evento se realiza la presentación individual de cada propuesta y una breve análisis de los elementos mas significativos de todas ellas



los Participantes

En blanco las personas cuyo CV o Nombre se presentó en la documentación del concurso. En gris personas que realizaron el registro pero no asistieron al evento. En Rojo personas que aparecieron sin realizar el registro

Arnau Bujons
Carmelo Gómez Pons,
Fatima Ramos
Alfredo Lombardi
Clara Diego
Cristina Casali Taberner
Elena Guim

Elvira Pujol

Gaspar Alloza Ginés
Inma Bernardos
Iván Aguilar Lardies

Jelena Grujic
Jonathan Minchin
Joan Vila Puig

Júlia de Orovio
Lia Urdaneta
Maria Laura Del Tento
Michela Pes
Mar Dombriz
Miguel Muelas
Susana Giménez
Sabina Selli
Sandra Martín Lara
Sarah Daher

Sonia Hernandez

Victoria Chamo
Valentina Maini

Section 4

30|07|13

BioBui(L)t-04

Ultimo encuentro antes de la pausa de eventos de agosto.

Tenemos 18 propuesta de proyecto encima de la mesa además de la propuesta ya elaborada para el concurso.

¿Como decidir? ¿Como elegir?.. además todas las propuestas con excepción de un par de ellas han sido elaboradas por técnicos ..lo mas fácil es pensar que se abra una batalla de “egos” tan típico-tópico entre los profesionales de la arquitectura.

La idea que se plantea es la que a se ha experimentado: dar voz a cada participante sin obligarle a exponerse antes los demás y terminar realizando una síntesis en común.

A la práctica cada participante dispone de post-it en los cuales anotar los aspectos que mas le interesan y/o considera interesantes de cada propuesta. Los post-it se cuelgan encima de cada propuesta.

Una vez terminada la selección de

elementos singulares de cada proyecto se decide en el mismo evento que puede resultar útil/interesante agrupar los elementos por similitud, creando familias como puede verse en la imagen de aqui abajo y queda documentado en las fotos del evento. En este evento también tratamos de organizar grupos de personas según ejes temáticos de interés y expectativas hacia el proyecto.



Agenda del Evento

Julio 24 envío mail - eventbrite convocatoria

Julio 30 evento en Pou de La Figuera 4horas

Julio 30 elaboración documento estructura grupos

Julio 30 publicación de **video** "acta" del evento en lista de reproducción youtube

Julio 30 mail - eventbrite de retorno a los asistentes

46 Invitaciones enviadas- 15 Pedidos confirmados -14 Participantes

Texto mail a los asistentes y Convocatoria - Julio 24 (6 días antes del evento)

Hola a tod@s!

Después de **BioBui(L)t.01** "Open Space" de definición programa, **BioBui(L)t.02** "Medidas relativas" y **BioBui(L)t.03** "Composición de lugar"....seguimos con BioBui(L)t04 . "Estructura".

El próximo martes en el casal del Barri Pou de la Figuera nos proponemos:

- **Conocer**-10 a 10.30 aprox: Organizar las definición de proyecto/actividad en grupos de interés de 10 a 10.30 aprox:

La idea es organizarnos según modelos de "guerrilla" pero transparente: pequeños grupos de 3 ágiles y de movimiento rápido ...pero a diferencia de modelos "clandestinos" cada grupo tiene elemento de contacto/cadena de transmisión con otros grupos.... y comunicación constante con "espina dorsal".... vamos a crear red neuronal y cadena transmisión nervios/ músculos :-)

Territorio: Recogida Información contexto y preparación charla Open air "entrada en parcela"

Materiales: Seguimiento detalles de proyecto/mediciones/suministro/logística

Innovación: Preparación campaña crowdfunding con todas entidades colaboradoras

Formación: Reparto talleres de obra y gestión de grupos de trabajo

Legislación: Seguimiento pla de seguretat y preparación ensayo

- **Actuar:** 10.30 a 13.30: Análisis de las propuestas presentadas en BioBui(L)t.03 y elección de Volúmenes y programa:

Presentación propuestas por familias- Recursos Disponibles- Esbozo calendario fases de construcción

Reflexión/decisión ¿Con que nos quedamos?

El reto es: seleccionar lo mejor de cada propuesta e integrar con coherencia los elementos que nos interesa en una propuesta única.....proyecto colectivo con agilidad!!

- **Imaginar:** 13.30 a 14.30: Visiones "Estructuras Reciprocas".... compartiremos la inspiración y veremos como participar en taller con Re-Cooperar/LaSalle estructuras reciprocas en Fabra i Coats entre 12 y 17 de Septiembre.

Acordaros de registrar vuestra entrada y sobretodo añadir vuestro perfil a la herramienta **sharetribe** la Tribú Compartida de BioBui(L)t...cualquier duda que tengáis para registraros en esta herramienta de intercambio.... podéis enviar "mail a organizador"...

Nos vemos el Martes!

...disculpar todavía está pendiente actualizar imágenes con logos de nuevas entidades colaboradoras :

Red de Construcción con Paja, Permacultura Barcelona y ESFA

Texto mail retorno a los asistentes - Julio 30

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Gracias a tod@s por compartir este momento de aprendizaje y pequeño gran avance hacia innovación social además de constructiva :-)

Ya os habrá llegado la siguiente invitación con enlace a video y documentos..

mañana enviaré la invitación a la carpeta compartida de dropbox para intercambiar archivos... **aquí** de momento tenéis el enlace al pdf con la lista de grupos hecha hoy

fins aviat!!

Texto mail retorno a los asistentes - Julio 30

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

ahh..olvidaba los links a leonardo's bridge...el principio de ambos es un poco rollo..pero...se ve muy bien lo bueno que es.... especialmente en el segundo video

<http://www.youtube.com/watch?v=wzPwXQluRAc>

<http://www.youtube.com/watch?v=uq3gaMvOTno>

y tiene gracia que los dos videos son alemanes....

Ahhh..también... si queréis hacer encuentros de grupos antes de encuentro general de septiembre...creo que estaría bien hacer el evento igualmente con eventbrite ...yo puedo montar el evento con los mails del grupo y se integra en la web..por si alguien quiere añadirse.... que es importante mantener las estructuras abiertas....

salud, valentina

Fotos Evento 3.4 Proceso de análisis de las propuestas hechas en evento BioBui(L)t-03



Inicio del encuentro: Miquel de Com Cal está con nosotros



1 of 11

Los Medios del evento

Espacio Pou de La Figuera

Gestión llaves con equipo Pou

Medios propios

Iphone, Ipad

Medios adquiridos

Post-it

Documentos Preparados

Maqueta de la Iglesia- Solar

Software empleado

Plataforma EventBrite, Facebook
Pages-Iphoto, Safari, Youtube

Autores imágenes y documentos

Valentina Maini:

Documento **Grupos**, Fotos evento,
Video, Textos Convocatoria

Joan Vila:

Maqueta del solar, Foto portada

los Participantes

Arnau Bujons

Beatriz Cristobal

Carmelo Gómez Pons,

Clara Diego

Fatima Ramos

Elvira Pujol

Iván Aguilar Lardies

Gemma Paone

Gaspar Alloza

Joan Vila Puig

Maia (Maria Laura del Tonto)

Miguel Muelas

Miquel (Com Cal)

Lia Urdaneta

Sandra Martin Lara

Txema De Miguel

Valentina Li Puma

Valentina Maini

Section 5

02|09|13

BioBui(L)t-05

Evento de re-encuentro después de la “pausa” de Agosto. Estamos al 2 en septiembre y hay cita prevista con el Ayuntamiento para tema licencia de obra el 12. El tiempo apremia.



Con una app para iphone se ha elaborado esta gráfica que muestra las palabras mas utilizadas por los participantes de BioBui(L)t 04 para destacar los aspectos mas interesantes de los proyectos. Se han considerado las palabras elegidas por lo menos por dos personas

A lo largo de agosto se han realizado varios trabajos de preparación para los pasos siguientes y en particular:

1. Se ha introducido un calendario en pagina web de BaM conectado con los eventos eventbrite, donde además se van publicando todas las citas asociadas al desarrollo del proyecto (este calendario ha sido perdido en las modificaciones de la web realizadas en 2015)
2. Se ha introducido una **Timeline** en la pagina web de BaM donde se recogen en una linea de tiempo los videos que se van publicando en la lista de reproducción de youtube
3. Se han estudiado las plataformas de gestión para trabajo en equipo on-line. Fatima Ramos realizó una comparativa entre varias soluciones disponibles para llegar finalmente a elegir y empezar a trabajar con **Trello**. Se monta un espacio de trabajo por cada grupo según lo definido en evento BioBui(L)t-04
4. Se han estudiado las diferentes plataformas de crowdfundig disponibles llegando a la elección de **Goteo** en cuanto plataforma muy coherente con los objetivos del proyecto.
5. Se ha investigado software de apoyo a realización de mapas interactivos que pudiesen ser de utilidad para las actividades del grupo de trabajo temático “territorio”
6. Se ha analizado la información producidas en eventos anteriores para así ofrecer a los participantes del evento los instrumentos para conseguir debatir y llegar a decidir en 4 horas de tiempo el esquema de planta elegido entre las 18 propuestas realizadas en el encuentro Bio-Bui(L)t. 03

En este como en cada evento está presente la documentación elaborada en los eventos anteriores (posters- post-it -maqueta, etc..). En este evento pero nos encontramos con sorpresa de último minuto, por un despiste del equipo gestor del Pou de la Figuera no podemos acceder a la Sala del Casal ..y con ello no podemos acceder a pantalla ...mesas y sillas. Conseguimos realizar el programa previsto improvisando una sala de trabajo en el cercano patio del Convent de Sant Agustí.

La presentación (power point) preparada para este evento que se adjunta en la pagina siguiente fue en realidad presentada en evento siguiente BioBui(L)t-06. Quedó demostrado que con creatividad y flexibilidad se puedan superar fácilmente los baches, Esta vez vivimos de forma colectiva feliz la precariedad de nuestros medios y la belleza de espacios públicos de Ciutat Vella.

Agenda del Evento

Agosto 27 envío mail - eventbrite convocatoria

Septiembre 02 evento en Convent de Sant Agustí 4 horas

Septiembre 02 publicación de **video** “acta” del evento en lista de reproducción youtube

Septiembre 03 mail - eventbrite de retorno a los asistentes

Septiembre 05 mail - eventbrite de convocatoria evento siguiente
52 Invitaciones enviadas- 20 Pedidos confirmados -14 Participantes

Texto mail a los asistentes y Convocatoria - Agosto 27 (5 días antes del evento)

Hola a tod@s!!

Volvemos a encontrarnos para definir el proyecto! La fecha de entrega se acerca ([ver calendario](#)- enlace roto en cambios web de 2015) y ya hay ganas de empezar a poner manos a la obra!!

En la última sesión de trabajo hemos seleccionado los elementos que mas nos importan/interesan entre las propuestas que tenemos. Podéis ver estos elementos en el video de la ultima sesión BioBui(L)t.04 [aquí](#)

También nos organizamos en grupos de trabajo según deseos de cada cual que podéis ver [aquí](#) : En esta sesión seguiremos definiendo los grupos!

Y tenemos una **TimeLine** (pagina web modificada pero se ha dejado la Timeline) de todo el proceso que puede ayudar a quién quiera incorporarse.

En este encuentro trataremos de crear una síntesis de proyectos según los elementos y criterios definidos hasta ahora. El objetivo es tener el proyecto definido para inicio de Octubre. Y una idea clara del volumen para la reunión con Ayuntamiento del próximo 12.9!

Recordar que las plazas son limitadas y que nos ayuda mucho a la organización tener vuestras inscripciones aquí.

Hasta pronto! un saludo!

Texto mail retorno a los asistentes - Julio 30


Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola, hemos tenido de improvisar hoy! Los del Pou de la Figuera se han olvidado de nosotr@s y igual algunos no habéis encontrado el cartel.....

HABEMUS PLANTA!

Gracias a tod@s! aquí el video de hoy... y próximo encuentro 12.9 por la mañana en el Pou! que se han disculpado mucho...

<http://youtu.be/rVAd0RC1wr>

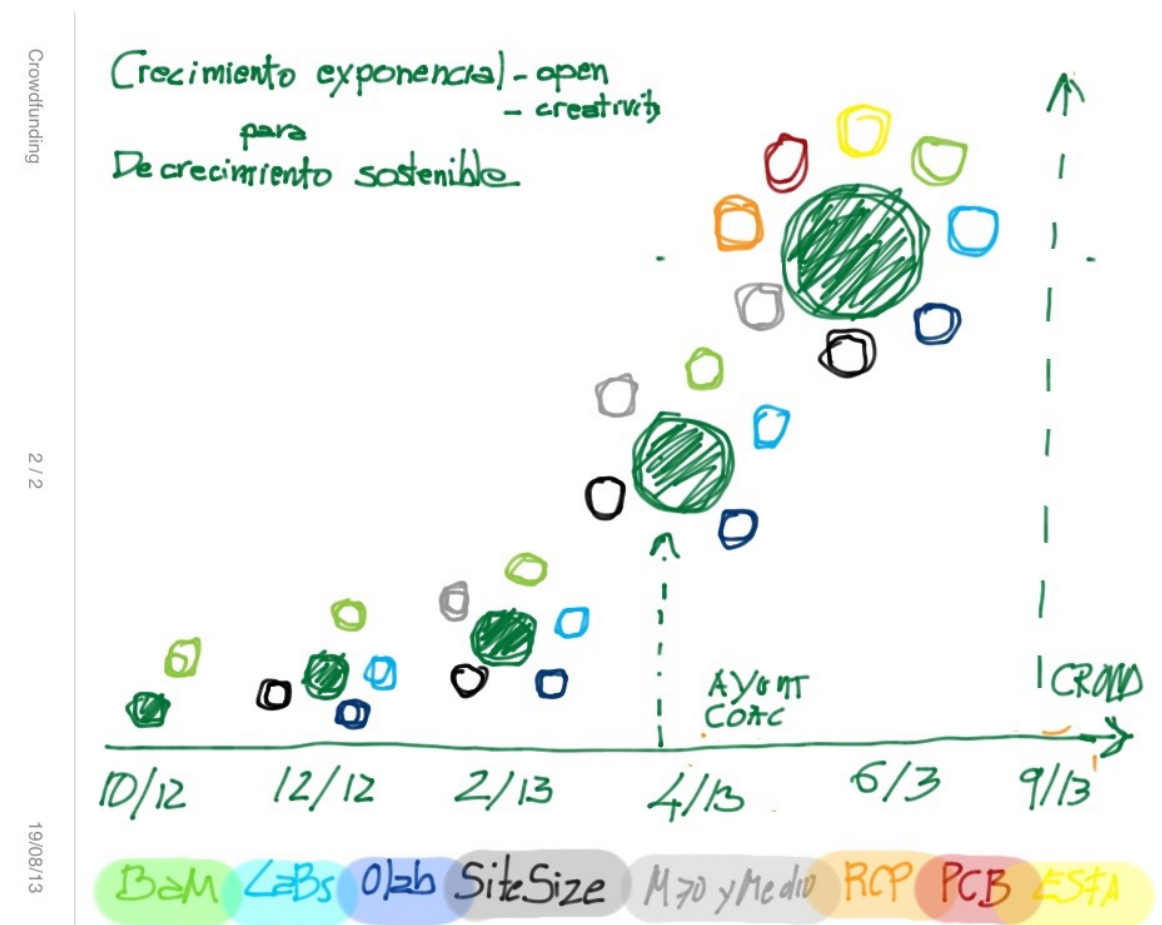

Nota de reflexión e ilusión de cara campaña de crowdfunding elaborada en “pau-sa” de agosto. En verde el proyecto. El ideal: Crecimiento exponencial para creatividad y accesibilidad para conseguir un decrecimiento sostenible. En eje X mes/año y siglas de entidades. En ejeY los recursos disponibles/potenciales.

Objetivos encuentro:

- seguimiento avances y grupos
- elección del modelo de ocupación

inicio h 10 +/- 20min final 14.30

Pasos:

- 45m Calendario General- Grupos-Proximas Citas
Paseo - ¿Que tenemos?- división en grupos
- 30m Valoración ponderata de proyectos por familias
- 30m Sharing 01> propuestas seleccionadas/sintetizadas
- 15m Pausa
- 30m Valoración entre familias diferentes
- 30m Ponderación y conclusiones



Docs. Evento 3.3 Presentación estado del proyecto y Objetivos del evento



Los Medios del evento

Espacio Patio del Convent de Sant Agustí

Improvisación para solventar cierre inesperado de Pou de la Figuera

Medios propios

Iphone, Ipad

Medios adquiridos

-

Documentos Preparados

Presentación herramientas de trabajo on-line

Presentación tema crowdfunding

Matriz de valoración de implantación de proyecto

Etiquetado de propuestas de proyecto según propuesta de implantación en el solar







Software empleado

Plataforma EventBrite,
Facebook
Pages-Iphoto, Safari,
Youtube
Penultimate

Autores imágenes y documentos

Valentina Maini:
Documentos,
Fotos evento,
Video,
Textos Convocatoria

Fotos Evento 3.5 Proceso de Selección de implantación

				
atractivo				
fácil uso				
eventos +40				
fácil obra				
costoso				
straw friendly				

Las propuestas de proyecto (16) se han clasificado en 4 modelos de ocupación del suelo, esquemas en columnas. Se pasa a valorar las propuestas según los 6 criterios indicados en líneas. Cada proyecto recibe una puntuación por valoración subjetiva de sus cualidades. Al final del análisis se decide entre todos el modelo de ocupación que se considera más adecuado.

los Participantes

20 Registrados 13 Asistentes

Albert Domenech
 Albert Aira Pérez
 Arnau Bujons
 Beatriz Cristobal
 Carmelo Gómez Pons,
 Cristina Coronil
 Carolina Sayes
 Gaspar Alloza
 Iván Aguilar Lardies
 Jonathan Minchin
 Julia de Orovio
 Lia Urdaneta
 Michela Pes
 Miquel Barcons (Com Cal)
 Mirco Zecchetto
 Oriol Palou
 Susana Gimenez
 Valentina Li Puma
 Valentina Maini

Section 6
12|09|13
BioBui(L)t-06

En el evento precedente se ha decidido la implantación en planta del edificio.

En este evento el objetivo es definir el sistema de fachada. Se sigue el mismo proceso de análisis y evaluación realizado en evento precedente evaluando las fachadas propuestas por todos los proyectos utilizando la misma matriz de evaluación.

Docs. Evento 3.4 Los proyectos y valoraciones realizadas el 02.09-13



Agenda del Evento

- Septiembre 05** envío mail - eventbrite convocatoria
- Septiembre 11** preparación evento
- Septiembre 12** evento en Pou de la Figuera 4h
- Septiembre 12** publicación de video "acta" del evento en lista de reproducción youtube
- Septiembre 12** mail - eventbrite de retorno a los asistentes
- Septiembre 12** encuentro entre Ayuntamiento Habitat Urbà i Proyectos ganadores de Pla de Buit
- Septiembre 13** presentación del proyecto en workshop Re-Pensar/La Salle
- Septiembre 15** mail - eventbrite de convocatoria evento siguiente
- 52 Invitaciones enviadas
- 15 Pedidos confirmados
- 12 Participantes

Texto mail convocatoria - Septiembre 05 (7 días antes del evento) Por error se re-envió el mismo mensaje de convocatoria del evento precedente

Texto mail retorno a los asistentes - Septiembre 12 (mismo día del evento)

Felicitats!!!! hem pogut arribar a la decisió!! Habemus coberta!!!: volums diferents modulats según el ritme de la esglesia! ...possibilitat de doble alçada i coberta transitable i no transitable...

Demà els estudiants de LaSalle empiezan el taller vertical sobre pla de buits...i pediremos que piensen y diseñen una expo itinerante de todo el proceso que estamos desarrollando!...empiezan mañana y terminan el Lunes!

Aqui el link al pequeño montaje de fotos!

El próximo jueves vamos a por la fachada! para el 30.9 necesitamos tener el proyecto definitivo nos quedan 3 encuentros... En el próximo trabajaremos con la maqueta del solar!...y algunas herramientas de "Accountable Talk"...

Felicidades y gratitud de tod@s para tod@s! aqui el pequeño montaje fotos de hoy...Comentaris...ideas i crítques sempre molt benvingudes!!!

<http://youtu.be/oYlUw3IKrb4> **Los Medios del evento**

Espacio Pou de La Figuera

Gestión de las llaves
Exposición de material producido en eventos precedentes

Medios propios

Iphone, Ipad

Medios adquiridos

-

Documentos Preparados

Se presenta en este evento el power point preparado para el BioBuil(L)t.05 .

Durante la sesión se prepara otra Matriz de Valoración con los proyectos catalogados según el tipo de sistema fachada-cubierta

Software empleado

Plataforma EventBrite,
Facebook
Pages-Iphoto, Safari,
Youtube
Penultimate

Autores imágenes y documentos

Valentina Maini:
Documentos,
Fotos evento,
Video,
Textos Convocatoria

Fotos Evento 3.6 Encuentro Ayuntamiento - Taller Vertical LaSalle- Programa EU Leonardo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fotos Evento 3.7 Proceso elección de volumen de proyecto



los Participantes 15 Registrados 18 Asistentes

Carmelo Gómez Pons,
Fatima Ramos
Elena Guim
Elvira Pujol
Gaspar Alloza
Iván Aguilar Lardies
Joan Vila Puig
Julia de Orovio
Gemma Paone
Lia Urdaneta
Michela Pes
Mirco Zecchetto
Oriol Palou
Sandra Martin Lara
Susana Gimenez
Vanessa Solano
Txema DeMiguel
Valentina Li Puma
Valentina Maini

Una vez elegida la implantación se analiza y elige entre las propuestas volumétricas, siguiendo el mismo proceso.

Section 7
19|09|13
BioBui(L)t-07

Agenda del Evento

Septiembre 15 envió mail - eventbrite convocatoria

Septiembre 19 evento en Pou de la Figuera 4h

Septiembre 21 publicación de **video** "acta" del evento en lista de reproducción youtube

Septiembre 21 mail - eventbrite de retorno a los asistentes

Septiembre 22 mail - eventbrite de convocatoria evento siguiente

56 Invitaciones enviadas- 24 Pedidos confirmados -18 Participantes

Texto mail convocatoria - Septiembre 15 (4 días antes del evento)

Hola a tod@s!!

Nos quedan ya solo un par de BioBui(L)t. para terminar la definición colectiva del proyecto! Ya tenemos decidida la ocupación en planta y la volumetría básica de cubierta ...resultado del proceso de análisis y valoración de las propuestas hechas en el BioBui(L)t.03

El próximo jueves volveremos a imaginar a partir de estas decisiones...que fachada y estructura queremos dar al edificio! Trabajaremos sobre la maqueta y con los datos de materiales que queremos emplear y que ya tenemos decididos en BioBui(L)t.01 y 04.!

El objetivo es salir del Pou de la figuera con maqueta definida! para que en los próximos dos encuentros podamos ya trabajar en programación de obra y el video para campaña de crowdfunding!...la entrega del proyecto al ayuntamiento la tenemos para el 30.09...la entrada en el solar...se va aplazando a causa del ayuntamiento..y se preve para inicio Noviembre...

Recordar que tenemos la **TimeLine** de los BioBui(L)t y tenemos grupos de trabajo según deseos de cada cual que podéis ver **aquí**: En esta sesión seguiremos definiendo los grupos!

Recordar que las plazas son limitadas y que nos ayuda mucho a la organización tener vuestras inscripciones aquí.

Hasta pronto! un saludo!

Texto mail retorno a los asistentes - Septiembre 21 (3 días después del evento)

Felicitats!!!! hem pogut arribar a la decisió!! Habemus coberta!!!: volums diferents modulats según el ritme de la esglesia! ...possibilitat de doble alçada i coberta transitable i no transitable...

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterrània:

Hemos saltado el límite y estamos ya en fase ejecutiva!! Gracias a todos !!!

Ya hay el "clásico" montaje de fotos en youtube y en la "TimeLine" del proyecto! y en el "Trello" se colgarán los dibujos de sección constructiva para que el grupo materiales puede seguir comunicando y aclarando temas!

<http://youtu.be/JX6jO5H8YwM>

el Jueves 26 es el encuentro donde podremos organizar todo lo que queda pendiente...que es mucho y es muy poco!! considerando que vamos a conseguir algo bastante especial : el primer proyecto para licencia redactado entre una mezcla variable de profesionales muy diferentes....

Mañana o lunes enviamos la invitación para los dos próximos eventos muy importantes ...los últimos dos de esta fase inicial!!...el jueves 26 en el Pou....y reservar el domingo 29 por la mañana ..para la traca final!!! video y fiesta en el solar con también amigos-familiares-conocidos!!

BIOBUI(L)T.07

Pou de la Figuera
19.09.13h10.00-14.30

Repaso rápido -hoja de ruta

bam

los Participantes
24 Registrados 18
Asistentes

Albert Aira Perez
Alfredo Lombardi
Anita García
Angel Estevez
Arnau Bujons
Carmelo Gómez
Pons,
Clara Diego Nieto
Cristina Casali
Carolina Sayes
Gaspar Alloza
Iván Aguilar Lardies
Jelena Grujic
Jonathan Minchin
Gemma Paone
Michela Pes
Oriol Palou
Rodrigo Carbajal
Susana Gimenez
Sandra Martin Lara
Susana Oses
Leonel Jofre
Txema de Miguel
Valentina Li Puma
Valentina Maini

La presentación recoge datos ya presentados e integra las propuestas y avances que se han realizado on-line en la plataforma de trabajo a-sincrónico Trello

Fotos Evento 3.8 Definición Muros y relación Cubierta



Por cada modulo hay un grupo que trata de desarrollar los detalles de ejecución. Lionel está entre nosotros haciendo fotos para la producción del video para el Crowdfunding

Section 8
26|09|13
BioBui(L)t-08

Agenda del Evento

Septiembre 22 envío mail - eventbrite convocatoria

Septiembre 24 envío mail - eventbrite 2ª convocatoria

Septiembre 25 envío mail - eventbrite 2ª convocatoria

Septiembre 26 evento en Pou de la Figuera

Septiembre 26 publicación de **video** "acta" del evento en lista de reproducción youtube

56 Invitaciones enviadas- 20 Pedidos confirmados -16 Participantes

Texto mail convocatoria - Septiembre 22 (4 días antes del evento)

Hola a tod@s!!

En el pasado **BioBui(L)t. 07** se han aclarado materiales y preparado secciones constructivas y alzados de referencia del proyecto! En estos dos últimos encuentros vamos a cerrar esta fase y sentar las bases para el desarrollo futuro!.

El día 26 haremos valoración del proceso y resultados conseguidos, así como la presentación proyecto video para Crowdfunding a grabar el 29!

Estos dos últimos encuentros serán determinantes para que podamos todos saltar de nivel! Tenemos el proyecto y algunos materiales claros..tenemos que explicarnos como vamos a hacer posible la obra! Algunos ya han aclarado y mostrado lo que pueden/quieren aportar...otros han mostrado interes pero todavia no saben como y si pueden aportar!...

Se está trabajando en plataforma on-line para terminar aclarar temas constructivos en "Board" Materiales y en el "Board" Territorio hay muchas tareas empezadas que esperamos se puedan terminar para el 26.

Recordar también que ayuda muchísimo que los que quieran y puedan asistir se apunten! si quieres asistir pero no puedes igual podrás estar el 29 o envía un mensaje a info@bamconf.org

Texto mail convocatoria - Septiembre 24 (2 días antes del evento)

Hola de nuevo! aqui abajo el mensaje original de invitación!...Este nuevo mensaje es para comentar a tod@s los que han participado en algun evento BioBui(L)t lo siguiente:

- este jueves vamos a valorar el proceso entre todos el proceso que hemos vivido - y nos preparamos para la próxima etapa....EJECUTIVA!....para ello hemos pensado que estaría muy bien que todos enviemos a BaM (info@bamconf.org) el enlace a video de una canción que expresa mejor en opinión de cada cual el deseo/emoción/expectativa de cara a la construcción de BioBui(L)t!

- tenemos resultados concretos de proceso elaborado hasta ahora en ficheros dwg y pdf colgados en la plataforma on-line que utilizamos para cooperar.... los que no se hayan apuntado y quieren participar/opinar en la próxima fase ejecutiva pueden enviar un mail a BaM (info@bamconf.org)... los que ya se han registrado como asistentes al evento del 26 no hace falta que envíen nada

- y muy importante! el 29 - domingo a las 13 hemos citado todos (participantes y familiares/amigos conocidos) delante del solar c/montalegre 4 para grabar segunda parte del video que utilizaremos para la campaña de micro-financiación...¡cuantos más seamos mejor!! podéis apuntaros **aquí** (lo mejor!) o simplemente aparecer el domingo a las 13 delante del solar!

Hasta pronto! un saludo!

Texto mail recordatorio - Septiembre 25 (1 día antes del evento)

Hola de nuevo! aqui abajo el mensaje original de invitación!...Este nuevo mensaje es para comentar a tod@s los que han participado en algun evento BioBui(L)t lo siguiente:

- este jueves vamos a valorar el proceso entre todos el proceso que hemos vivido - y nos preparamos para la próxima etapa....EJECUTIVA!....para ello

hemos pensado que estaría muy bien que todos enviemos a BaM (info@bamconf.org) el enlace a video de una canción que expresa mejor en opinión de cada cual el deseo/emoción/expectativa de cara a la construcción de BioBui(L)t!

Docs. Evento 3.6 El guión preparado para video crowdfunding

Guión gráfico BioBui(L)t- Know	Ciente	BaM	Título	BioBui(L)t-Ciudadanos Equipados
	Referencia	Septiembre 013-Crowdfunfing	N.º trabajo	Valentina Maini -01



Secuencia1: La pre-historia 01
Concept: Abandono- Suelo/Riqueza



Secuencia 2: Pre-historia 02
Concept: Abandono/todos en pelotas



Secuencia3a: Pre-historia 03
Concept: Ciudadanos equipados/perspectiva



Secuencia 3b: Pre-historia 04
Concept: Public/Private



Secuencia 4a: Pre-historia 05
Concept: Escalas espacios/intereses



Secuencia 4b: Pre-historia 06
Concept: Integración-Movimiento

Finalmente el video final se centró en imágenes de trabajo y se cargó la comunicación del mensaje a entrevista a la responsable de BaM. Una decisión pragmática no exenta de consecuencias.

Docs. Evento 3.7 Encuentros y investigación previa al encuentro



Fotos Evento 3.9 Evaluación y preparación Crowdfunding



Ultimo encuentro antes del inicio de la campaña de Crowdfunding, momento de evaluación de objetivos conseguidos y retos para asumir en las próximas fases de desarrollo: organización del espacio y talleres- búsqueda de recursos materiales. A lo largo del evento aparecen por primera vez tensiones entre los participantes derivadas de la necesidad de reflexionar sobre esfuerzos realizados y esfuerzos a realizar. Para evaluar el compromiso de los participantes se propone la realización de una campaña de “flash-funding” : una recogida de fondos rápida entre los participantes.

Docs. Evento 3.8 Cuestionario de evaluación propuesto a los participantes.

•Vamos a evaluar los resultados conseguidos hasta ahora
..cerrar una etapa e iniciar otra

Sesiones BioBui(L)t en las que has participado

☒ 01-Open Space
☒ 02- Medidas Relativas
☐ 03-Proyecto
☒ 04-Evaluación-Post-it/grupos
☒ 05-Evaluación implantación
☒ 06- Evaluación cubierta
☒ 07- Sistemas-Materiales

¿Que has aprendido nuevo?

☒ forma de elaborar propuestas/trabajar entre desconocidos
☐ producir y "jugar" a la vez
☒ herramientas de trabajo-software
☒ información/visión de materiales /sistemas
☐
☐
☐

¿Vas a poder aplicar algo de lo aprendido en tu trabajo/vida personal?

☒ si
☐ no

¿Que es lo que te ha gustado mas?

☒ encuentro con otras personas
☒ posibilidad de aportar mi parte
☒ aprender/imaginar de BaM-BioBui(L)t
☒ perspectivas nuevas para mi
☒ interés personal para otros proyectos
☒ EXPERIMENTAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO
☐
☐
☐

¿Que es lo que esperas de desarrollo BioBui(L)t?

☒ conocer nuevos materiales /técnicas
☒ experimentar
☒ pasarlo bien con otras personas
☐ desarrollar un proyecto personal
☒ aplicar conocimientos propios
☒ formación profesional
☒ intercambiar recursos con otros profesionales
☐
☐
☐
☐
☐

¿Estás ya apuntad@ al Trello?

☒ si
☐ no
☐ ¿Board?

¿porque apoyas y porque alguien puede apoyar Bio-Bui(L)t?

☒ ejemplo de soluciones alternativas utiles
☐ método y formas abiertas a personas /innovación
☐ para dar apoyo a formación ciudadanos
☒ para apoyar los que tienen iniciativas Open
☒ para eliminar barreras en materiales
☒ porque en BioBui(L)t aprendemos/apoyamos ciudadanos y profesionales libres
☐ PARA DEMOSTRAR QUE OTRA FORMA DE HACER LAS COSAS ES POSIBLE.
☐
☐

Section 9

29|09|13

BioBui(L)t-09. ReBautizo

Texto mail Convocatoria - Septiembre 22 (7 días antes del evento)

Hola a tod@s!!

Celebramos el final de primera etapa proyecto/obra BioBui(L)t grabando el video para la campaña de crowdfunding!

a las 9.30 cita de los participantes a eventos pasados de elaboración proyecto donde?: en c/ aribau 24 principal derecha

para? Leo (video maker-artista/activista, colaborador de Olab) grabará la primer parte!... participación limitada a 15-20 personas.

y a las 13... "al tocco" delante del solar del proyecto en c/ montalegre 4 vamos a grabar la segunda parte con todos los interesados, amigos, familiares, conocidos, personas que podemos contactar directamente nos gustaría ya que participaran en el proyecto y/o sabemos que les puede gustar!...cuantos más somos mejor apuntar en el registro de participación cuantas entradas (personas) pensáis invitar/ contactar para estar haciendo aperitivo festa delante del solar..a las 13...hemos elegido domingo para que todo el mundo pueda participar!

Texto mail recordatorio - Septiembre 27 (2 días antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Recordatorio general ...que se ha montado un poco de lío por evento mismo día dividio en dos partes.. disculpar este pequeño overbooking de mails!!

cita para todos de celebración a las 13h de este domingo 29 delante del solar en calle Montalegre 29. Los amigos y familiares que quieran podrán participar en grabación de segunda parte de video para campaña de financiación proyecto! los que no quieran salir en el video será una alegría vernos!!

cita para participantes de algún evento pasado BioBui(L)t cita en c/ aribau 24 h.9.30 con camiseta negra y camiseta "normal" para cambiarse en cuanto salgamos de "olab" y vayamos a encuentros de amigos, colegas y familiares delante del solar...sin ser un "equipo" con uniforme...sino ciudadanos equipados que creen en el valor del espacio público!! y en la biodiversidad!!

fins demà

Texto mail Noticia Txema - Septiembre 28 (1 día antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Estimats....

acaba de llegar una noticia terrible..

Txema De Miguel, que ha participado tan activamente y con tanta alegría y presencia en BioBui(L)t...nos ha dejado...esta noche en su cama...un ataque de corazón...el último post en su muro de facebook ha sido para invitar todos sus seres queridos a evento de mañana.....

En buzón de Valentina ha llegado su mail de compromiso y propuesta y energía para BioBui(L)t y ya nos había enviado los videos de su música para el proyecto....

La emoción es muy grande....mañana buscaremos la mejor forma de enviarle un mensaje entre todos ... allá donde estés Txema...estás con nosotros ahora y siempre...

Texto mail Noticia Txema - Octubre 2 (3 días después del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Estimados tod@s los últimos días han sido muy intensos y llenos de emociones..aquí las palabras enviadas por Elvira el lunes después de evento de domingo y el video dedicado a Txema que acabo de montar... espero que consiga expresar la emoción y la gratitud de todos .

un abrazo a tod@s, valentina xBaM xTxema

http://youtu.be/5_ORGI-6k-Y

La Cartas de Compromiso

Hola a todos, aqui todas juntas en orden alfabetico las cartas que han llegado. La primera es la de Txema que me emocionó tanto porque mostró que uno de los objetivos más difíciles del proceso de crecimiento social que ha impulsado los encuentros BioBui(L)t se había hecho realidad : ir más allá de la "familia" de cada uno y descubrir/ reforzar el valor de la diversidad (biodiversidad) que es tan importante para la vida.

Este proceso se ha realizado entre técnicos todos unidos por el interés en la bioconstrucción...ahora empezamos la nueva fase donde la forma en la cual hemos desarrollado el proyecto tiene que trasladarse a la forma en que lo construimos...permitiendo a otras "familias" acercarse y interactuar para crecimiento común de capacidades, conocimientos (en el video de BioBui(L)t 08 ya se ve lo que más hemos valorado).

Por otro lado Txema también aportaba y sugería que cada uno de los interesados pudiese manifestar sus ganas - posibilidades y expectativas. Para ayudar a entendernos y construir juntos.

Yo misma y otros que han estado muy activos en el proceso no han enviado todavía la carta. Nos ponemos como límite hoy... Siendo muy conscientes que el proyecto TXEMA no cierra las puertas a nadie..queremos aprender y enseñar y solo podemos hacer esto intercambiando y valorando el intercambio...

Space & Crowdfunding

Fase 2. Octubre 2013 Febrero 2014

En esta fase el proyecto entra en contacto con espacio exterior y la realidad de la obra. Una etapa donde:

- se redefine el diseño del edificio a realizar
- se termina la **crowdfunding** y se gestiona ayuda del COAC
- se incorpora la plataforma de crowdfunding como canal de comunicación de “feedback” de las actividades
- se incorporan al proyecto nuevas personas

La situación del proyecto en el momento de iniciar esta fase se puede definir como resultados de los eventos y procesos acontecidos en la fase anterior.

En el mes de Octubre sabemos que:

- tenemos montada la plataforma para el crowdfunding
- tenemos las cartas de compromiso concreto con el proyecto de varios participantes de la fase anteriores (individuos y asociaciones)
- el partner de proyecto de concurso SiteSize ha conseguido una subvención para desarrollar temas asociados al proyecto que se elaborarán en forma paralela
- los otros partners de proyecto de concurso Olab y Labs han colaborado de forma sustancial a la elaboración de crowdfunding pero no tienen mucha disponibilidad de tiempos y recursos necesarios para la siguiente fase de proyecto
- la Asociación BaM participa como partner en proyecto europeo acerca de buenas prácticas sobre vivienda social.
- la Asociación BaM no consigue mantener activos los otros proyectos en marcha : Edición Premio , IICongreso Internacional LiBaM
- tenemos plataforma de trabajo on-line Trello montada

Índice de decisiones elaboradas en eventos de esta fase

- Txema-01: posibilidad de ejecución de cubiertas reciprocas y/o prefabricadas
- Txema-02: puntos fuertes y características del proyecto y del proceso open-space
- Txema-03: análisis de puntos débiles e incógnitas de ejecución
- Txema-04: entrada en el solar- mapa geobiología
- Txema-05 y 05b: solución parcial incógnitas de ejecución -recogida de caña
- Txema-06: cartel participantes y crowdfunding - replanteo muros en el solar
- Txema-07: recogida canya
- Txema-08: ejecución muros de cimentación
- Txema-09: posibilidades solución estructura vertical
- Txema-10: primeras ejecución de prueba estructuras de caña
- Txema-11: limpieza y segunda pruebas estructuras de caña
- Txema-12: suministro tierra para ejecución tapial
- Txema-13: prueba de carga bóveda de caña
- Txema-14: segunda recogida de caña y suministro en el solar
- Swap Party: celebración final del crowdfunding- diseño de las camisetas de retorno
- Txema-15: limpieza de cañas- toldo - bases de pilares de estructura vertical
- Txema-16: análisis del estado del proyecto- Modificación del diseño previsto para adecuar el mismo a los recursos disponibles

Section 1
15|10|2013
Txema 01

59 Invitaciones enviadas 25 registros 23 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Octubre 07 (5 días antes del evento)

Hola a tod@s!!

Estamos haciendo salto hacia la realidad! los días entre el último encuentro BioBui(L)t.08 y BioBui(L)t.09>Txema han sido muy intensos!.

- Hoy Lunes 07.10.. El Ayuntamiento ha empezado las obras de acondicionamiento previo y Nosotros hemos presentado el proyecto en plataforma de crowdfunding Goteo. Aquí tenéis el video para esto montado por equipo Olab : http://youtu.be/nbNg_VWJcps

- Y aquí el video del encuentro del pasado Domingo 29 en el solar..por los que igual no han visto: http://youtu.be/5_ORGI-6k-Y

Se ha lanzado entre contactos de eventbrite una campaña "flash" de apoyo al proceso y "compromiso" de cada cual con el proyecto y el proceso para seguir organizandonos de forma abierta y eficaz!

Como comentado los encuentros BioBui(L)t Txema siguen siempre abiertos..porque ya hemos podido ver como la aportación de cada uno, aún sea por un momento, nos puede enriquecer a todos muchos! Por otro lado hay que ir concretando logística y proceso de obra. Para ello en este encuentro vamos a trabajar:

- calendario de las obras y suministro de materiales
- definición de detalles de cubierta y estructura de montaje
- revisión de campaña crowdfunding y estructura de trabajo en Trello

Nos vemos allí!!

Recordar que a partir de ahora y para ayudarnos ...es necesario registrarse en eventbrite para acceder ...es muy importante para simplificar y mejorar la comunicación y el seguimiento...los encuentros siempre son abiertos pero tenemos que hacer pequeño esfuerzo para ayudarnos en la gestión!

un abrazo, valentina xBaM-Txema

Docs. Evento 4.1 Repaso estado proyecto

Bui(L)t > Txema

na 1 a decidir hoy: montaje cubiertas

na 2 a decidir hoy: dinámicas de talleres

na 3 a decidir hoy: Crowdfunding-inicio

Planos- Resultados FlashFunding-Presentación Crwodfunding

1 of 19

Fotos Evento 4.1 Tratando Reciprocidad



• • • • • • • • • •

Section 2

27|10|2013

Txema-02

64 Invitaciones enviadas 25 registros 23 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Octubre 07 (5 días antes del evento)



27 d'octubre a la Plaça de la Mercè

11:30h Gimcana infantil **La Negreta**
12:15h Espectacle infantil de **Mandarina, Fofucho i Fumanchú**
13:00h Música afro, brasilera, pop i soul amb **Hugo Soares**
14:00h Degustació de **Paella popular***
16:00h Presentació de l'Espai Social del Gòtic **La Negreta**
16:15h **Sense Anestèsia, Cia Aseteatro**, l'espectacle de la sanitat privada finançada amb diners públics (els teus) i fora de control
17:00h Concert d'**Assís World Band**, músics vinculats al Centre d'Acollida Assís
17:45h Sessió de reggae amb **SoundSystem RockerSound**
18:30h Concert de rumba catalana amb **El halcón** y la auténtica banda de los zorros plateaos
19:30h Vetllada amb **DJ@hibai**

* Preu del dinar: 8€ (inclou amanida, paella vegetal o de carn i beguda). Els tiquets es poden comprar per avançat els dimecres i els dijous per la tarda al local de La Negreta (carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos). En cas de pluja la programació tindrà lloc en aquest espai. Per a qualsevol aclariment, contacteu-nos a: lanegretadelgotic@gmail.com, 618 23 66 55 (mòbil) i o 93 315 18 20 (fix)

Organitza: **La Negreta**

Hola a tod@s!!

Os invitamos a encuentro lúdico/reflexivo/social! Vamos a visitar los vecinos del Gotic que celebran su nuevo espacio LaNegreta con paella popular en la P.Mercé a las 12... y después para los más libres vamos a visitar todos la feria de Economía Solidaria en Fabra i Coats! Salimos del Pou para encontrarnos en la ciudad con los otr@s muchos grupos que están trabajando para el bien común! Necesitamos celebrar lo que ha pasado!!

Después del encuentro Txema 01. del 15.10 del caul tenéis el video/resumen aqui, tenemos el trello activo y personas trabajando para definir los detalles de entrega de materiales, ejecución y formas de realización de la obra que nos permita mantener el espíritu Txema: sueño de nuevos

horizontes y capacidad de concretar en formas de acción innovadoras, eficaces y justas.

El proceso Biobui(L)t ha sido valorado en **encuentro 08** y tenemos que asumir que hemos conseguido algo bastante extraordinario! Vamos a hacer tesoro de este proceso para crear instrumentos que nos permitan asumir el reto de la definición de un espacio de intercambio que sea confortable, abierto y seguro para todos los participantes. Es tarea compleja, pero bonita!

Y mira.... como en las cartas astrales los movimientos relativos de los planetas unos con el otro y el espacio del cielo que ocupan pueden generar sinergías constructivas o tensiones... según geometrias variables y diferentes que son el sal y la


esencia de la vida y de la biodiversidad. [Y tenemos carta astral de proyecto Txema!](#)

Habría sido bonito tener la carta astral en el **plafon que ha hecho el ayuntamiento** ;-)! (no hemos diseñado nosotros...solo pasado indicaciones de contenido).

El Martes 5 empiezan los talleres que Sitesize ha organizado gracias a una subvención que ha conseguido como entidad colaboradora del proyecto. Los participantes a BioBui(L)t tienen entrada libre...El primer encuentro se hará en el Pou. [Aqui info](#)

El 7 de Noviembre hay firma oficial de BaM/Ayuntamiento para cesión del solar y se formaliza inicio seguro de responsabilidad civil con ArÇ coop. Y tenemos confirmado que podremos iniciar campaña Crowdfunding!! (aqui video de intro) Para aquella fecha queremos tener preparado un documento que podamos suscribir todos participantes y entidades para formalizar los limites que nos pone-

Figura 4.1 La Carta Astral del proyecto

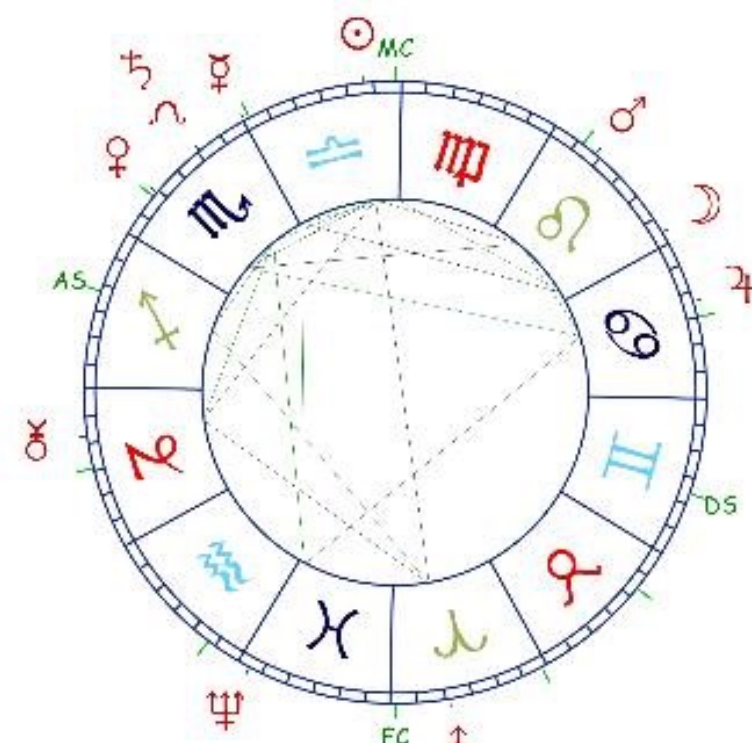

mos para garantizar equidad, eficacia y abertura de cara especialmente a condiciones de intercambio recursos y dinero (que es lo que más cuesta de hablar ;-))

para ello invitamos todos a enviar una "carta a los reyes" donde se haga lista de sueño- sueño total...cual es el sueño da cada uno con respeto a dinero e intercambio de recursos en proyecto Txema? podéis enviar vuestra propuestas a info@bamconf.org y así como las cartas de compromiso las hemos compartido con nombre y apellido.... en este tema tan "difícil" vamos a dejar la lista de sueños anonima..para compartir más facilmente!

El 7 haremos evento para celebrar firma!

Nos vemos el domingo y seguimos en el Trello!

un abrazo, valentina xBaM-Txema

Texto mail Recordatorio Convocatoria - Octubre 27 (mismo del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola a Tod

Hola a tod@s! nos vemos en un rato! en la plaza de la Mercé. Vamos a tener momento de encuentro relax entre nosotros y vamos a conocer un poco la asociación de vecinos del Barri Gotic que organiza esta mañana/tarde de fiesta para "LaNgere-ta" nuevo espacio de actividades para el barrio!.

La Fira de la economiía solidaria en cambio por la tarde está ya cerrada...

Gemma Paone ha sido contactada por Lluïsa Cendon de Institut de Politiques Publiques del la UB que ha pedido una entrevista a BaM sobre el Pla de buit...con el guió de aqui abajo.

Hemos pensado que el guón es una buenissima guía para reflexionar de lo hecho ahsta ahora...y que podemos "responder" entre todos los que quieran...con la dinámica de Post-it...

Aqui abajo el texto que nos ha enviado.... tendremos post-it y cada cual podrá expresar lo que siente/piensa!...hay algunas preguntas que quizá hacen referencia más a la historia del proyecto...pero bueno...:-) fins aviat!,

un abrazo, seguimos!, valentina x BaM-Txema

GUIÓ DE L'ENTREVISTA

Projecte BioBui(L)t

Espai del carrer Montalegre, 4 (al lado del Macba)

Entitat BaM (Bioarquitectura Mediterrània)

Data i hora de realització: 27/10/2013 a les 12 h

Presentació de l'entitat

Què és BaM? Perfils de persones que l'integren? Quins són els seus objectius des del punt de vista social?

Què va motivar la presentació del projecte al Pla BUIITS?

En què consisteix el projecte?

Aspectes socials destacats del projecte presentat: autoorganització, Compartir coneixement, aprenentatge, benestar, bé comú, participació, aprendre a partir del procés, benestar individual i col·lectiu (extret del web). Com es treballen amb el projecte?

Persones

Tipus de persones que hi participen. El projecte és obert? S'han incorporat més membres? Es treballa amb la gent del barri? Es treballa amb persones d'altres barris o altres ciutats?

Com es treballa l'individu i el col·lectiu?

Hi ha conflictes?

Metodologia

Tipus d'organització?

Com es coordinen?

Quins instruments i eines fan servir. Qui és l'ús d'Internet i les xarxes socials en el projecte?

Com avaluen?

Valoració de la política del Pla

Quina és la relació actual amb l'Ajuntament?

L'opinió respecte a l'administració pública s'ha vist modificada a rel de la posada en funcionament del projecte.

Creuen que està canviat la manera de fer política urbana de l'Ajuntament o ho veuen com una tendència propiciada pel moment de crisi?

Opinió sobre la participació ciutadana en la construcció de les ciutats

Opinió sobre les polítiques públiques de l'Ajuntament

Opinió sobre el paper de la ciutadania

Global i local

Entre les entitats col·laborades hi ha diferents col·lectius agrupats per àmbits d'interès, comparteixen amb altres associacions de caire més generalista o del barri


Hi ha relació amb la resta d'entitats del Pla BUIITS

Quin creuen que ha de ser l'articulació local/global. Com la materialitzen a través del seu projecte?

Com veuen l'efecte taca d'oli dels projectes d'espais buits?

Valoració general del Pla BUIITS

Fotos Evento 4.2 Tratando conectar con espacio publico y realidad de los vecinos de ciutat vella

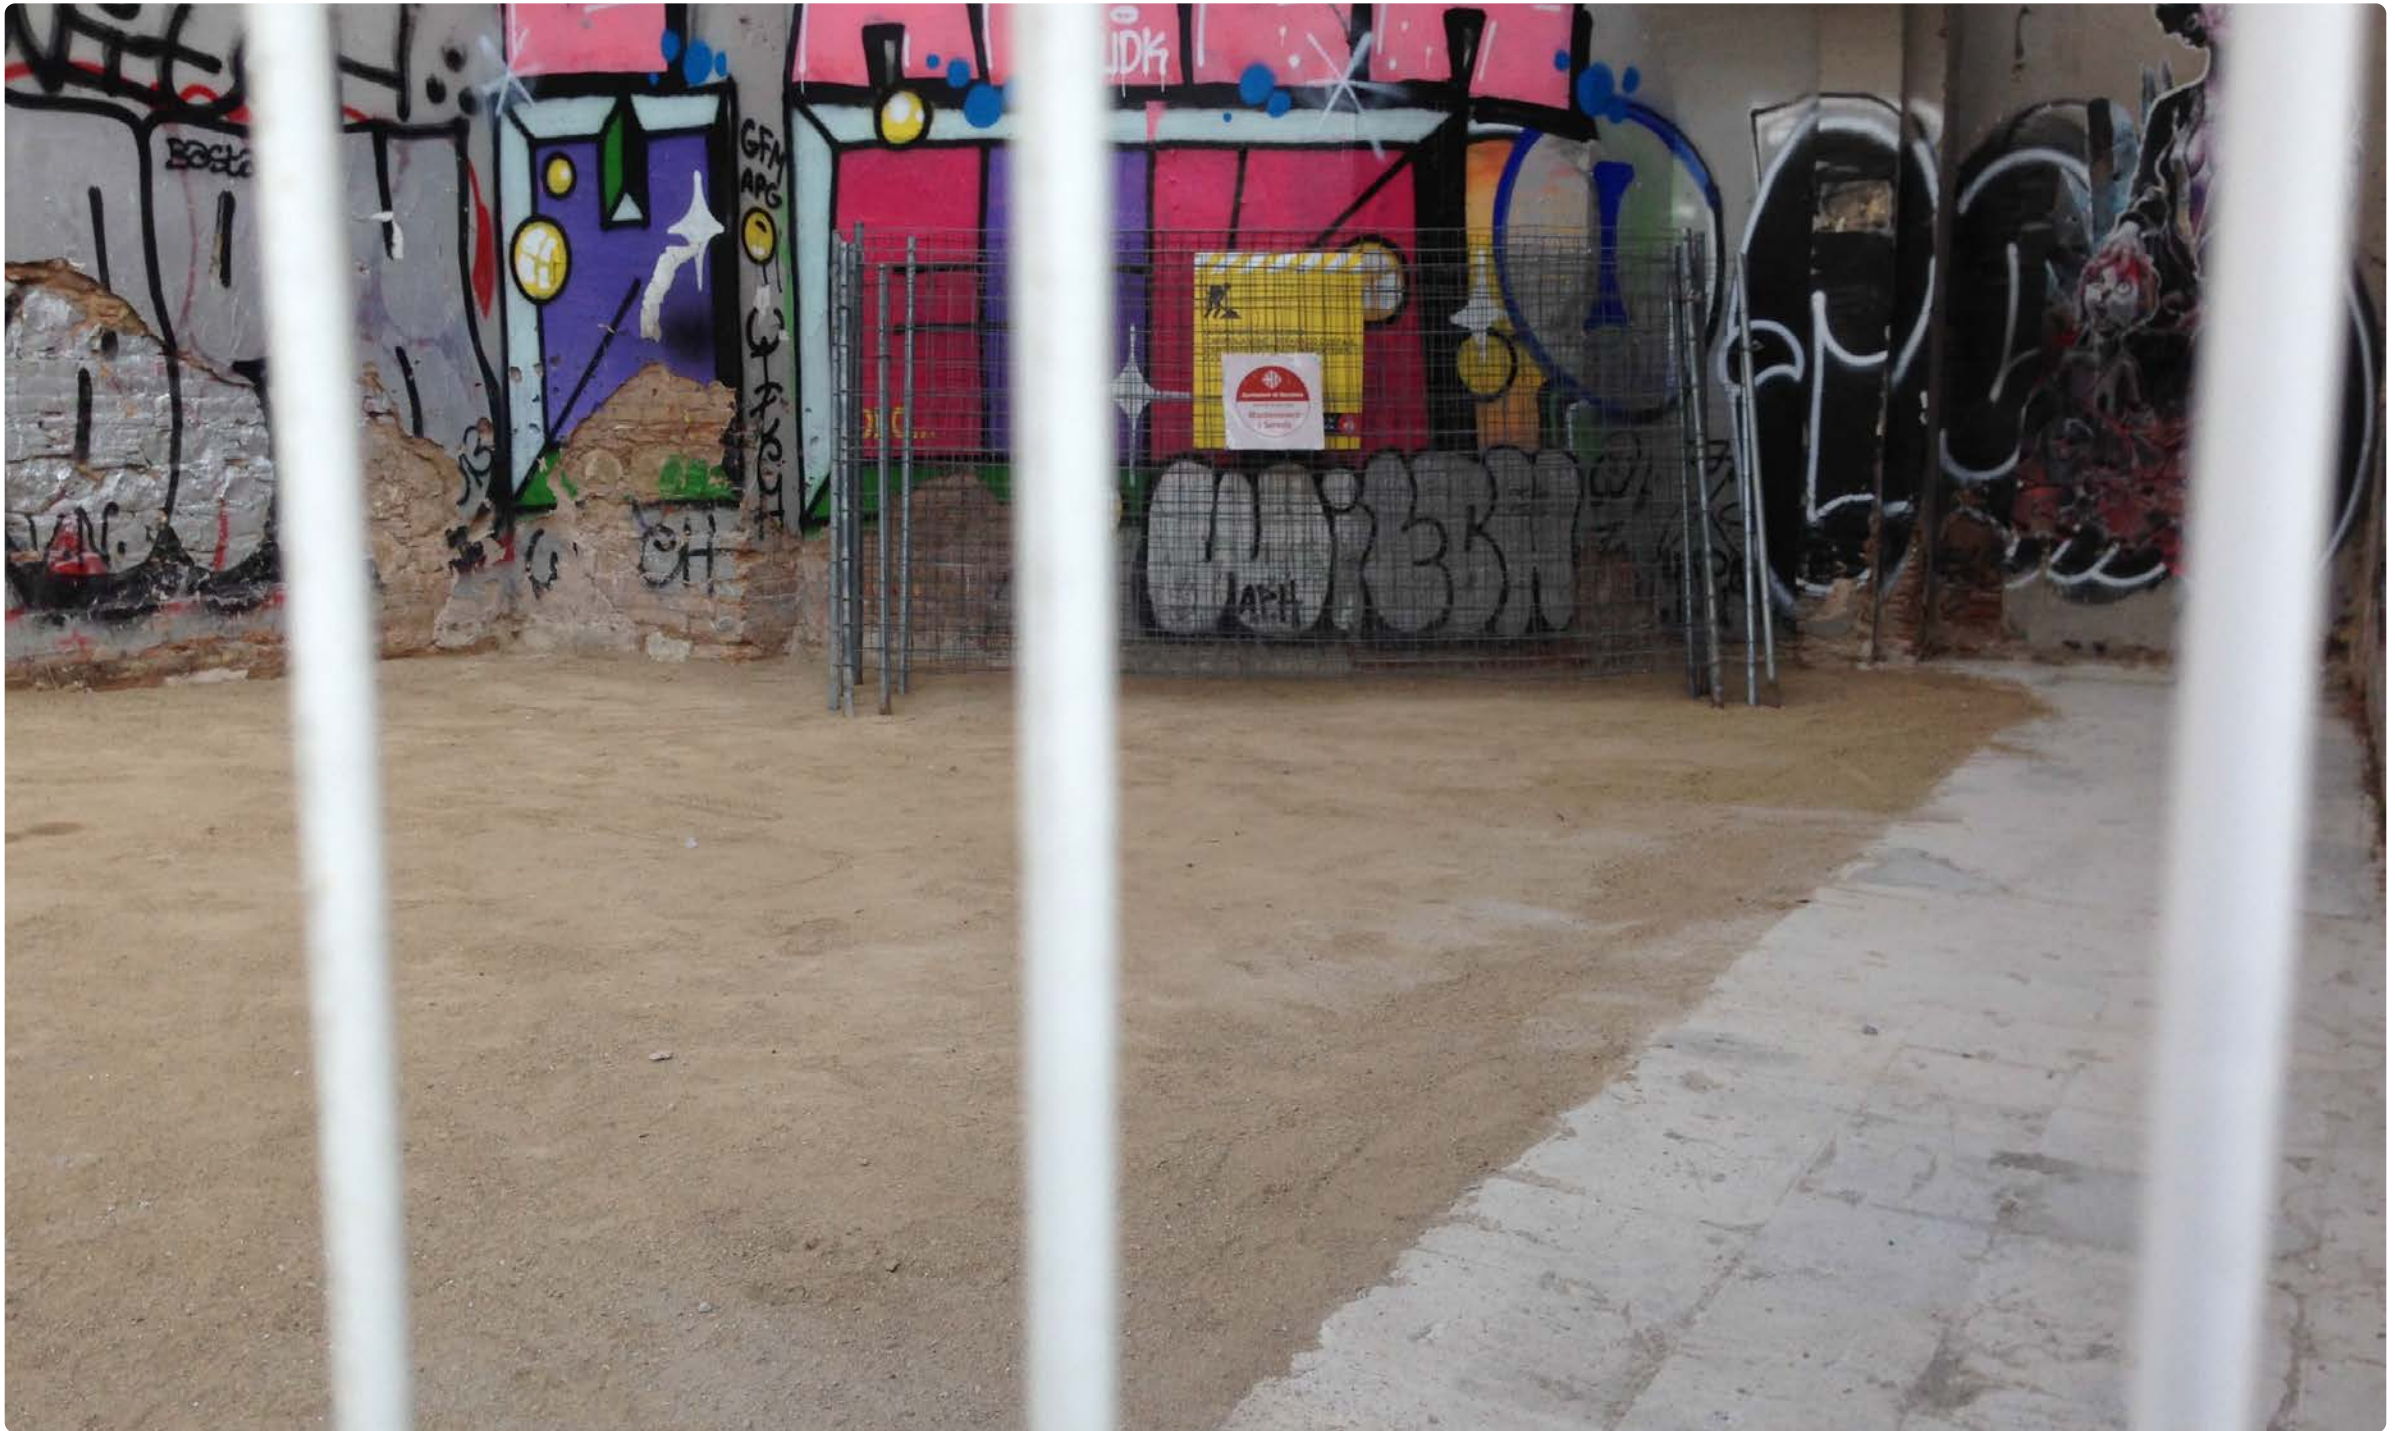

Elaborando las respuestas a la investigadora-periodista de forma colectiva y viviendo la fuerza de la auto- organización vecinal

Section 3

05|11|2013

SiteSize

64 Invitaciones enviadas 1 registro

Texto mail Convocatoria - Octubre 27 (5 días antes del evento) NO HI HA RETORN

La entidad Colaboradora Sitesize al proyecto BioBui(L)t-Txema ha conseguido el soporte de Generalitat para desarrollar los temas de su interés en el ambito del proyecto. Nos felicitamos por este primer exito de la iniciativa de BaM que permite a una entidad Colaboradora reforzar su perfil y trayectoria. El proyecto Txema quiere ser una plataforma de soporte para las entidades y personas. Equipar y equiparnos! mostrando nuevos caminos y creando mezclas de realidades diferentes. En este sentido el taller de Sitesize por formato y calendario es un reto!

Aqui teniu el Programa inicial de SiteSize...

El programa de sessions actualment queda així:

>Sessió 1. Dimarts 5 de novembre de 10 a 14h

BaM Bioarquitectura Mediterrània. Valentina Maini (Italia). Exposició de la dinàmica del projecte BioBui(L)t-Txema, des de la presentació de la proposta a Pla de Buits fins al moment actual. <http://bamconf.org>

Ulus Atayurk (Istanbul). Periodista i agitador cultural de la lluita per l'espai públic com a resposta social en les darreres revoltes ciutadanes a Istanbul.

>Sessió 2. Dimarts 12 de novembre de 10 a 14h

Projecte Kairos (Barcelona). Adrià Rodriguez, artista visual, documentalista i editor de <http://projectkairos.net/>

>Sessió 3. Dimarts 19 de novembre de 10 a 14h

X-pressed. (Atenes). Sofia Tipaldu i Konstantina Nikopoulo, periodistes i corresponents de <http://www.x-pressed.org/> xarxa d'informació per facilitar l'intercanvi crític front la "crisi" i facilitar la comunicació entre els pobles, principalment els del sud d'Europa i la regió mediterrània.

Emmanuela Bove. (Nàpols) Arquitecta i urbanista membre del col·lectiu a Barcelona la participació canta i de REpensar Bon Pastor.

>Sessió 4. Dimarts 26 de novembre de 10 a 14h

Nau Estruch (Sabadell). Oscar Abril Ascaso, curador a la Fàbrica de Creació d'Arts en Viu L'Estruch de Sabadell. <http://www.lestruch.cat/>

Can Batlló (Barcelona). Recinte industrial a Sants reivindicat històricament i autogestionat pels mateixos veïns des de l'any 2011. <http://canbatllo.wordpress.com>

>Sessió 5. Dimarts 3 de desembre de 10 a 14h

Entitats i col·lectius del Raval

>Sessió 6. Dimarts 10 de desembre de 10 a 14h

Entitats i col·lectius del Raval

Entitats i col·lectius d'altres solars del Pla de Buits

>Sessió 7. Dimarts 17 de desembre de 10 a 14h

Entitats i col·lectius del Raval

>Sessió 8. Dimarts 14 de gener de 10 a 14h Toni Serra Abu-Ali (Duar Msuar [Marroc]-Barcelona). Videocreador, investigador i fundador dels arxius OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat). <http://www.al-barzaj.org>

Discussió de les propostes

Sessió 9. Dimarts 21 de gener de 10 a 14h

Presentació pública de les propostes

Fotos Evento 4.3 Primera sesión talleres SiteSize



Section 4
08|11|2013.
Txema-03

64 Invitaciones enviadas 18 registro

Texto mail Convocatoria - Octubre 31 (8 días antes del evento)

Hola a tod@s, Nos vemos el 8 Viernes en el Pou para hacer el punto de la organización de los talleres de obra y celebrar la firma del convenio con el ayuntamiento y el inicio del crowdfunding.

(los que quieran acompañar el momento firma en ayuntamiento el 7 a las 9 podéis enviar mail a info@bamconf.org.

Es muy importante para este evento que el máximo de personas que se han comprometido con la obra estén presentes es el momento para acabar de aclarar los puntos poco claros! el 10.11 tenemos ya el primer evento de proceso obra en el solar: Vamos a mirar con las varillas y la ayuda de expertos de geobiología las energías que nos vienen de la tierra! y posiblemente marcar el punto para la puesta a tierra de instalaciones. ! enviamos mañana otro mail de invitación para este evento.

También recordar que es importante apuntarse a los eventos eventbrite para poder organizar teniendo en cuenta los participantes!. un abrazo desde austria, valentina x Txema

Texto mail Seguimiento - Noviembre 7 (día de la firma)

Energía para el Salto!!

Atención Atención!!el proceso BioBui(L)t está entrando en fase ejecutiva!! Hoy 7.11 hemos firmado el contrato con Ayuntamiento! recibido las llaves del Solar y se ha iniciado la campaña crowdfunding!

La primera semana de campaña es muy importante! La plataforma Goteo donde está el proyecto nos advierte/aconseja que es bueno/importante llegar muy rápido al 20% del importe total.... digamos en una semana. Todavía no tenemos las herramientas de mailing del proyecto bien rodadas y en todo caso con este sistema también amigos y familiares "ajenos" a la bioconstrucción pueden encontrar inte-

Fotos Evento 4.4 Entrega de las llaves 07.11.13



evento en sede central del ayuntamiento con representantes de pla de buits



Fotos Evento 4.5 Tratando planificar ejecución



definición detalles-panning y puntos a aclarar

1 of 14

rés en apoyar el proyecto...a parte de apoyar la iniciativa en la cual todos los que estáis aquí en este mail habéis ya contribuido.... hay retornos individuales muy apetecibles! incluso como regalo!

aquí el enlace!

<http://goteo.org/project/biobui-l-t-txema>

y aquí el enlace al cartel que se colgará en el solar durante las obras y que da cuenta de todos los que ya han participado.

Cartel del proyecto a colocar en el solar



BioBui(L)t-Txema

Espai Bioarquitectura Mediterrània

Entitat gestora: BaM

Amb la col·laboració de: Sitesize, Olab, Labs, Meridiano70yMedio, Red de Construcción en Paja, PermaculturaBarcelona, InvestigacióCanyera

Empreses/materials que col·laboren i recolzen des de la fase de projecte:
LiPuma&Grujic&Paone, Arquitecturaproxima, Hempecosystem, Ecoclay, Querbioconstrucció, Casa S_Low, Sustenta, Arcustic, Juanola&Demiguel, Casapasiva, Comcal, Casetadepalla, ThinkingMu

Persones/professionals que han participat/ recolzat en la fase inicial de projecte:
Aguilar Ivan, Aira Albert, Allepuz Macia, Alloza Gaspar, Alvim Sofia, Arbelaiz Iñaki, Barguñó Pepe, Bernados Inma, Bestraten Sandra, Bosch Montserrat, Bueno Anay, Bueno Mariano, Bujons Arnau, Carbajal Rodrigo, Casali Cristina, Chamo Victoria, Coronil Cristina, Cristobal Beatriz, Daher Sara, De Anselmo Victoria, De Miguel Txema, De Orovio Julia, DelTento MariaLaura, Demostenes Lionile, Diego Clara, Dombriz Mar, Domenech Albert, Escudé Toni, Estevez Angel, Fernandez Sonia, Ferrer-Dalmau Silvia, Giménez Susana, Gómez Carmelo, Grujic Jelena, Guim Elena, Hernandez Sonia, Ibañez Francisco, Juanola Pere, Krug Martin, LiPuma Valentina, LivioWulf Alex, Lombardi Alfredo, Maini Valentina, Martin-Lara Sandra, Minchin Jon, Muleas Miguel, Muñoz Maria, Oses Susana, Padilla Padi, Palou Oriol, Paone Gemma, Pes Michela, Golda-Pongratz Kathrin, Pujol Elvira, Prats Carlos, Ramos Fatima, Sanchez Paqui, Sanz Sari, Sayez Carolina, Selli Sabina, Silvestre Elisabet, Solanas Toni, Solano Vanesa, Terra Marcela, Tornos Alicia, Urdaneta Lia, Vila Puig Joan, Zecchetto Mirco

i tu? I la teva empresa? I la teva entitat/organització?

BioBui(L)t és un espai destinat al treball, formació, divulgació i experiència de bones pràctiques d'autogestió de l'espai públic, ús de materials sans i naturals, innovació i creativitat aplicada a processos i productes, formació de tècnics, ciutadans en solucions concretes per a la millora del benestar, reflexió i debat sobre eines i exemples d'organització social.

I, sobretot, és un espai de trobada i intercanvi obert de vivència i experiència col·lectiva per al foment del bé comú.

Horari: de 10 del matí a la posta del sol

Informació:

<http://bamconf.org/pla-de-buits-biobuilt/>
info@bamconf.org



Termini d'ús temporal: tardor de 2016

Destí definitiu previst: trasllat o compostatge total



Section 5
10|11|2013
Txema-04

64 Invitaciones enviadas 11 registros

Texto mail Convocatoria - Octubre 31 (10 días antes del evento)

Hola a tod@s, Celebramos la firma del convenio y celebramos la posibilidad de acceder al solar realizando un "rastreado" del solar acompañados de expertos de la asociación de Geobiología GEA. Alicia Tornos nos acompañará. Tenderemos unas cuantas varillas!! vamos a barrer la plaza y el solar!!
Hacemos el domingo! para poder participar con toda la familia! todo el mundo muy bienvenido, con experiencia en geobiología o sin! el horario definitivo se enviará el martes 5 un abrazo desde austria,
valentina x Txema

Fotos Evento 4.6 Entrada en el solar- geobiología



en colaboración con Alicia Tornos y la asociación GEA

1 of 24

Texto mail noticia Crowdfunding - Noviembre 11 (1 días después del evento)

Hola a tod@s! Hoy 10.11 hemos realizado la primera actividad en el solar con las llaves que hemos recibido del ayuntamiento el pasado 07.11! Hemos experimentado con la geobiología de la mano de Alicia Tornos y la asociación Gea y hemos tenido la primera ocasión de encuentro con la ciudad! y el cumpleaños de la Valentina Li Puma ! Es el tercer día de Campaña y hemos llegado al 35%!! Gracias a tod@s!!!!

Gracias a Tod@s y aqui el comentario de Sari! al evento de hoy!

11 | 11 | 2013

Genial experiencia la de hoy con todas las energías en marcha!!! Muy bien las imágenes han captado el momento vivido de ilusión compartida. A seguir con la difusión para conseguir ayudas!!!

Increíble!! Gracias!!! Comentario de Toni-Voluntario BaM YA ESTAMOS AL 64%!!!!

11 | 11 | 2013

Gracias a todos los fans y los patrocinadores y gracias a la fantástica aportación de GEOMETRICS SL A PUESTO 1.000€!!!!,

Seguimos tod@s! Gracias Gracias Gracias El proyecto Txema está mostrando un espíritu y una energía fantástica!

El próximo Domingo vamos a pintar "graffitis" en el espacio para que nos guíen en la ejecución de la obra!!!!...y porque no vamos a pintar la carta astral del proyecto!

Texto mail noticia Crowdfunding - Noviembre 16 (1 días después del evento)

Espectacular!!

16 | 11 | 2013

Gracias Gracias Gracias a tod@s para mostrar que lo increíble es posible! en menos de 10 dd hemos llegado al 97% !

Hemos cambiado evento de "mapas astrales" para el 24.11 debido a fuertes lluvias!! el domingo que viene vamos a pintar nuestra felicidad y compartir con la ciudad la grandeza de vuestro apoyo!! Estáis todos invitados!! Aquí enlace para apuntarse al evento! www.eventbrite.es/org/4264341893

Section 6
15|11|2013
Txema-05

77 Invitaciones enviadas 18 registros

Texto mail Convocatoria - Noviembre 11 (4 días antes del evento)

Hola a tod@s! estamos ya en fase de aceleración!

Este Próximo Viernes en el Pou Encuentro Organización general tareas y eventos! Todo el mundo puede participar pero la información de preparación de evento está en el Trello para las personas que se nos han enviado carta de compromiso.

Max 35 Plazas Limitadas: necesario registro y prioridad para las personas ya activas en el Trello.

La organización ahora procederà por

- a) Tareas asignadas/Seguimiento
- b) Tareas a asignar-
- c) Archivo

Los que estáis en el trello podéis seguir allí la documentación de base para trabajar de forma activa y eficaz el próximo viernes y/o dejar los comentarios en el caso que no podáis participar.

Recordamos que siempre es posible incorporarse al proyecto de forma activa!

Y una forma importante y sencilla es apoyar en "crowdfunding" con una aportación o dando divulgación a la campaña entre vuestros contactos! Tenemos poco tiempo para conseguir el mínimo!

<http://goteo.org/project/biobui-l-t-txema>

Aquí enlaces a video/documentación de los últimos eventos!

El 07.11 hemos recogido (por fin) las llaves en ayuntamiento:

http://youtu.be/_5UiLec7ySw

El 08.11 en el pou hemos sacado de las cabezas todas las dudas que tenemos y que resolveremos en gran medida el Viernes! http://youtu.be/a1_2xX6qs7M

El 10.11 hemos realizado la primera actividad de divulgación/formación en el solar con "mapeado" de energías de la mano de Alicia Tornos y GEA

http://youtu.be/6TmLkd_80FM

El próximo evento es para el próximo domingo 17.11!! programa en otro mail!

un abrazo a tod@s,

BaM

El Ayuntamiento pasa lista de materiales para jardín/huerto disponibles



Fotos Evento 4.7 Preparación



1 of 32

Section 7

23|11|2013

Txema-05b

76 Invitaciones enviadas 0 registros

Texto mail Convocatoria - Noviembre 22 (1 día antes del evento)

Investigación Canyera nos guía mañana en la primera aproximación/cosecha de cañas para construir modulo de cubierta! Hay que cosechar con luna menguante para garantía de calidad/resistencia de la caña... así tenemos esta semana o nos pasamos ya al més que viene ;-) o bajamos la calidad ;-)

Se ha conseguido encontrar lugar y apoyo para el transporte en el último minuto gracias también a la colaboración de **Montse** de LowTech! Así mañana a las 10-10.15 cita en Av.Diagonal parada Maria Cristina! el bus de la cosecha es el 518 y sale a las 10.30!!.... nos vemos en el lado de dirección salida de la ciudad

Vamos en masa todos los que no estén enfermos y sean tan grandes/libres de poder decidir de la noche a la mañana sus programas ;-)!!

hasta pronto!

Texto mail -web seguimiento Crowdfunding - Noviembre 18

Desde primera visita al solarmucho camino hecho mucho por hacer...

18 | 11 | 2013

El pasado 16 de Julio pudimos entrar en el solar aun sin tener todavia oficialmente acceso al espacio y medimos con nuestros cuerpos el espacio una forma de acercarnos más próxima y más relativa a la medida de cada uno porque en la diversidad está la riqueza que el "metro" no puede medir ... y es uno de los video momentos mas emocionantes ahora... que estamos preparando la "pintada" de la carta astral del proyecto! ... La campaña sigue!! vamos ya por el 111% ! GRACIAS A tod@s!!

Texto mail -web seguimiento Crowdfunding - Noviembre 18

Recorrido del proyecto!

18 | 11 | 2013


Preparando la presenatción del proyecto en jornadas LowTech de la UPC de Barcelona... es una gran emoción volver a mirar los videos de desarrollo colectivo super eficaz del proyecto! Teníamos una primera propuesta...y abrimos las puertas a

propuestas de todos lso interesados! aqui en el tercer encuentro una idea del momento en que cada uno dibujó y presentó su propuesta de proyecto.... sigue!

Texto mail-web seguimiento Crowdfunding - Noviembre 18

A todo ritmo!!

23 | 11 | 2013

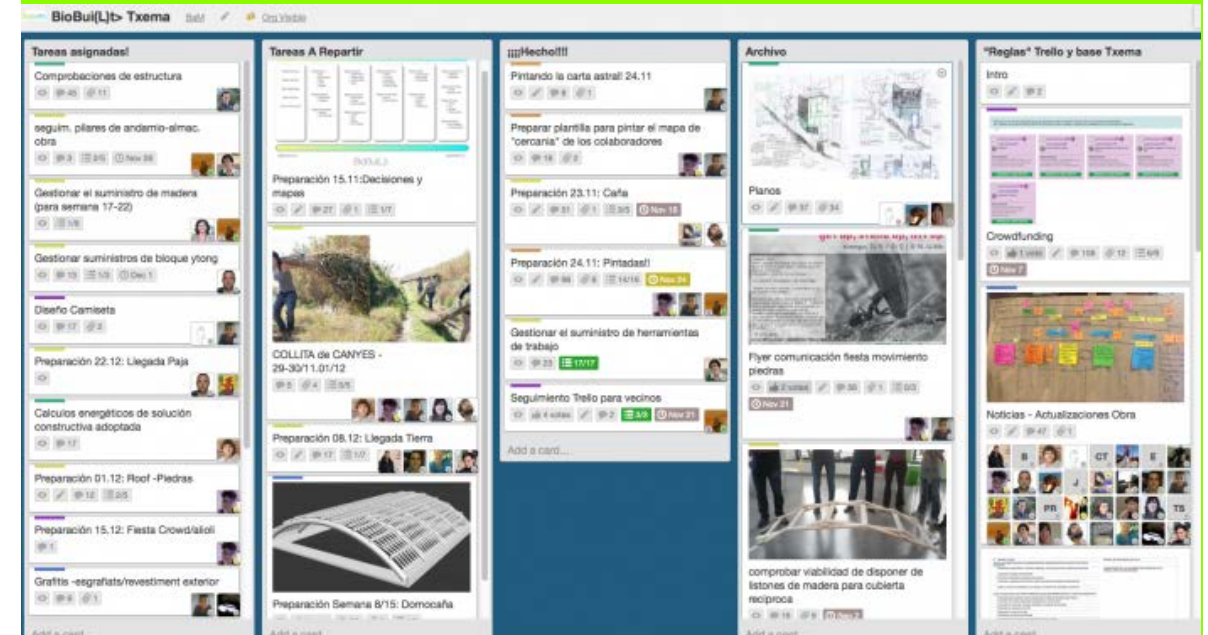

Hola a tod@s!! después de la prueba superada con merito de la presentación en jornadas Low Tech sigue el trabajo de coordinación para facilitar/permitir la partecipación más amplia de la ciudadanía a la experiencia de construcción colectiva de Biobui(L)t-Txema! Aqui tenéis una foto del estado actual de la herramienta on-line que usamos! y mañana celebramos el crowdfunding y la presentación de las jornadas LowTech que están demostrando que entre tod@s podemos construir otra forma de trabajar!! Flexible-Libre- Eficaz-Transparente-Abierta!!!

Section 8
24|11|2013
Txema-06

76 Invitaciones enviadas 13 registros 22 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Noviembre 11 (6 días antes del evento)

Hola a tod@s!

Después de la primera fantástica experiencia de divulgación y formación "reciproca" que hemos vivido el domingo de la mano de Alicia Tornos y la asociación de Geobiología GEA

Seguimos invitando a tod@s a participar a la campaña de financiación puesta en marcha con la plataforma goteo! ¡Vamos muy bien! en 5 días ya hemos llegado al 71%!! Gracias a tod@s!!!! Esto es increíble!! Vamos Vamos!!

<http://goteo.org/project/biobui-l-t-txema>

Y Seguimos haciendo "nuestro" el solar con actividades de preparación de la obra y acondicionamiento del solar! Este domingo vamos a pintar mapas que nos puedan guiar a lo largo del proceso...por ejemplo: La carta Astral del proyecto! o ya decidiremos el Viernes en encuentro Txema.05

Recordar que para dar seguimiento y crecimiento al proyecto es importante registrarse - así estaréis informados de siguientes eventos y nos ayudaréis en la organización!

un abrazo a tod@s, y hasta pronto

BaM

Texto mail AVISO CAMBIO Convocatoria - Noviembre 16 (1 días antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola!!! Buenos días!! Bueno mañana tal como está el día de hoy y la previsión de lluvias para mañana...lo único que podríamos hacer en el solar es un estudio de recogida de lluvia!! ;-)

Vamos a cambiar la fecha del evento para el domingo que viene! 24 de Noviembre! misma hora mismo sitio!!

Re-envío mail nueva Convocatoria - Noviembre 16 y 18 (8-6 días antes del evento)

Texto mail - web Noticia Evento en Crowdfunding - Noviembre 25 (1 día después del evento)


Carta Astral.1

25 | 11 | 2013

Poco a poco nos acercamos al principio de la obra! La campaña de crowdfunding está siendo un éxito hemos llegado al mínimo en menos de una semana y celebramos! ya hemos llegado al "optimo" y quedan 22 días de campaña!


Este domingo después de las lluvias hemos entrado en el solar para empezar a replantear y organizar el espacio de obra. Vamos experimentando y aprendiendo-a-justandonos a lo que significa una obra a pié de calle y abierta a la participación!!

Docs. Evento 4.2 Días previos al evento: preparación

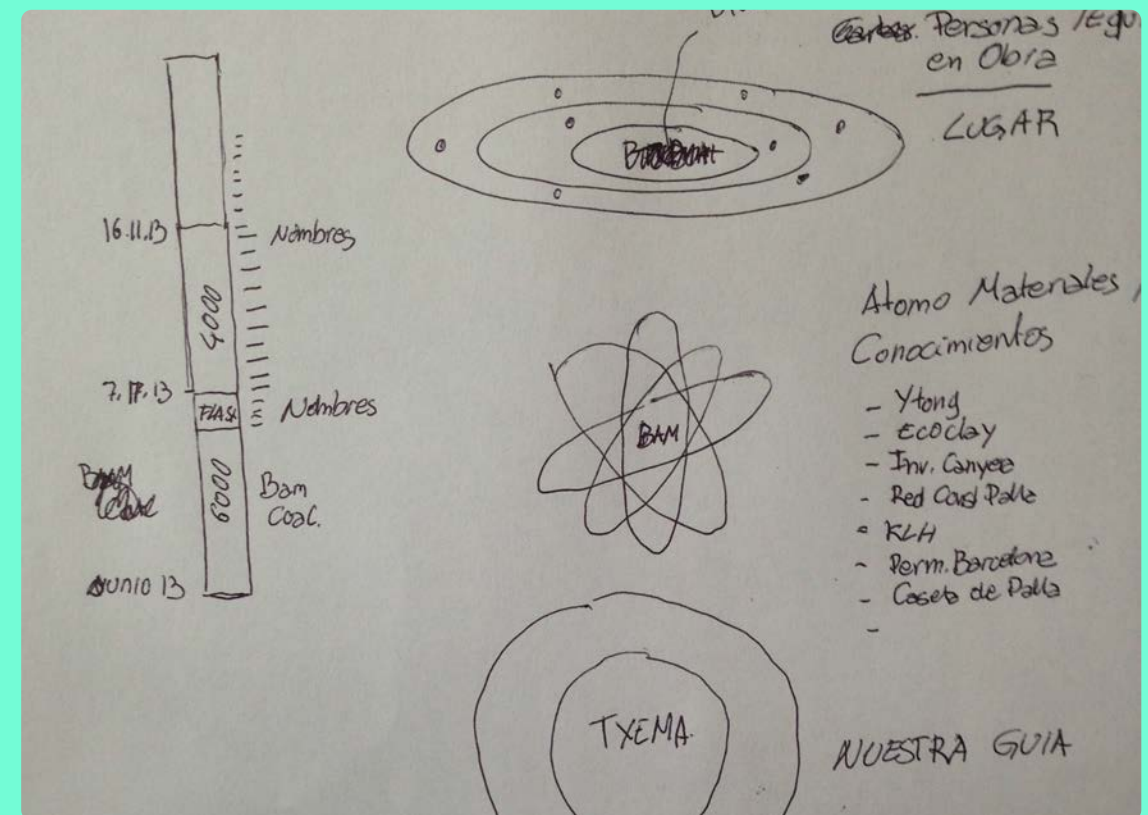

La idea: mapear la participación en el espacio

Montaje participantes al crowdfunding sobre las “puertas” rosas disponibles en el solar como base

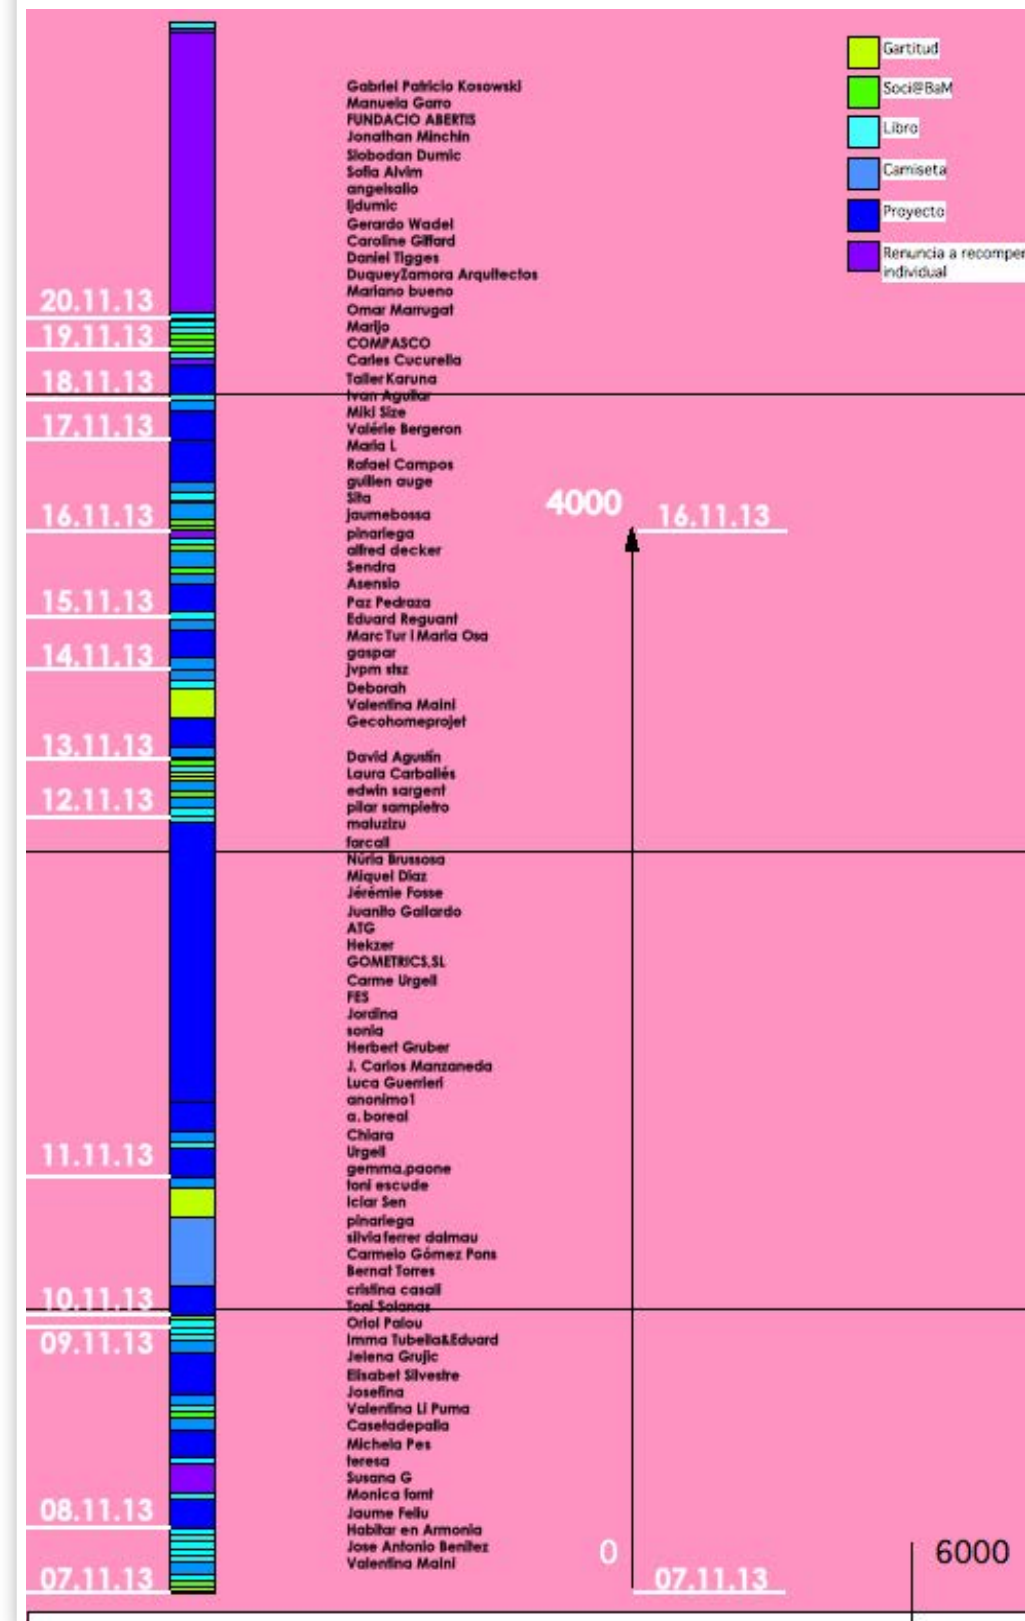

Fotos Evento 4.8 El primer día de trabajo en el solar



Empezamos con M.Pes recogiendo herramientas en Pou del figuera

1 of 107

El texto del crowdfunding traducido en árabe: no llegó a utilizarse

هي منظمة غير هادفة للربح، تشجع على البحث، النشر و أفضل الممارسات لبناء الصحي في منطقة البحر الأبيض (BaM)) بام المتوسط.
فضاءات مبنية ذاتيا و مدارة ذاتيا، منشأة من قبل المواطنين و لأجل المواطنين. للمواطنين ذوي المعرفة، الشغف، ذوي الرغبة في التعلم، الرغبة للإنتاج، ليشاركوا و يكونوا جزءا فاعلا في الاقتصاد، الابتكار والإنتاج الفاعل، وتعزيز ترويج الصحة في المدن

وصف موجز

قمنا بإنشاء عملية تصميم جماعي، والتي دمجت التعاون المجاني المتنوع من المتخصصين الشغوفين والمؤهلين.
نحن سنشيد مبنى بنفس الطريقة: بشكل جماعي وفقا لقدرات وتوافر أي شخص يريد المشاركة. سوف نبني فضاء
ذو كمفادات متعددة على مساحة تسعون متر مربع، يتم إنشاؤه باستخدام مواد صحية مثل القش، الطين، القنب،
القصب و الكلس ... فقط في مركز مدينة برشلونة

نحن نواجه هذا المشروع بشغف لجعل تحدي الابتكار الجماعي واقعا. نريد أن نظهر للمواطنين والعالم كله انه من
الممكن ان نبني ذاتيا في منطقة المدينة القديمة باستخدام المواد الطبيعية والتي سنكون قادرين على استخدامها كسماد
في المستقبل.

Section 9
30|11|2013
Txema-07

76 Invitaciones enviadas 22 registros



Texto mail Convocatoria - Noviembre 25 (4 días antes del evento)

Hola a tod@s!

Ya hemos vivido la primera "prueba" de trabajo colectivo en el solar!!

hemos empezado el replanteo! y los mapas/carteles de agradecimiento a co-financiadores y nos hemos acercado a experiencias nuevas de pensar el desarrollo de una obra experimentando con el yoga-hoop y la carta astral del proyecto!

Gracias especiales a **Michela Eva Gabriella y Sari !!**

aquí el video de fotos!! ya clásico <http://youtu.be/NbZoYxXAcvw>

Seguimos invitando a tod@s a participar a la campaña de financiación puesta en marcha con la plataforma goteo! ¡Vamos muy bien! ya estamos en el 156% y 93 co-financiadores !!!! Gracias a tod@s!!!! Esto es increíble!! Vamos Vamos!!

<http://goteo.org/project/biobui-l-t-txema>

Y seguimos con la emoción de ir construyendo el espacio nosotros mismos aprendiendo nuevas formas y experimentando con estructuras y procesos innovadores! vamos a cosechar la estructura de boveda!! de la mano de Investigación Canyera!! este viernes sabado domingo!! 2 días de cosecha y el domingo carga/trasporte y descarga en el solar!! no es necesario estar los tres días...cuantos mas somos mas lo pasaremos Bien!!

Al construir con materiales diferentes nos encontramos con novedades, ¿donde llamamos para que nos traigan las cañas??

Autogestion es la palabra, pues el ciclo de los materiales empieza mucho antes de la llegada a la obra. En este taller vamos a conocer el inicio de la obtención de la canya como material de construcción.

-la canya, planta invasora. -gestión de las riberas del río -técnicas de extracción de la canya.

Iremos a **Palma de Cervelló**, a 20 minutos de Barcelona en bus, en plena Àrea Metropolitana. Donde hemos acordado una colaboración mutua con el ayunta-

miento.

La actividad es de 10h a 17h. Quedando para ir juntas a las 10h en Metro Maria Cristina, dirección Llobregat, para tomar el bus 518

Cosas a traer:

-calzado cómodo-mejor botas. -comida y bebida -Guantes, si se puede.

¡Es importante registrarse a los eventos para ayudarnos en el seguimiento de la información y la organización!! en este caso el eventbrite tiene tres tipos de entradas así que podéis registrar vuestras entradas para uno, dos o tres días!!

un abrazo a tod@s, y hasta pronto

BaM

y recordar que todos los martes por la mañana siguen los talleres paralelos de SiteSize en el Pou - www.sitesize.net


Texto mail-web Crodfunding - Diciembre 1 (mismo día final de evento)

Txema.07¡ Canya de aperitivo!!!!

01 | 12 | 2013

Hoy 1.12.13 mientras **ya han empezado los trabajos de base del muro...** celebramos la llegada de la canya cosechada entre viernes y sabado! ¡Gracias a **Investigació Canyera!**....con la canya vamos a experimentar estructuras de forjados en boveda de cañon armados con cañas y completados con hempcrete!! ... próximo jueves por la tarde taller de Ytong- Hormigón celular... mas news en calendario web BaMconf.org

Docs. Evento 4.3 Documentación recogida de canya de J.Diaz



Localización: La Palma de Cervelló



Riera de Rafamans

La recolección de cañas tiene lugar en el municipio de *La Palma de Cervelló*, realizando los trabajos de recogida en los márgenes de la *riera de Rafamans*. Los trabajos de poda y carga del material se realizaron en un periodo de tres días (29/11/2013, 01/12/2013), con luna menguante en fase descendente. Momento en el cual la planta posee nutrientes y se conserva mejor. No es momento de crecimiento sino periodo de latencia.



Section 10
5|12|2013
Txema-08

98 Invitaciones enviadas 17 registros 22 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Noviembre 29 (6 días antes del evento)

se introduce diferenciación en entrada-definirse como profesional o no profesional

Hola a tod@s!

Después de la cosecha de caña! empezamos con talleres pilotos de formación/ autoconstrucción! este Jueves 5 Los tecnicos de Ytong-España y de la empresa Pendól Técnic nos guíaran en la manipulación y construcción del murete de base del edificio que realizaremos con los bloques de hormigón celular YTong. Las plazas son limitadas 20! es necesario registrarse! Vamos a celebrar el inicio del puente de Diciembre conociendo de cerca alternativas de construcción y empezando a poner manos a la obra!

un abrazo equipo BaM

Texto mail-web Crodfunding - Diciembre 1 (mismo día final de evento)

Txema.08 Espacio e Ytong!!

08 | 12 | 2013

Después de felicidad "canyera" y semana intensa de gestiones finalmente empezamos a poner en su sitio las piezas esenciales para empezar la obra! Gracias a la agilidad, flexibilidad y entrega de Freddy, Gemma y ValentinaLi los grafitis de Bio-Bui(L)t-Txema empiezan a tener buena buena pinta!! y gracias a la flexibilidad, entrega y profesionalidad de Raimon y Fran de **Ytong y Pendól** y con apoyo de tod@s los participantes terminamos la banqueta base del muro!! un día (jotro!) para recordar!!

Docs. Evento 4.4 Días previos al evento



Cata Terreno con O.Palou. Entrega materiales y prepación base muro con Ytong. Gestiones para suministro estructura vertical cubierta. Conexión agua. Encuentro con responsable proyecto Piso Piloto

1 of 66

Fotos Evento 4.9 Realización de la base del muro



gracias a Raimon de Ytong y Fran de Pendól ejecutamos la base del muro

1 of 80

Section 11
8|12|2013
Txema-09

102 Invitaciones enviadas 13 registros 13 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Diciembre 5 (3 días antes del evento)

se mantiene diferenciación en entrada-definirse como profesional o no profesional


Hola a tod@s!

Después de la cosecha de caña! Hoy se ha realizado la banquetta del muro!! con Ytong!! y se han terminado ya el "atomo" y el "sistema solar" !!! Este domingo nos vemos en el solar entre las 12 y las 14 para comentar los próximos pasos (que Clara está dibujando!!) , decidir como terminar la carta astral y seguir organizando el espacio para el confort en el trabajo!! y -...jij sobre todo vamos celebrar los avances con aperitivo al solete!! ..la idea es que cada uno traiga algo ;-)

ahh..poner atención cuanod os registráis a no doblar la inscripción! puede pasar ,-)!!

un abrazo equipo BaM

Fotos Evento 4.10 Tratando entender como seguir

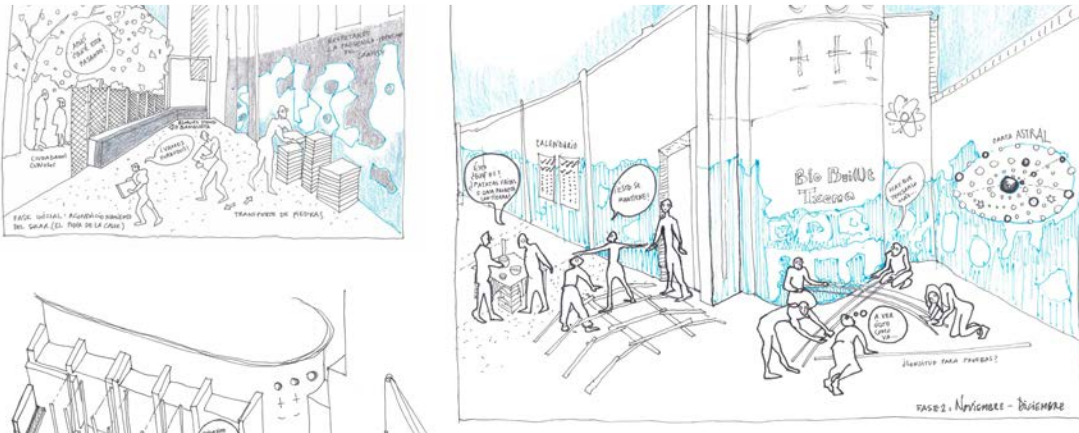

Las fases de obras previstas según C.Diego

• • •

Recibida Imagen de estructura que podemos re-utilizar



Section 12
15|12|2013
Txema-10

102 Invitaciones enviadas 32 registros 51 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Diciembre 8 (4 días antes del evento)

Hola a tod@s!


El pasado jueves 05.12 ha sido muy emocionante!! ya tenemos banqueta y conocemos un poco mejor una alternativa al bloque de hormigón como el YTONG... y Freddy Gemma y ValentinaLi han dado cara a mapasa "astrales" !! aqui el video <http://youtu.be/uthFnI3zry8>

Hoy domingo de fiesta nos vemos para celebrar en el solar y hacer un poco de composición de lugar de cara a grande momento de la semana que viene!!! : 12-13-14-15 Vamos a por la cubierta de Canya!!

De la mano de Investigación canyera haremos el modelo a escala del forjado en canya del modulo dos del edificio!! 4 días de trabajo!! hay unas 15 plazas disponibles por cada ! (ojo a no doblar vuestras inscripciones!!) hacer vuestras inscripciones si estáis seguros de poder estar de 10 a 18 en el solar para dar un poco de continuidad!!

un abrazo equipo BaM

El modelo de bóveda preparado por Investigación Canyera

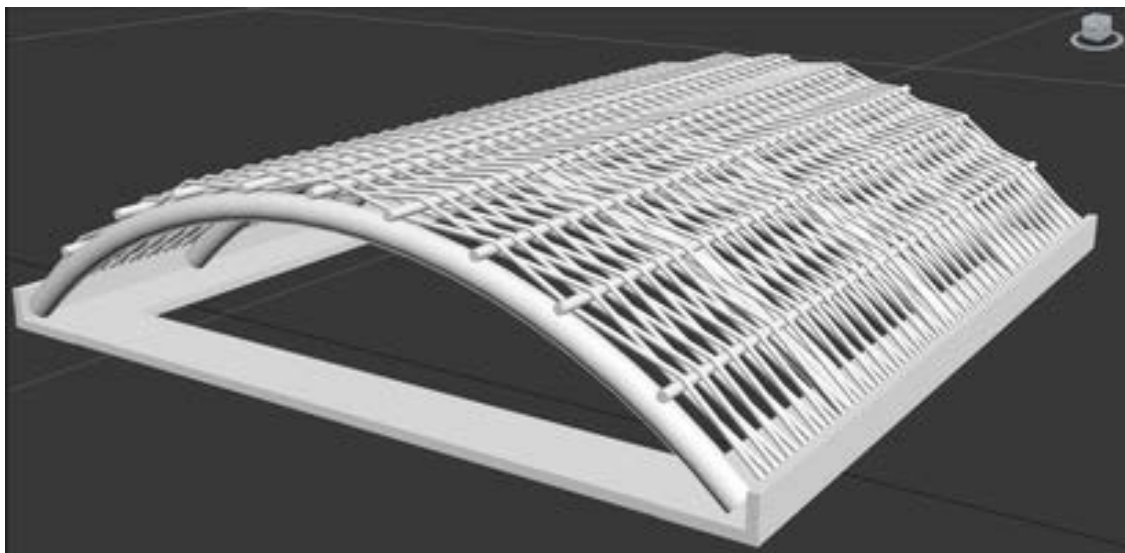

Texto mail -web Crowdfunding - Diciembre 20 (5 días después del evento)

Buenas fiestas!!

20 | 12 | 2013

Estimad@s co-financiadores estamos en el solsticio de invierno!!! y seguimos en campaña de financiación!!

Gracias a tod@s!! Os deseamos unas muy buenas fiestas! y aqui tenéis el video de las cuatro jornadas de ¡Canya de sostre!.... la gente pasando por la calle durante los talleres de construcción con canya se preguntaba si estabamos haciendo un Belen ;-) un abrazo a tod@s de parte de BioBui(L)t-Txema

Fotos Evento 4.11 Ensayando las cañas



1 of 18

Section 13

Calendario

En previsión de finales de año y vista la necesidad de tener alguna documentación en el solar que nos ayude a explicar el proyecto se diseña y publica un calendario con fotos de momentos y documentos más significativos ya vividos.

A finales de Noviembre inicio Diciembre se consigue que la plataforma de Crowdfundng nos adelante parte del dinero ya que la suma mínima prevista para conseguir objetivo de financiación ha sido ampliamente superada.

Con este primer ingreso se consigue comprar un conjunto de herraminetas de base que serán empleadas a lo largo de toda la obra, se imprimen copias de los calendarios y se garantiza el suministro de la tierra para ejecución de tapial.

Docs. Evento 4.5 Calendario: Buscando herramientas para comunicar y apoyar el proyecto



Section 14
27|12|2013
Txema-11

103 Invitaciones enviadas 32 registros 45 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Diciembre 20 (7 días antes del evento)

Detalles del evento

Hola a tod@s!

El primer taller de canya ha sido muy emocionante! Gracias a tod@s los participantes y a **Investigació Canyera** que ha guiado el proceso de construcción de los arcos a lo largo de 4 días!!

Aquí el video!: <http://youtu.be/QpNOY201KWY>

Se empieza a ver la transformación de materiales sencillos en elementos complejos de soporte al edificio!! y trabajar en la calle es una experiencia entusiasmante! hay mucha curiosidad y expectativa en los ciudadanos que pasan al lado!! Estamos haciendo algo muy bonito y sorprendente! Y ya empieza también a hacerse sentir la presión del espacio público: la demanda de limpieza y belleza del solar durante las obras es un reto muy bonito y complejo en la circunstancias en las cuales trabajamos!!

Este sabado 21 vamos a celebrar juntos el solsticio de invierno y seguimos con el pequeño-gran trabajo de organización y limpieza del espacio!

El próximo 27-28-29-30-31 Vamos a terminar el 2013 en belleza!!! esperamos realizar las pruebas de carga de la estructura de canya y acabar de trenzar la estructura de las bovedas!!

Como ya hemos visto podéis apuntaros para todos los días que queráis! registrarse nos ayuda mucho en la organización!

Recordar que el crowdfunding sigue hasta el 26.1!! todo el mundo puede ayudar mucho este proyecto dando difusión a la campaña que tiene su propio blog con actualizaciones aquí!

<http://goteo.org/project/biobui-l-t-txema/updates>

un abrazo equipo BaM

Texto mail -web Crowdfunding - Diciembre 23 > **Txema.06**

El video del inicio de apropiación del solar! Gracias!!

23 | 12 | 2013

Gracias a tod@s los participantes y tod@s los cofinanciadores a Toni Escudé ,su prima ;-) y Sergi Sanchez gracias a los cuales tenemos el video montado de la primera actividad de acondicionamiento del solar ...realizada el pasado 24.11. Gracias a Sari Sanz y a toda la familia de Txema que nos ha llenado de calor y apoyo. La generosidad del espíritu de Txema sigue fuerte y grande entre tod@s los participantes! Un abrazo muy grande y con mucho afecto en estos días.

Texto mail -web Crowdfunding - Diciembre 28 (1 días después del evento)

Txema 11¡Canya de Carrega!

28 | 12 | 2013

De la mano de Oriol Palou i con la colaboración de Investigació Canyera empezamos a realizar pruebas de carga y comprobaciones de diseño de la boveda en canya y hemprecte proyectada para BioBui(L)t-Txema! Un plaer muy grande que también los niños pueden participar con placer y seguridad a los trabajos-juegos!

Fotos Evento 4.12 Preparación y ejecución




1 of 38

Section 15

12|01|2014

Txema-12

Imagen elegida para mail de convocatoria



103 Invitaciones enviadas 13 registros 16 acreditaciones
Texto mail Convocatoria - Enero 8 (4 días antes del evento)

Hola a tod@s!

Justo antes de fin de año se ha empezado el proceso de comprobación estructural de las bovedas!!

Aquí el video!:

http://youtu.be/y6lZ8_a7ZVI

Y hay muchas más fotos y videos de las pruebas para montar!! pronto ;-)

Volvemos en 2014 este Domingo!!

Llegará la tierra para el Tapial comentaremos el proceso de ejecución de la tapia y de mortero Hempcrete para la boveda de caña! y trataremos de sentar las bases de los pilares!!!!

También miraremos el calendario del proyecto y quizá tenemos sorpresa Carta Astral!

Recordar que ayuda muchísimo vuestra inscripción en lista eventbrite!! Recordar que el crowdfunding sigue hasta el 26.1!! todo el mundo puede ayudar mucho este proyecto dando difusión a la campaña que tiene su propio blog con actualizaciones aquí! <http://goteo.org/project/biobui-l-t-txema/updates>

un abrazo equipo BaM

Texto mail Convocatoria - Enero 11 (1 día antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola a tod@s!! de momento hay 13 asistentes al encuentro de mañana!

Tod@s los que podáis : traer guantes y/o zapatos de seguridad!!

El plan para mañana es:

- preparar el lugar para acoger a la tierra del tapial y la estructura
 - presentación de las características de la tierra y organización de calendario de inicio trabajos tapial
 - presentación avances y "desavances" del programa de trabajos
 - preparación del siguiente encuentro del 19.1 de prueba de cargas de boveda de canya
 - es posible también que podamos seguir la limpieza de las cañas si Investigación Canyera confirma su disponibilidad.
- un abrazo! hasta mañana!!

Texto mail -web Crowdfunding - Enero 15 (3 días después del evento)

Txema.12 ¡Tocant Terra!


15 | 01 | 2014

El Domingo 12 hemos vivido un día muy especial!! la llegada de la Terra para el Tapial. Maite y Macari de FetdeTerra nos han preparado y traído el material! entre todos hemos ayudado a descargar!

Con Laura Caballés, Laura Barbera y Miquel Escobar hemos comentado la ejecución del tapial y encofrado! Además: hemos empezado a marcar los planetas/participantes- hemos hecho pruebas de puente Leonardo con listones de camas!! y protegido las canyas!!

Ha sido un día especial! Otro!! gracias a tod@s y hasta el próximo domingo!! Fotos de: Laura, Maite, Miquel, Tamara y Valentina!

Movie 4.1 La llegada de la tierra- debates sobre estructuras auxiliares y reciprocas



Section 16

Manual

16|01|2014


Manual Revoque de Barro!

16 | 01 | 2014

¡Ya casi está lista la edición del Manual de Revoque de Barro del grande prof. Gernot Minke!

BaM es muy feliz de haber conseguido publicar este libro en España! Gracias a Icaria Editorial por apoyar nuestro proyecto de difusión!

Faltan 10 días de campaña! Vuestro apoyo ha sido muy emocionante!! Tenemos 10 días mas para seguir dando difusión y dar más energía a este proyecto!

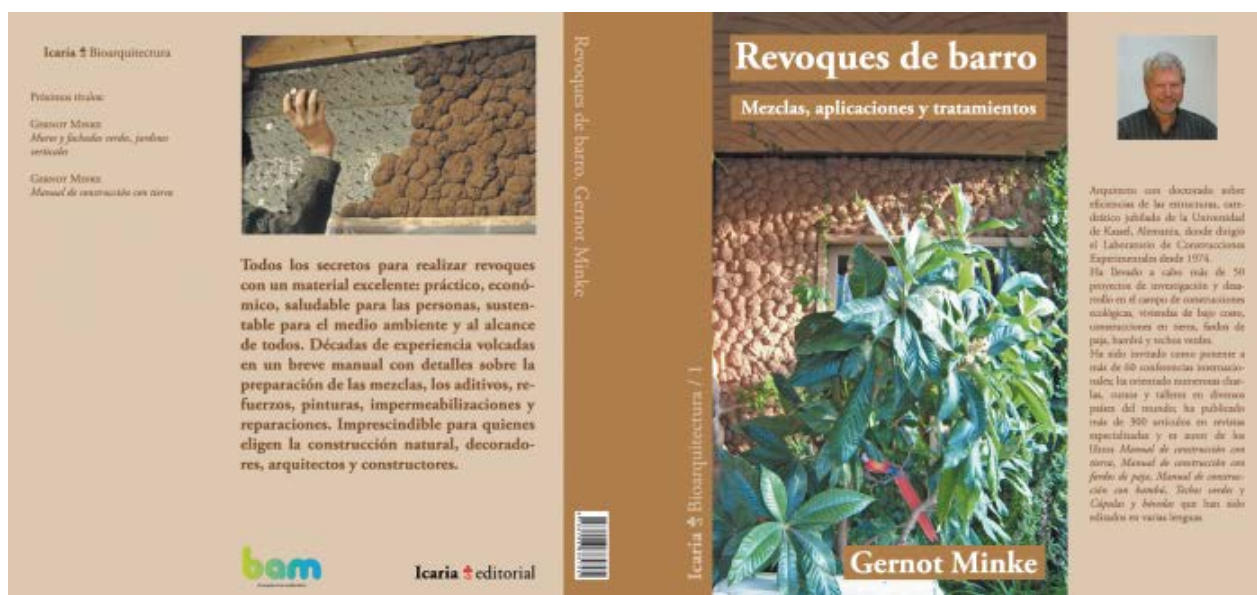

Icaria + Bioarquitectura

Revoques de barro
Mezclas, aplicaciones y tratamientos
Gernot Minke

**Muros y fachadas verdes
Jardines verticales**
Gernot Minke

Una nueva colección de Icaria editorial en colaboración con Bam-Bioarquitectura Mediterrània ofrece una serie de publicaciones que favorecen el conocimiento, la actuación y la imaginación en la utilización de materiales y técnicas para la actividad arquitectónica que ayuden a la construcción sostenible.

La colección inicia dos líneas diferentes de publicación centradas en los siguientes retos:

Actua(r): Cómo utilizar materiales naturales y tradicionales para una construcción ecocompatible.

1. *Revoques de barro.* Gernot Minke. Enero de 2014
2. *Muros y fachadas verdes, jardines verticales.* Gernot Minke. Abril de 2014
3. *Muros de barro.* Gernot Minke. Junio de 2014
4. *¿Qué? Construcción ecológica. Criterios, materiales, técnicas.* Nueva edición actualizada. Valentina Maini (coord.). En preparación
5. *Reglas profesionales de construcción en paja.* Luc Floissac (coord.) y Réseau Français de la Construction en Paille (RFCP). Mayo de 2014

Lib(r)es: Cómo librarse de materiales nocivos para el medioambiente y la salud humana.

1. *Cómo dejar el hormigón*
2. *Cómo dejar el poliuretano y similares*
3. *Cómo dejar las pinturas tóxicas*
4. *Espacio con valor ambiental.* Elisabet Silvestre / Valentina Maini

Icaria editorial

bam
bioarquitectura mediterrània

Section 17
19|01|2014
Txema-13

102 Invitaciones enviadas 20 registros 35 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Enero 13 (6 días antes del evento)

se introduce diferenciación en entrada-definirse como interesado en participar en: Grupo Espacio Bonito - Grupo Espacio Seguro-Grupo Documentar actividad- Grupo Espacio Limpio- Grupo Observar-Escuchar

Hola a tod@s!

Gracias a todos los participantes de Txema 12 ¡Tocant Terra!! ya tenemos la tierra para el tapial en el solar!! también hemos avanzado en organización del espacio! de mica en mica... ;-))!!

Para el próximo domingo tenemos como momento estelar la realización del ensayo de carga de los arcos de canya!! contaremos con la guía de Oriol Palou y la preciosa colaboración de Investigació Canyera y el Laboratorio "LowTech" de la UPC!

Comentaremos los avances del proyecto gracias a los renders de Jelena Grujic.

Y seguiremos con tareas de organización del espacio: Canya, Carta Astral, Piedras,

Plan del domingo:

- 10.00- Llegada y "firma" en sistema solar!
- 10.30- explicación de trabajos a realizar
- 11.00- equipos
- 11.30- inicio de los trabajos
- 14.00- pausa y comentarios
- 14.30- limpieza y cervecita (cada uno traiga lo que pueda/quiera)

Podéis registrar vuestra entrada eligiendo la actividad que os gustaría mas realizar entre las que están previstas!solo se trata de una preferencia ..ya veremos el mismo día...si las entrada para vuestra actividad preferida están agotadas podéis elegir la segunda que os guste!

Estamos aprendiendo a organizar un proceso de obra que se define sobre la marcha en función de la libertad de cada uno!!

un abrazo equipo BaM

Texto mail recordatorio Convocatoria los asistentes - Enero 17 (2 día antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola!!! Gracias a tod@s los que os habéis registrado! ayuda mucho en tarea de comunicación!

Hoy se ha conseguido realizar la compra de los materiales necesarios para la realización de las pruebas de carga!!! Tenemos trabajo bonito para este domingo!...

Es muy guay si conseguimos estar todos entre 10 y 10.15 en el solar! Tenemos guantes pero si tenéis los vuestros y/o zapatos de seguridad mejor!!especialmente si os gusta estar en actividades más "fuertes"

Está prevista lluvia...pero parece que ha mejorado la previsión...en todo caso tenemos reservada también la sala del Pou de la Figuera y si el tiempo es muy malo nos desplazaremos allí y podremos seguir con mucha actividad... siempre en espíritu de creación sobre necesidades y recursos del momento!!

Hasta el domingo!!

un abrazo!

valentina x equipo BaM

Texto mail Eventbrite retorno los asistentes - Enero 23 (5 día después del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola a todo@s! El domingo ha sido un día muy memorable!!! Gracias a tod@s!! Aquí tenéis el video de domingo con todas las fotos!! Esperamos que os guste! gracias a atodos los fotograf@s!!

Esta tarde estará también el video del lunes!!

Txema 13¡Carga de Canya! día 1 de dos!!ha sido imposible reducir el video!! 5 horas de relación intensa!! En 10 min .. Hay momento estelar en expresiones de todos e insuperable en @michela ! Esta obra se hace posible gracias al sentir abierto de las personas

<http://youtu.be/lu9of0rpHmk>

5 intensas horas de construcción comunicación y creatividad resumidas en unos cuantos minutos ;-)) Hay muchas fotos, muchas personas muchos puntos de vista!! El día ha empezado con lluvia gorda...hemos aguantado y mantenido la cita.... y ha salido el sol!! mucho interés en todos participantes y observadores! Aprendiendo y disfrutando!! Estamos autofinanciando y autogestionando investigación y formación con materiales naturales!! y en el medio de la ciudad, los vecinos y paseantes empiezan a acercarse a aprender y enseñar!! es muy bonito y emocionante además de importante para los profesionales!

un abrazo!! y recordar que:

-faltan 3 dias de crowdfunding! a por ello

- mañana empieza el segundo taller de Canya

- el sabado tenemos pequeña fiesta/intercambio Swap para celebrar!!

Podéis apuntaros aqui: registrarse nos ayuda muchisssssssimo en la organizaci3n!!

<http://www.eventbrite.es/o/bam-bioarquitectura-mediterrania-4264341893>

Texto mail -web Crowdfunding - Enero 23 (5 días después del evento)

Primer dia de dos : Prueba de Carga Canya!

23 | 01 | 2014

Txema 13¡Carga de Canya! dia 1 de dos!!ha sido imposible reducir el video!! 5 horas de relación intensa!! En 10 min .. Hay momento estelar en expresiones de todos e insuperable en @michela ! Esta obra se hace posible gracias al sentir abierto de las personas!

Lista de materiales para prueba de carga preparada por O.Palou

Carga:

- 2 Big Bag de 1 m3
- 2 Plásticos impermeables de aproximadamente 5x5 metros para poner dentro de los Big Bag de forma que quede un volumen impermeable
- Manguera 20 metros
- Reducción boca de 1" a acometida a manguera 1/2" (es correcto @gaspar_ ?)
- Varias abrazaderas metálicas 19 a 38mm (aprox 4)
- 6 tabloncillos de madera 20cm, 3 barras #50x50x3mm (pueden ser los regles de 2,5 metros de medición de deformaciones) y mortero para reparto de cargas y evitar cargas puntuales

Zunchos en extremos inferiores de la bóveda


- 2 zunchos de 1,5 metros de largo de tabloncillos de madera de 40mm de espesor y 40cm de ancho, unidos con cola, tirafondos y rigidizadores, con 4 ruedas unidireccionales en base en sentido perpendicular a largo de los zunchos
- 4 cáncamos con rosca para madera M16 para enganche de báscula
- 4 sacos de arena para reparto del apoyo de los nervios de caña

Soporte lateral tramo de bóveda, para evitar que la probeta tenga movimiento lateral durante las pruebas de carga:

- Cuerda mediana (aprox 25 metros)
- 6 estacas con varilla Ø12mm (aprox) longitud 30cm (aprox)

Los tabloncillos empleados serán conseguidos gracias a donación de empresa **Alsina** y gestión de transporte privado de participantes al proyecto. El contacto con empresa Alsina ha sido facilitado por Montserrat Bosch de grupo GICITED de la UPC. Oriol Palou e Investigación canyera aportan instrumentos de precisión para medición de desplazamiento/carga horizontal.

Esquema Prueba de carga de O.Palou

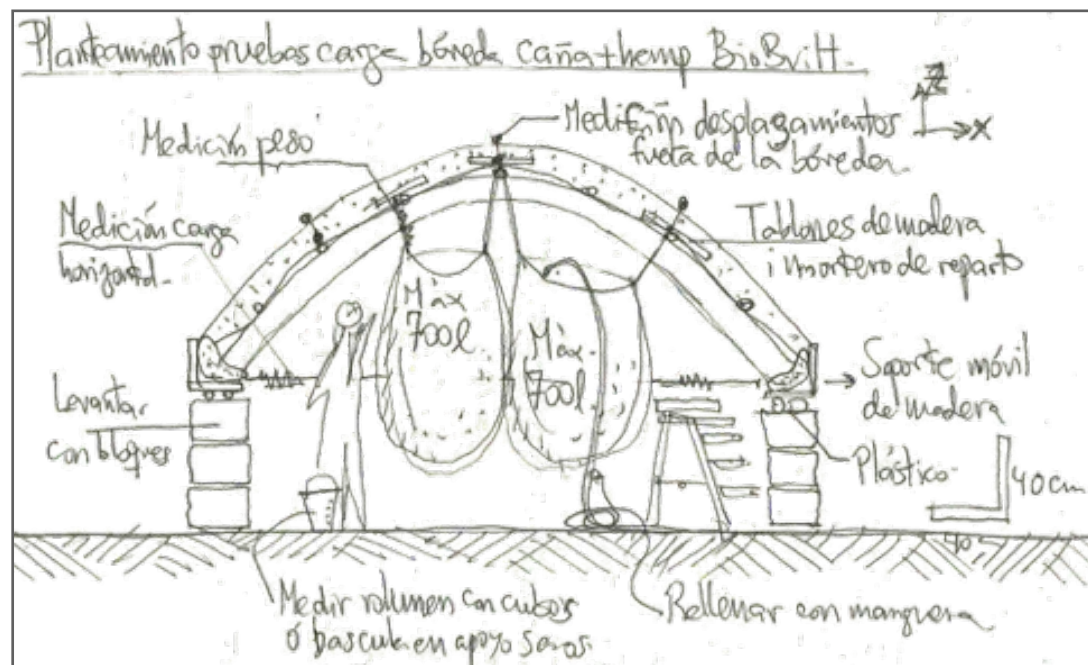

Fotos Evento 4.13 Ejecución pruebas de carga 1 día



1 of 44

Fotos Evento 4.14 Ejecucion prueba de carga 2º Dia



1 of 43

Section 18
24|01|2014
Txema-14

115 Invitaciones enviadas 14 registros 35 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Enero 15 (9 días antes del evento)

hay posibilidad de realizar pedido por día

Hola a tod@s,

¿Os Habéis perdido el primer Taller de Cosecha y arcos en Canya? Aquí tenéis otra ocasión!! ¿Os gusta practicar más y entender mejor como funciona todo el proceso desde el lugar de origen hasta la realización de la estructura? Este domingo 19 ya habéis visto haremos las pruebas de carga... y dos arcos de canya ya no se podrán usar para el BioBui(L)t-Txema...Vamos a cosechar de nuevo para realizar 3 arcos mas!! Apuntaros para todos los días que queráis-podáis!

- 24 gener (divendres) 10-17h / Palma de Cervelló: collita
- 25 gener (dissabte) 10-17h / Palma de Cervelló: collita/neteja/nervis i transport
- 26 gener (diumenge) 10-17h / Macba-Biobui(l)t: construcció d'arcs
- 27 gener (dilluns) 10-14h / Macba-Biobui(l)t: construcció d'arcs (OPCIONAL si no acabem diumenge)

Iremos a Palma de Cervelló, a 20 minutos de Barcelona en bus, en plena Àrea Metropolitana. Donde hemos acordado una colaboración mutua con el ayuntamiento.

- Palma de Cervelló / 10h en Maria Cristina para coger el bus 518 (billete de AMB 2 zonas). Traer comida, guantes y calzado apropiado.
- Solar Biobui(l)t / 10h. Traer comida, guantes, navaja, alicates y calzado apropiado. c/montalegre 4 al lado del MACBA

¡Es importante registrarse a los eventos para ayudarnos en el seguimiento de la información y la organización!! en este caso el eventbrite tiene tres tipos de entradas así que podéis registrar vuestras entradas para uno, dos o tres días!!

un abrazo a tod@s, y hasta pronto


BaM

Texto mail -web Crowdfunding - Enero 24

Esto es muy impresionante!

24 | 01 | 2014

Gracias Gracias a tod@s!! Gracias a Nova Energia que hoy nos emociona con una aportación importante!! a 34h horas del final de campaña estamos a casi 10.000€!! sois muy grandes!!

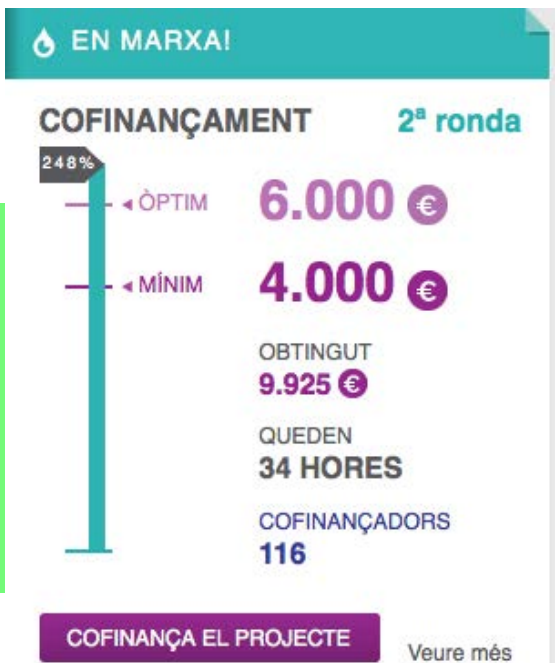

Fotos Evento 4.15 2ª Recogida mas arcos de Caña



1 of 15

Section 19
25|01|2014
SwapParty

132 Invitaciones enviadas 4 registros 31 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Enero 22 (3 días antes del evento)

El 25 de Enero nos encontraremos en el solar del C/Montalegre para una fiesta de intercambio de objetos (ropa, libros, música...) Abierto a todo el mundo. ¡Os animamos a participar!

Requisitos:

Registrarse en eventbrite

Traer 10 objetos para intercambiar. (Si es ropa debería estar limpia y en buen estado).

Cada participante colaborará en el pica-pica con alguna cosita hecha por él (bebida-comida). Practicaremos el DIT (Do It Yourself)

Funcionamiento:

El día 25 al llegar os registráis en la entrada y entregáis vuestro aporte al pica-pica y los 10 objetos. A cambio os entregaremos 10 "BaMings" (moneda de cambio).

No iniciaremos el intercambio hasta que todo el mundo esté registrado. Mientras podemos ir paseando y viendo aquellos objetos que nos interesen.

En cuanto empiece el trueque si hay empate lo solucionaremos jugando a Piedra-Papel-Tijera.

A la salida devolveremos los BaMings y los participantes a cambio se llevan 10 objetos nuevos para él.

Ambientaremos con musica, comida y bebida.

Horario:

Recepción: 10:00-11:30

Trueque: 11:30-13:00

Salida: 13:00-14:00

Texto mail -web Crowdfunding - Enero 27

¡Exito! de la Campaña y de la Carga de Canya!

27 | 01 | 2014

Estimad@s!! Gracias Gracias Gracias por vuestro apoyo!! hemos llegado al 250% y la bella cantidad de 10005€!!! y todo esto ha coincidido con el éxito de la prueba de carga de los arcos de Canya.

Que han mostrado, como querías demostrar, que los materiales naturales nos regalan una resiliencia increíble!!

En los próximos días publicamos el video del primer mercadillo SWAP de Intercambio que hemos organizado para celebrar el crowdfunding! De momento aqui tenéis el segundo video de la prueba de carga!! 4 puntos de vistas diferentes! Buen disfrute!! ¡¡ Felicidades por apoyar este proyecto innovador!!

Fotos Evento 4.16 Celebración final Crowdfunding



BaM organiza mercadillo intercambio Swap. Se distribuyen retornos disponibles : El Libro de G.Minke

1 of 43

Section 20
28|01|2014
Txema-15

137 Invitaciones enviadas 6 registros 13 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Enero 22 (3 días antes del evento)

el evento se prevé de 5 días de duración de miércoles 28 de enero a sábado 1 de febrero..hay posibilidad de registro de entrada por días.

Esta tarea se desarrollará de forma muy distinta a la prevista y se mantendrá activa (inacabada hasta el evento siguiente realizado el 7 de Marzo 2014.

La segunda cosecha ha terminado- Super Felicidades a tod@s los cosechadores!!!!

!!! Después del éxito de la prueba de carga ..(video día 1 y video día 2) vamos hacia el final de la ejecución de la cubierta de caña...ahora tenemos todo el material en el solar!

Hay que hacer limpieza cañas, prepararlas para hacer nervios y entramado!! un trabajo muy ZEN y relajante!!

El Reto: tener limpiadas las más de 1500 canyas cosechadas para el próximo domingo!

El Plan:

- Investigació Canyera estará en abertura y cierre del día para explicar como manejar las herramientas y ejecutar la limpieza de la canya.

- 5-6 personas por mañana...limpian las canyas y llevan los restos a contenedor de organico a 20 m del solar . las personas que hacen limpieza se autogestionan y esperan hasta la vuelta de Investigación Canyera para valoración del trabajo y cierre del solar

Fotos Evento 4.17 Búsqueda recursos y preparación ejecución muros



Un mes de trabajo cotidiano en el solar y en la plataforma de trabajo on-line Trello: limpieza cañas, acceso almacén, compra herramientas, suministro materiales para muro Greb, montaje toldo con Siddhu, donación madera **Papik**, suministro estructura de acero, contactos con **Fundación tot Raval** y coop **Impulse**. estudio encofrado tapial , actualización planos- comprobación estructura - imagen render, obtención licencia de obras, calendario actividades para primavera

Section 21
07|03|2014
Txema-16

144 Invitaciones enviadas 6 registros 46 acreditaciones

Texto mail Convocatoria - Febrero 24 (11 días antes del evento)

Estimad@s! Hace tiempo que no hacemos un encuentro en el Pou!! Este 7 de Marzo ya son 5 meses que tenemos las llaves del solar!!! 5 Meses marcados por algunos momentos estelares como el yoga-hop, la varillada, la llegada de la canya, las pruebas de carga...pruebas de carga de la canya y de todos nosotr@s ;-) !

El Crowdfunding iniciado el mismo día de la entrega de las llaves ha sido una experiencia intensa y emocionante que bien está reflejada en las palabras del grupo Ecovamos que nos dedica este artículo:

<http://thepositivetrend.com/una-bio-construccion-en-el-raval-de-barcelona/>

¡¡Tenemos pendiente editar el video del mercadillo SWAP y de los días de CanyaZen!!

Hemos empezado a pasar tiempo en el solar y ocupar/organizar el espacio y nos ha llegado mucha energía positiva y nos han entrado muchas dudas a veces incluso un poco de yuyu ;-)

Hemos hecho los grafitis-mapas de personas/participantes/empresas y hemos recibido las visitas nocturnas de los grafiteros "de verdad" que han cubierto los mapas....¡el solar está animado!!

Este encuentro vamos a probar a compartir el estado actual del proyecto y trataremos de organizar un calendario de eventos/personas para marzo/abril.

Una ocasión para tod@s de volvernos a juntar y re-componer el lugar actual del proyecto entre personas que se han "enganchado" y personas que se han "perdido"

El programa es el siguiente:

h. 18.00 encuentro en el solar para visita/actualización en situ para los que quieran/necesiten

h. 19.00 empezamos reunión en el Pou primera hora de presentaciones de (en orden alfabético y pendiente confirmación), 10 min en media x cada : Albert, Arnau,

Docs. Evento 4.6 Evaluación estado del Proyecto



Re-Set
Pou de la Figuera
7.3.14
h.19-21

Presentación colectiva: avances, propuestas, retos

1 of 80

Carmelo, Clara, Gaspar, Jelena, Joel, Julia, Julio, Maria, ValentinaLi, ValentinaM, Toni

h. 20-20.45 confirmaciones y redacción colectiva para pasar de borrador a calendario organizado!!

i.

Recordar que ayuda mucho registrar la asistencia y elegir si vais a estar desde las 18 en el solar o desde las 19 en el Pou para no dejar a nadie a medio camino;-) un abrazo!!

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 5 (dos días antes de evento)

Re-Set y nuevo Inicio

05 | 03 | 2014

Hola a tod@s!! hace mucho que no comunicamos!! incidencias informáticas nos han pillado desprevenid@s!! Este Enero-Febrero hemos pasado mucho tiempo en el solar y empezado a tocar con mano la belleza, riqueza y complejidad de trabajar en este espacio. Ya tenemos montado el programa de actividades de Marzo y este Viernes 7 hacemos visita al solar a las 18h y a las 19h reunión en el Casal de Barri en sant pere mes baix 70 para explicar como está el proyecto y fijar el calendario de toda la primavera.

Está muy invitad@s!! a participar para mas info y registro de asistencia (muy importante) enlaza aquí:



Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 5 (dos días antes de evento)

¡Fiesta Mujer!:Estructuras Renacidas

05 | 03 | 2014

Este Sabado 8 y Domingo 9 de 10 a 14.30/15 vamos a montar esta increíble estructura diseñada por Tous i Fargas en los años 60 y rescatada milagrosamente! un ejemplo espectacular de valor e importancia del diseño y de la creatividad para la reducción de consumo de materia y energía!

Si tenéis ganas de participar y/o curiosear ya sabéis nos vemos en montalegre 4

Texto mail retorno a los asistentes - Marzo 11 (4 días después del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterrània:

Hola a tod@s!! gracias por participar al encuentro de Re-Set del proyecto Bio-bui(L)t para la construcción del espacio Txema!!

Ha sido un momento importante de re-encuentro!

Un paseo muy bonito entre los dos espacios esenciales para este proyecto: el espacio de la obra y el contacto con la realidad incontrolada ;-) y el espacio de la reflexión en entorno protegido y familiar del Casal de Barri Pou de la Figuera!

Y ¡ Tenemos conexión definitiva a LUZ!! justo mientras estábamos en el solar viendo el estado del espacio han venido los instaladores a realizar la conexión! si hubiésemos querido no habría pasado ;-)


Aquí tenéis el enlace a la presentación colectiva realizada en el Pou!

<https://www.dropbox.com/s/gou2va5efuhxn9x/IntroTod%40s.pdf>

Seguimos!! gracias a tod@s por vuestra presencia i caliu!

un abrazo equipo BaM

Fotos Evento 4.18 Modificación diseño

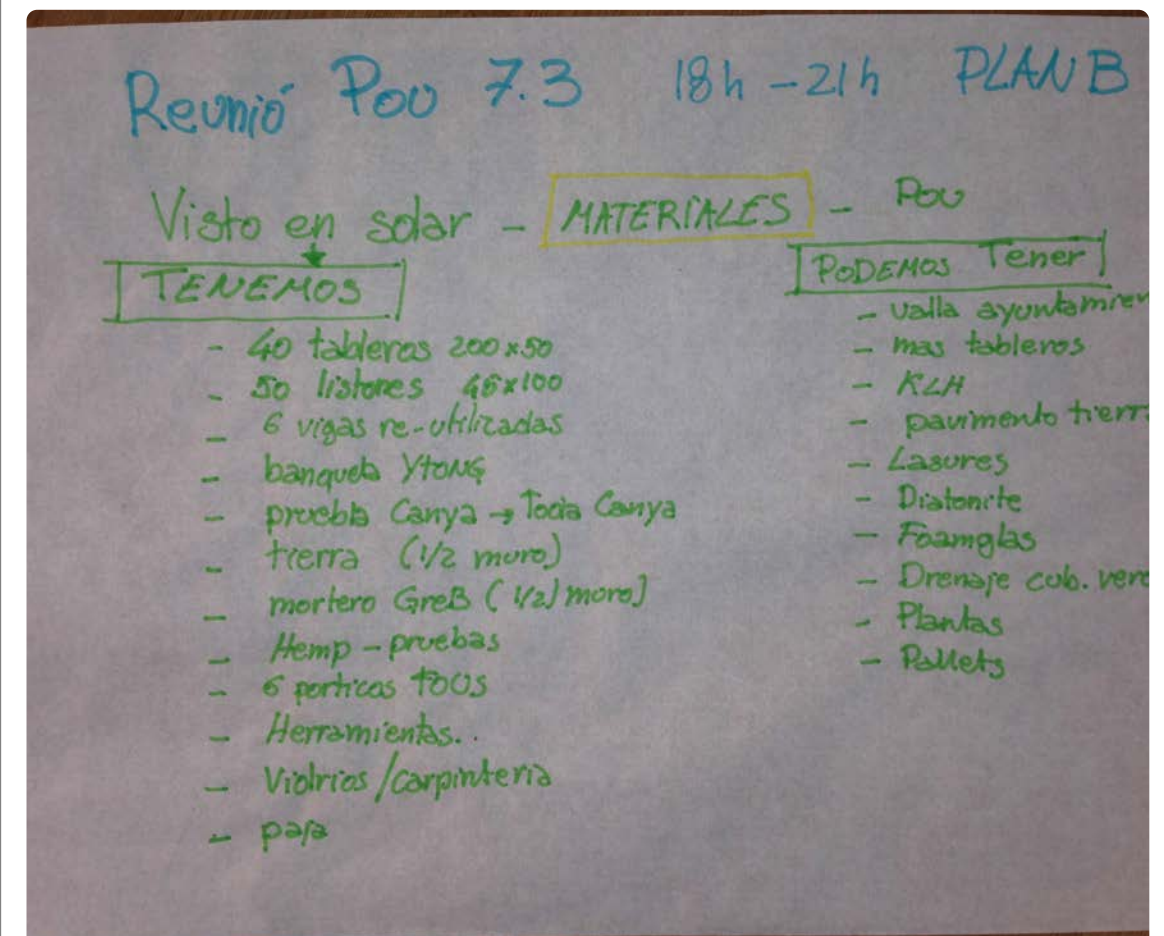

7 Marzo visita al solar y reunión en Pou con presentación colectiva. 8 Marzo- Pruebas colocación estructura Ramon Andreu. Rmt Architectes

BioBuilding

Fase 3. Marzo 2014 Abril 2014

En esta fase el proyecto se concreta el trabajo realizado en fase anterior. Se consiguen ejecutar los tres muros previstos. Los pasos y elementos significativos del proceso realizado en esta etapa son:

- Intenso uso de la plataforma on-line trello
- Tensiones entre canales de comunicación - trello y whatsapp
- Formalización de carteles para anuncio de actividades
- Ejecución del muro de tapial, greb y cal y cañamo
- Integración de actividades culturales en eventos de auto-construcción
- Integración de participantes y energías al proceso de ejecución de la obra gracias a actividades lúdico-culturales llevadas a cabo
- Inicio colaboración con estudiantes UPC que realizan su tesis final de master

La situación del proyecto en el momento de iniciar esta fase se puede definir como resultados de los eventos y procesos acontecidos en la fase anterior.

En el mes de Marzo sabemos que:

- El crowdfunding ha superado las expectativas y se han conseguido 10.000€ de apoyo. Ha sido posible superar la expectativa gran medida gracias a la implicación directa del entorno de la familia de Txema de Miguel. De esta cantidad habrá que descontar el % de la comisión cobrada por la plataforma de crowdfunding Goteo
- Las personas y asociaciones que presentaron su carta de compromiso con el proyecto tienen dificultades prácticas a la hora de participar a los eventos previstos y/o solucionar en autonomía y en tiempos previstos las propuestas de proyecto y/o las tareas delegadas/asignadas.
- Se ha comprobado que no hay posibilidad de ejecutar el diseño previsto en los tiempos previstos a pesar de disponer de los materiales
- Se han conseguido realizar presentaciones colectivas del proyecto y se ha generado el programa del primer evento organizado entre diferentes entidades y personas

- Se ha decidido modificar el diseño reduciendo la carga prevista en autoconstrucción de estructuras de cubierta.
- Se ha tenido que adquirir la tierra para la ejecución del muro de tapial.

Índice de decisiones elaboradas en eventos de esta fase

- 01-Estructuras Escondidas:
 - ejecución de encofrado para tapial en base a materiales disponibles, se descarta y modifica diseño inicial
 - ejecución de entramado estructural para Muro Greb según diseño inicial aunque haya modificación de diseño de cubierta previsto
- 02- Som-Hi Celebrem la Primavera:
 - definición de acabados de muros greb : exterior con Daitonite de Diasen, interior con paneles prefabricados de tierra prensada de Ecoclay
 - definición acabados de muro tapial : exterior estucado de cal, interior visto
 - debates acerca de terminación superior de muros: tapial con planchas de acero recicladas provenientes de tipografía
- 03- Palla Greb:
 - modificación alzado previsto para muro de Greb: se deja parte superior del muro sin ejecutar, se decide mantener parte superior transparente
- 04-Pou Repaso:
 - se presenta modificación alzado y cubiertas
- 05 - Tapial:
 - se modifica dimensión final del Tapial
- 06- Fiesta Final Tapila inicio Muro Cañamo:
 - se define estructura de soporte muro de cañamo en base a material disponible : reutilización elementos de soporte vertical de encofrado de tapial
- 07- Fiesta Final Tapial inicio Muro Cañamo:
 - se decide modificar posición de muro de cal y cañamo para garantizar mayor flexibilidad en posibilidades de ejecución de estructura de cubierta y fachada en vista de la posible dificultad de realizar el 4º módulo de muro de fachada previsto (fachada verde)

Section 1

15|03|2014

01.Estructuras Escondidas

145 Invitaciones enviadas 50 registros 64 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Marzo 11 (3 días antes del evento)

Duración del evento dos días. 14 y 15 de Marzo

Posibilidad de apuntarse por la mañana o por la tarde



Empezamos a levantar los muros! Este Viernes y Sabado con la ayuda y guía de equipo de Casa Passiva y Fet de Terra replanteamos y empezamos a realizar el entramado de madera para la realización del muro de paja y el encofrado (tapiera) para la realización del muro en Tierra.

La actividad será un trabajo "de fino" : tomar medidas, marcar la madera para el corte, fijar las piezas a la banqueta. También realizaremos avance en la definición de detalles del proyecto después de las reflexiones surgidas en evento del pasado Sábado 8 de marzo donde se ha replanteado el uso de la estructura diseñada en los 60 por Enric Tous y recuperada para el proyecto BioBui(L)t.

Para la organización eficaz del trabajo en el espacio tan pequeño consideramos que podrán participar activamente unas 8 personas en 2 equipos de 4 personas unos de apoyo a estructura Greb y el Otro de apoyo a realización encofrado.

También seguimos necesitando realizar trabajos de acondicionamiento del espacio para preparar la llegada de las balas de paja y la fiesta del 21.3

Para organizar el espacio de trabajo os pedimos de seleccionar vuestra entrada .

Os pedimos también de llegar con vuestros guantes- clazado de seguridad y cascos si tenéis, nosotros disponemos de 5 pares de guantes.

Texto mail recordatorio Convocatoria - Marzo 13 (1 día antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterrània:

Estimad@s falta poco al encuentro de mañana! Casi todo está listo: herramientas, materiales, espacio limpio! Recordar: Para estar bien en el Espacio Txema la única herramienta necesaria es disfrutar del momento de aprendizaje y libertad.

Las actividades de Biobui(L)t se basan siempre en los principios del OPENSOURCE: a) hay algo concreto que nos interesa avanzar/trabajar b) las personas que participan están bien! para objetivo c) cuando se termina el sábado se termina (no se deja cosas sin limpiar por ej.)

Los temas concretos a resolver son:

- replantar y montar estructura de madera del GREB y encofrado para Tapial

Mirco de CasaPassiva nos explicará y guiará quien se apunte a ejecutar el entramado del greb

Maite y Macari de FetdeTerra nos explicarán y guiarán en ejecución y montaje encofrado

ValentinaLi y Jelena estarán en el solar el Viernes por la mañana con ordenador por comprobación de medidas y planos

Viernes por la mañana hay más de 15 personas apuntadas... y sabemos que para trabajar en algo..en más de 4 se monta un lío ;-)

A lo largo del día de hoy y con vuestras sugerencias iremos afinando el plan de "ocupación" de la actividad... y/o pasar más info .

Que haya buen día!

un abrazo valentina x BaM & Espai Txema

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 20

01.Estructuras escondidas

20 | 03 | 2014

Estiamd@s el pasado 14-15 de Marzo no levantamos del suelo y hemos puesto otra vez el contador a 0 ya son más de 32 eventos !!! se han realizado los entramados de muro de paja y el encofrado para el muro de tierra!! aqui teneis el video/fotos.

Mañana dia de la primavera llega la paja en Barcelona con gran fiesta-pasacalle-y presencia de fantastico grupo de Danza Liant la Troca y del proyecto Street Food. de 10 a 12 pasacalle de 12 a 17 fiesta descarga de la paja

Fotos Evento 5.1 14|03|2014 1er día de Montaje



Montaje estructura Greb con **Caseta de Palla** y vecinos de Arbucies y Montaje encofrado para tapial con **Fet de Terra y Terram**

1 of 89

Fotos Evento 5.2 15|03|14 2nd día de Montaje



Montaje estructura Greb con **Caseta de Palla** y vecinos de Arbucies y Montaje encofrado para tapial con **Fet de Terra y Terram**

1 of 146

Section 2
21|03|2014
02. ¡Som-Hi. Celebra! Primavera!

141 Invitaciones enviadas 24 registros 55 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Marzo 16 (5 días antes del evento)

Estimad@s!Vamos a Celebrar que empezamos a levantarnos del suelo y que llega la Primavera!

Los que quieran participar activamente en el Cercavila la cita es a las 8.30/45 en el solar

Recordar que registrarse nos ayuda mucho a comunicar/organizar

Gracias a tod@s por los magníficos días de construcción vividos este Viernes y Proyecto! Y gracias especialmente a FetdeTerra, CasaPasiva & todo equipo de Arbucies gracias a los cuales los materiales se han ido transformando en estructura!

aquí el video del evento pasado: <http://youtu.be/AojGmhYyCVQ>

y también para los que os habéis perdido episodios anteriores:

el diario del mes de febrero: <http://youtu.be/gtTA4QGs6mg>

y la semana de Re-Set, Re-Planteo: <http://youtu.be/gtTA4QGs6mg>

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 20

Fiesta Primavera e Inicio Colocación Palla

20 | 03 | 2014

Estimad@s , arranca la primavera al Espai Txema proyecto BioBui(L)t con la fiesta-llegada de la paja a Barcelona. ¡Vamos a cruzar el barrio del Raval con el tractor!! y rendir homenaje al equinocio, al barrio y al campo!! Después de la fiesta..el sábado y domingo seguimos trabajando en el muro de paja! estáis tod@s invitados! aquí el enlace para registrarse.

bioarquitecturamediterranea.eventbrite.es

Con tanta actividad se ha atrasado un poco la entrega de los retornos!! Vamos a empezar a enviar muy pronto!! y mañana para los que están en Barcelona hay los Libros de Minke!!



Texto mail retorno a asistentes - Marzo 22 (1 días después del evento)

Felicidades a tod@s!! y actualización programa:

Mañana domingo 23 no hay actividad solo nos encontramos un momento a las 11 para desencofrar una parte del muro.... Pero seguimos con el greb el 26 y 27 ahora se enviar mail para registrarse!!

Estimad@s ayer 21 hemos vivido un día increíble aquí tenéis el video de la tractorada... se está montando el video del resto del día pero nos hemos quedados sin fotos de la performance de Liant La Troca si alguien tiene puede enviar a

vmaini@mac.com

<https://www.youtube.com/watch?v=qvx-231ng7M>

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 20

¡Fiesta Primavera! Llega la Paja

22 | 03 | 2014

Gracias!! Sin vosotr@s esto no habría sido posible!! Ayer evento especial ¡Primavera! en Barcelona...tractorada por el barrio del Raval con la Paja para el Muro del Espai Txema. Performance de @LiantLaTroca y street food BCN MES y las sorpresas del Barrio! El proyecto BioBui(L)t se hace más bello cada día!. Gracias a tod@s! Primer vídeo de dos. youtu.be/qvx-231ng7M.



03.¡Palla Greb! 26 de marzo de 2014
10:00 - 27 de marzo de 2014 18:00

| [Ver mapa](#)

Vamos a terminar la primera fase del Muro Greb!. No es necesario tener conocimientos previos pero si es necesario:
- Llegar puntual -...

Asistir



04.Pou-Repaso 28 de marzo de 2014
19:00 - 21:30

Barcelona | [Ver mapa](#)

Si quieres conocer las entrañas del proyecto BioBui(L)t y colaborar en la creación del mismo de forma activa este es tu evento! Vamos a...

Asistir



05.¡Tapial!! 29 de marzo de 2014 10:00
- 30 de marzo de 2014 17:30

08001 barcelona | [Ver mapa](#)

Vamos a terminar el muro de Tapial! + Actividad Familiar "Tapialito" los padres podran estar haciendo tapial grande mientras sus niños...

Asistir



06.Cañamo 5 de abril de 2014 10:00 - 6 de abril de 2014 17:30

| [Ver mapa](#)

Es con grande felicidad que os invitamos a participar a la demostración-ejecución del Muro en HempCrete- Cal y Cañamo que nos ofrece la...

Asistir

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 24

Un momento especial de un día genial

24 | 03 | 2014

Gracias a Sergi Sanchez tenemos el vídeo de La descarga de la Paja y la visita de los niños de la Escuela al lado de la Obra. Arnau Bujons, Michela Pes y Valentina Maini del proyecto BioBui(L)t junto a Lluís Boi de Unió de Pagesos acogen los niños ! Gracias Gracias Gracias!!!

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 24

Greb+Tapial+HempCrete

24 | 03 | 2014

final de Marzo intenso! Terminamos primera fase del Muro de Paja- Terminamos el Tapial (Con Tapialito para los más peques) y Dulcis in Fundo Inicio de Abril con ejecución del Muro de Cal y Cañamo con HempEcoSistem ; este Viernes 28 también hay encuentro de revisión proyecto!

Si queréis pasar a curiosear y/o participar seguir este enlace, elegir vuestra entrada y a disfrutar aprendiendo!!

www.eventbrite.es/o/bam-bioarquitectura-mediterrania-4264341893

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 24

¡¡Fiesta de la Primavera!! 2

24 | 03 | 2014

Estimad@s!!

aquí el montaje de fotos del momento precioso que nos ha regalado el grupo de danza Liant La Troca que ha venido al solar para mostrar/experimentar la textura y las relaciones con los materiales naturales y que nos ha permitido visualizar-tomar conciencia de la presencia de la fuerza en la fragilidad!

Gracias a Liant la Troca y todos vosotr@s que nos habéis dado la fuerza para seguir el camino de este proyecto!!

Fotos Evento 5.4 21|03|2014



1 of 341

Fotos Evento 5.6 22|03|2014



1 of 132

Fotos Evento 5.3 23|03|2014



1 of 44

Fotos Evento 5.5 24|04|2014



1 of 46

Section 3

27|03|2014

03. ¡Palla Greb!

160 Invitaciones enviadas 13 registros 20 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Marzo 24 (2 días antes del evento) **entradas de mañana y de tarde opción a elegir de comida**

Vamos a terminar la primera fase del Muro Greb!.

No es necesario tener conocimientos previos pero si es necesario:


- llegar puntual
- quedarse por el tiempo que se ha elegido entre las varias opciones
- importante confirmar registro también para los cocineros!!!

Plazas Limitadas

Tendremos comida especial preparada por Igor- Comida Mediterranea

Cocina del este bien viva y sivestre. Esta vez con un menu mezcla de fermentos varios, plantas silvestres y terrestres de invierno y todo muy especialidades de las cocinas de nuestra biss-bis-bisabuelas.

Fotos Evento 5.7 26|03|2014

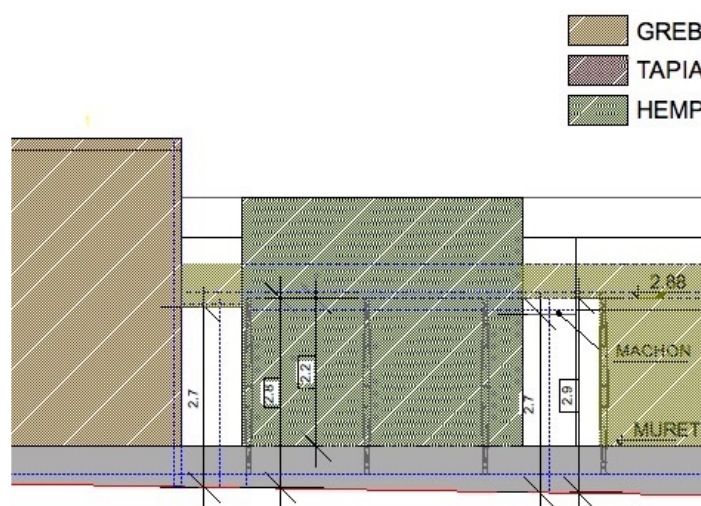

1 of 50

Precio del menu entero es 5 eurakos

CENTRO DE CULTIVOS CONTEMPORANEOS DEL BARRIO
C/Purissima Concepció 28
m: L3 Poble sec

Allí va el menu:

- una menestra de Istria(Croacia) hecha de nabos fermentados y variacion de legumbres
- piminteos rellenos(todos los paises de balkanes y Turkia) con patatas, cebolla y plantas silvestres con nata fermentada
- ensalada de rabano negro(Ser-

bia y Montenegro) con nata fermentada...

·Tufahija (especialidad Bosnia, pero en realidad una receta original de Persia):> manzanas o peras rellenas con mezcla de nuezes, pan rallado y sirope de miel

habrà tambien referescos de casa hechos de flores de salvia(recetas adriaticas)

Texto mail Aviso Convocatoria - Marzo 25 (1 día antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola a tod@s, el día de miercoles 26 ha sido anulado nos vemos el 27

Saludos,

Texto mail -web Crowdfunding - Marzo 30

03. Ejecución muro paja -Greb

30 | 03 | 2014

El muro de balas de paja con sistema Greb empezado el dia 21.3 se ha ejecutado gracias a la colaboración del equipo de CasaPasiva, Mirco Zecchetto y el pueblo de Arbucies además de muchos más!! con la aparición maravillosa de personas que han visto pasar el tractor por el

barrio que como si fueran angelitos han venido a construir y hacer seguimiento a lo largo de toda la semana!! con un día de lluvias por el medio y el tiempo de secado se ha conseguido terminar el 27!

justo antes de la reunión mensual en el casal del Pou de la figuera!



Fotos Evento 5.8 27|03|2014



1 of 16

Section 4
28|03|2014
04. Repaso Pou

160 Invitaciones enviadas 11 registros 13 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Marzo 24 (4 días antes del evento)

se pide a asistentes de definir el tipo de participación. Opción 1: Voy a estar todo el evento para ver que puedo hacer. Opción 2: Tengo propuestas para hacer!. Opción 3: Voy a estar solo un rato

Si quieres conocer las entrañas del proyecto BioBui(L)t y colaborar en la creación del mismo de forma activa este es tu evento!

Vamos a tener una reunión de repaso y organización cada último viernes del mes. Utilizaremos metodología world café (sin café ;-))

Recuerda que es importante el registro para ayudarnos en la gestión de la comunicación!

elige tu modalidad de participación y respeta lo que dices, esto nos ayuda a ser eficaces en el uso del tiempo precioso

Docs. Evento 5.1 Repaso estado del proyecto retos, oportunidades y modificaciones



1 of 14

Section 5
29|03|2014
05. ¡Tapial!

160 Invitaciones enviadas 11 registros 65 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Marzo 24 (4 días antes del evento)

se pide a asistentes de definir el tipo de participación. Opción 1: Voy pasar en algún momento Opción 2: Registro participación de mañana y/o de tarde. Opción 3: comida



Vamos a terminar el muro de Tapial! + Actividad Familiar "Tapialito" los padres podran estar haciendo tapial grande mientras sus niños estan realizando otro pequeño! de 11.a 13.30 h tapialito!

No se necesita formacion solo ganas, alegria y registro de entrada!

Es muy importante para ayudar la organización realizar el registro de entrada eleigiendo entre las opciones y respetar los horarios que se asumen.

Tenemos opción comida! el 29 Paella Vegetal el 30 Menú Vegetariana de los Balcanes ...muyyy buenos!! Para los que participen en actividad 5€. Para los que solo se apunten a comida 7€, los dos que sobran irán para apoyar el proyecto!

Plazas Limitadas!!

Texto mail recordatorio a los registrados - Marzo 28 (1 días antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

¡Hola a tod@s! Bondia!

Nos vemos mañana!! aqui tenéis los asistentes que se han registrado!

¿Que es esencial para participar?

- tener ganas de aprender e interés por el tapial/tierra

- escuchar y ser pacientes y atent@s con los demas y uno mism@

- ser puntales para participar a explicación de actividades del día

¿Que es importante para participar?

- nos hemos quedado sin guantes traer los vuestros si tenéis

¿ Cual es el objetivo concreto de este fin de semana?

- pasarlo bien

- construir un muro de tierra pisada (tapial) de 15m2 aprox

¿Cual es el objetivo ideal de este fin de semana?

- matizar y rellenar ficha de seguridad y control de calidad de ejecuón del tapial

- tomar notas de las personas que quieren seguir implicadas en el proyecto y participar en su organización de próximos eventos concretos de construcción.

Podeís ver el desarrollo del proceso desde el principio (2012) siguiendo la lista de reproducción BioBui(L)t-Txema en canal Youtube de BaM

http://www.youtube.com/watch?v=Z896DhAK-ko&feature=share&list=PLaEELru1cJorNN6pP9j_jTJC_Eeluc49Y

fins demà!! una abraçada,

valentinaxBaM-BioBui(L)t

Texto mail recordatorio a los registrados - Marzo 30

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Hola a tod@s!! bon dia!!!

Buenos días!! El día es de los que invitan a la pereza ;-) A las 10 estamos para ver que hacer...podéis confirmar si hay actividad llamando al movil (borrado el número para esta publicación) a partir de las 10.30

Salud!!

Texto mail -web Crowdfunding - Abril 01

05.Tapial

01 | 04 | 2014

Y la semana de construcción del muro de paja Greb termina con la ejecución del muro de Tierra en un fin de semana que ha resultado ser muy epico y feliz. Bajo la protección del muro de Greb y con una obra super limpia se ha ejecutado entre el 29 y el 30 2/3 del muro. Gracias a la Empresa FetdeTerra que ha aportado sus herramientas y conocimientos y alegría y familia y la ayuda y apoyo de los "tapialeros" del colectivo Terram y Miquel Escobar. Hemos inaugurado también la primera paella en obra!!

Fotos Evento 5.9 28|03|14



1 of 92

Fotos Evento 5.10 29|03|14



1 of 153

Section 6
05|04|2014

06. Tapial;Fiesta+Cañamo;Inicio!

160 Invitaciones enviadas 11 registros 82 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Abril 01 (4 días antes del evento)

se pide a asistentes de definir el tipo de participación. Opción 1: Voy pasar en algún momento Opción 2: Registro participación de mañana y/o de tarde. Opción 3: comida



Hola a tod@s!!

Este fin de semana vamos a terminar el Tapial!!! Fiesta!! y Inicio el Muro de Cal y Cañamo!!

Sabado dia importante de replanteo del muro de Cal y Cañamo y presentación del material que nos trajo Txema al proyecto! HempEcosystem!!

Haremos comprobación materiales y soluciones de ejecución. El muro se realizará a lo largo de la semana siguiente en fechas que confirmamos este sabado! y avance importante en Tapial!!

el Domingo fiesta de desencofrado y tapialito para los mas peques!! Con Macari y Maite de Fet de Terra y apoyo inestimable de Miguel Terram y presencia espacial de Laura Caballés de EcoXarxa ... el video del epico fin de semana pasado está ya listo pero esperamos un día mas

No es necesario contar con conocimientos previos solo participar con ganas de aprender e intercambiar! Si es muy importante registrarse y respetar los horarios elegidos. Como dependemos de la metereología puede ser necesario ahcer cambio de última hora. el registro nos permite comunicar facilmente!

Tenemos opción comida 5€ para los participantes 7€ para los que solo se quieren quedar a comer (los 2€ de diferencia irán en soporte al proyecto)

¡Plazas Limitadas!

Fotos Evento 5.11 04|04|2014



1 of 72

Fotos Evento 5.12 05|04|2014



1 of 52

Docs. Evento 5.2 Jornadas Arquitectura y Autoconstrucción -Movimientos Nomadas Girona

apuntes notas
presentación proyecto BioBui(L)t-Espai Txema
4.4.2014 -entrega en trello 8.4.2014

preparada por Valentina Maini
para reunión de Sari Sanz y Toni Solanas con ayuntamiento

Este documento preparado para presentación del proyecto BioBui(L)t a las Jornadas de Girona finalmente no fue presentada en aquella ocasión y fue utilizada para presentación del proyecto en Ayuntamiento de Barcelona

Section 7

10|04|2014

07. Muro Hemp Ejecución!

191 Invitaciones enviadas 04 registros 27 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Abril 07 (3 días antes del evento)

se pide a asistentes de definir el tipo de participación. Opción 1: Mañana Opción 2: Tarde. Opción 3: Pasaré un rato

Estimadissimos todos/as,

Gracias a tod@s los que han estado en estos ultimos apasionantes eventos- actividades del proyecto BioBui(L)t para Espai Txema y también gracias a los que aun sin estar presentes están mirando, controlando, dando opiniones y actuando en momentos claves!!

Este miercoles estaremos ejecutando el muro de Cal y Cañamo que BaM y HempEcosystem y Juanola & De Miguel hacen posible . Estáis todos invitados a participar.

Para participar el necesario inscribirse/ resgistrarse- respetar horarios y llegar con entrada impresa y/o entrada en el movil. También a causa de desaparición de material adquirido para activdade, los que quieran participar actvamente tendrán que llegar con guantes y calzado de seguridad y/o firmar carta de aceptación de las condiciones de seguridad y responsabilidad de la participación. Tendremos preparada la carta .

Y

La construcción del espai Txema a la largo de marzo ha tenido pasos importantes:

- se ha ejecutado el muro de paja en sistema greb:

http://youtu.be/_vYam2dadhs

- se ha ejecutado el muro de tierra/ tapial (video primera parte) :

http://youtu.be/c0CRy_ICyQ0

- se ha aclarado/ comprobado el material necesario para estructura general (integración estructura re-nacida (diseño deTous yFargas de los años 60' y despiece de estructura de madera contralaminada)

En las actividades han llegado y participado muchas personas nuevas. Este proceso que ha empezado en Julio 2013 con 13 personas en la lista de participantes tiene ahora más de 170 .

Estamos a punto de empezar otra fase ... en breve os llegará a todos una lista de auto evaluación de lo vivido hasta ahora y una "check list" siempre de autoevaluación de posibilidad/ capacidad de cada uno de seguir participando- colaborando en el proyecto para que podamos juntos evaluar las posibilidades reales de colaboración hacia el objetivo del proyecto BioBui(L)t que es construir el espacio Txema no solo fisicamente

En este último més se ha podido visualizar en forma a veces bonita (por ejemplo . evento llegada de paja) a veces en forma drámatica (accidentes en solar) los potenciales y los límites de este proyecto. La carta de auto evaluación que estamos preparando es el primer paso para visualizar este otra fase del proyecto.

El objetivo extra-ordinario que tenemos es realizar el espai Txema como muestra de que otra forma de construir es posible, en los materiales, equidad y accesibilidad para tod@s los interesados en colaborar a la construcción de bien comun.

La bioconstrucción y mostrar alternativas de materiales , es una "escusa" ,es la base...pero no es el fin de este proyecto.

El tiempo que tenemos a disposición para poner en práctica este ejemplo no es mucho y lo que hay que aprender también es mucho... esto puede generar tensiones y a la vez puede ser usado como empuje a la creatividad y al valor de cada uno. Es un proceso que necesita de limites claros y reconocimientos claros y sencillos pero a la vez flexibles, creativo, tolerantes, pacientes

.Este no es un proyecto en obra es una obra en proyecto!

A lo largo de estos meses se han integrado aportaciones y se ha multiplicado el interés y conforme la ejecución va avanzando más se amplía el impacto y la complejidad. Aumenta el potencial y la riqueza, pero también el riesgo de fracaso y/o daño grave. Por esto vamos a necesitar definir limites. Estos limites serán definidos y comprobados y evaluados a lo largo de varios encuentros.

Estamos construyendo un proyecto único! gracias a la conciencia y paciencia de tod@s y convicción de unos cuantos ;-) podremos!!!

un abrazo a tod@s, valentina x BaM

Texto mail a asistentes - Abril 08 (2 días antes del evento)



Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Estimad@s nos damos cuenta que ha habido un error de fechas en la convocatoria,

el muro de hempcrete que se realiza gracias a las aportaciones de Juano-la&DeMiguel y HempEcosystem se ejecuta esta semana

En consideración de control de calidad de los procesos podemos asumir la participación de personas ajenas al proceso de proyecto un día de los tres de trabajo previstos.

Por ello os enviamos la invitación corregida para este JUEVES día 10 los horarios son los mismos. Disculpar las molestias, gracias por vuestra atención!!! e interés!! un saludo muy cordial, valentina x BaM

Fotos Evento 5.13 Tratando recuperar ritmo después de accidente-shock en el solar



1 of 13

Fotos Evento 5.14 10/04/2014 Ejecución muro cal y cañamo



1 of 119

KeepOn Moving

Fase 4. Mayo 2014 - Julio 2014

En esta fase el proyecto experimenta con un nuevo sistema de convocatoria derivado del desconcierto provocado por el accidente vivido en fase anterior y las evidentes dificultades de seguir proceso de organización y ejecución de la obra solo con la herramienta on-line.

Los pasos y elementos significativos del proceso realizado en esta etapa son:

- Cada evento (fin de semana: ejecución) se compondrá de otros tres eventos previos para preparar y organizar (lunes-miércoles-viernes).
- Integración de propuestas de diseño de personas que se acercan al proyecto en esta fase
- Integración de colaboración con asociaciones del Barrio: Casal d'Infants - Coop Impulsem
- Integración de colaboración con asociaciones dedicadas a la formación en bioconstrucción : Escola Origen - Terram (ejecución acabados de arcilla)
- Modificación diseño de fachada y estructura de cubierta
- Inicio debates acerca de solicitud de ayuda/subvención al ayuntamiento de Barcelona

La situación del proyecto en el momento de iniciar esta fase se puede definir como resultados de los eventos y procesos acontecidos en la fase anterior. En el mes de Mayo sabemos que:

- Hay dificultad para personas en seguir el flujo de organización en plataforma On-Line Trello.
- Los criterios de participación y acceso a plataforma on-line no están claramente definidos.
- La gestión y control del almacén es esencial para la seguridad de la obra pero no disponemos de equipo fijo de personas que asuman responsabilidad de ello.
- La gestión de control de gastos y caja es esencial para seguridad del proyecto: disponemos de seguimiento eficaz de gastos realizados gracias a integración de datos gestionada por Vanessa Solano. Se empieza a tener

caja con efectivos disponibles en el solar bajo responsabilidad de V.Maini y S.Sanz.

- Tenemos disponibilidad de empresas a donar materiales aislantes para cubierta (Foamglass) , impermeabilización fachadas y cubierta inclinada (Solitex de Germans Verdaguer) y acabado muros Greb y Tapial (Livos Keim y ComCal)

Indice de decisiones elaboradas en eventos de esta fase

- Eventos y encuentros del mes de Mayo:
 - suministro estructura de escalera y debate sobre su colocación final
 - pruebas con grafitis de musgo para eventual ejecución revestimiento de fachada
 - definición de temas a ensayar en muro Greb- diseño módulos de ensayo
 - posibilidad actividades futuras de carácter internacional
- Eventos y encuentros del mes de Junio:
 - decisión mantener luz cenital en cubierta plana
 - diseño revestimiento muro de cal y cañamo. reducción de superficie de estructura metálica a montar.
 - elección solución constructiva cubierta plana ventilada
 - modificación alzado de proyecto
 - debate cerramientos fachada muro greb
- Eventos y encuentros del mes de Julio:
 - diseño de acabado de muro de tapial conjuntamente a Casal d'Infants y empresas Chroma y ComCal
 - debate opciones soluciones de materiales para pavimentación interior
 - re-diseño mural de muro cal y cañamo en consecuencia de relación con criterios de respeto de los murales de los grafiteros
 - presentación de solicitud de subvención al ayuntamiento
 - se descarta definitivamente idea inicial de revestimiento de cubierta de caña con morteros de cal y cañamo

Section 1
10|05|2014
08. ¡A por ello!

193 Invitaciones enviadas 18 registros 19 asistentes acreditados
Texto mail Convocatoria - Mayo 6 (4 días antes del evento)
posibilidad de apuntarse por la mañana o por la tarde o solo para pasar un rato

Hola a tod@s!

Hace rato que no hay comunicación!! Ya tenemos los muros ejecutados!! una maravilla y Estamos en fase importante de re-organización!!! El proyecto BioBui(L)t! es una experiencia y un camino de aprendizaje con tiempos lentos y variables por cada uno y es también un proyecto de construcción de una sala con materiales compostables con tiempos cortos y fijados por el Pla de Buit en un espacio público riquísimo de vida y contradicciones y de gran visibilidad/exposición/potencial.

En septiembre hay compromiso de concurso Pla de Buit de inauguración del espacio y entre Septiembre y Noviembre el Ayuntamiento y BaM harán una revisión del contrato que implica un test para seguir o revocar el permiso de uso.

La fuerza de este proyecto está en su capacidad de adaptarse, y seguir dando soluciones de diseño, conocimientos técnicos, experiencias personales, recursos materiales y sobre todo adaptar tiempos al tiempo en común.

La complejidad y riqueza y belleza de este proyecto y su tiempo breve lo hace muy especial y único como somos únicos, especiales ricos y bellos y con poco tiempo tod@s nosotr@s.

De aquí a Septiembre vamos a trabajar con: madera contralaminada, materiales reutilizados- cal- argila- canya- estructuras de acero increíbles .

Vamos a aprender a ejecutar y vamos a diseñar elementos de cubierta verde y carpintería.

Este sábado de 10 a 19 h estaremos en el solar! es un momento importante de organización los que no puedan estar el sábado podrán apuntarse e integrarse en un documento excel que será enviado el domingo! Nos vemos allí!

Fotos Evento 6.1 17|04|2014



Suministro escala y protección muro de cal-cañamo

1 of 12

Fotos Evento 6.3 28|04|2014



Comprobación punto puesta a tierra

• • • • •


Fotos Evento 6.2 25|04|2014



Visiones para murales y grafitis de musgo

• • • • •

Fotos Evento 6.4 10|05|2014

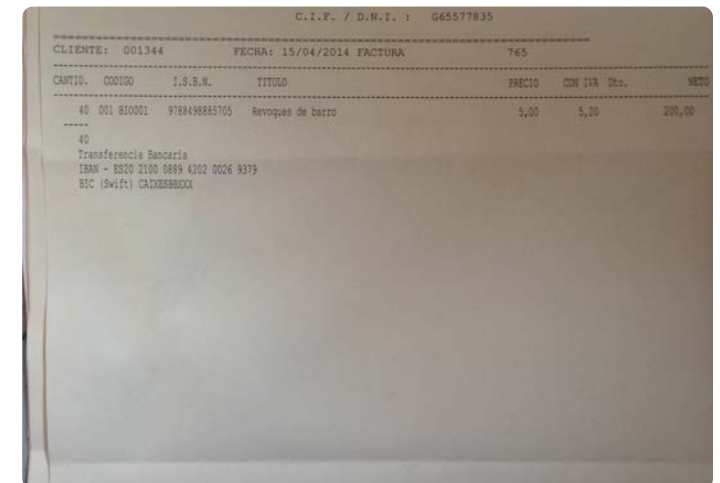

Gestiones previas para montaje estructura y ejecución instalaciones eléctricas

1 of 14

Section 2
15|05|2014
Visita EU-Leonardo

Fotos Evento 6.5 El grupo Leonardo UE en BioBui(L)t.
Donación de Diatonite -R. Bañon-Diasen



1 of 17

Invitación en plataforma Trello y publicado en web eventbrite 18 registros 9 asistentes acreditados

Texto Convocatoria - Mayo 6 (4 días antes del evento)

Mañana nos visitan los expertos de construcción en paja europeos participantes a **Programa Leonardo Partnership** y podremos observar de cerca el mortero aislante **Diatonite** y los revestimientos de arcilla de **Ecoclay**. La visita será en inglés. quién no se registre en eventbrite no podrá acceder al solar. Nos vemos!

El inicio es previsto a las 16. puede ser que el grupo Leonardo se retrase un poco pero los que no sean parte del grupo y/o integrantes del trello no podrán entrar en el solar una vez empezada la actividad aunque tengan registro eventbrite realizado.

Fotos Evento 6.6 UE Leonardo in Barcelona



Taller Greb en UPC-GICITED con soporte Okambuva coop y Impulsem coop. Revoque del muro Greb en BioBui(L)t con Diatonite donada por Diasen y ejecución realizada gracias a la colaboración de R.Bañon y Unai Marti.

1 of 97

Section 3
24|05|2014
09.Mission Estructura

198 Invitaciones enviadas 11 registros 20 asistentes acreditados


Texto mail Convocatoria - Mayo 18 (3 días antes del evento)

se pide a asistentes elegir los días en los cuales quiere participar

¡Han llegado las plantas a BioBui(L)t-Txema!! A regar el espacio y el proyecto!! El tiempo es la esencia!

Esta semana tenemos el reto de conseguir montar una estructura - re-nacida y recuperada del olvido que es un ejemplo de optimización de uso de materiales y diseño apto para se de-construido y re-utilizado que sabemos son aspectos esenciales en la arquitectura y construcción sostenible!

Fotos Evento 6.7 Preparando

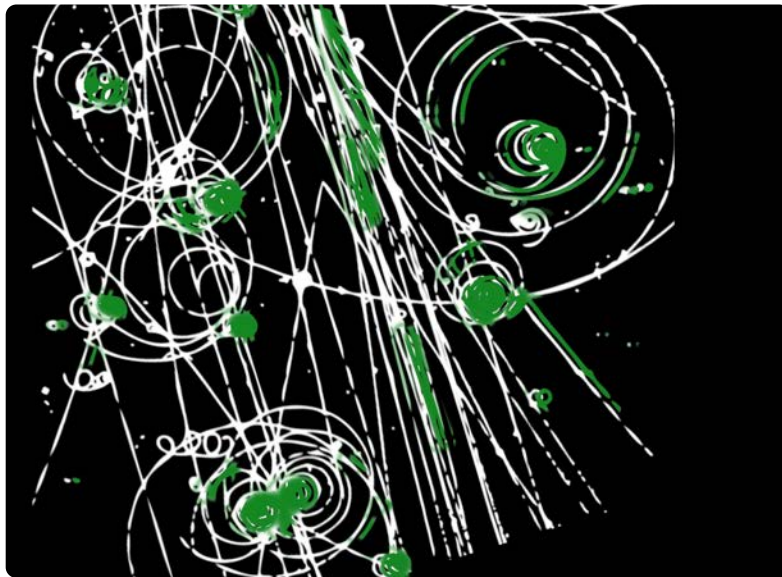

Propuesta de mural para pared Greb de A.Tangerine. Limpieza de almacén y trabajos previos al evento

1 of 14

Nos vemos este **lunes** de 8. 30 a 10 de la mañana para comentar/conocer lo que hay.

El **miercoles** siempre de 8.30 a 10 estaremos revisando las "compras y/o recursos disponibles/pendientes para montar" el **viernes** de 18 a 20 estaremos revisando que todo esté listo para el montaje,

y el **sabado** si todo va bien y si estáisestaríamos montando los pilares bien fijados al suelo para que nadie se

Fotos Evento 6.8 Arreglando el Almacén



1 of 13

Fotos Evento 6.9 Inicio Montaje de la estructura



1 of 26

Section 4

31|05|2014

09.1 Mission Estructura

201 Invitaciones enviadas 16 registros 28 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Mayo 26 (5 día antes del evento)

se pide a asistentes elegir los días en los cuales quiere participar. 28 y 30 son encuentros en el solar de preparación de 2h horas de duración. Miércoles 28 por la mañana de 8 a 10, Viernes 30 de 18 a 20h

¡Hemos empezado el montaje de la estructura diseñada por E.Tous en los 60!! Estamos en fase super importante: darnos un techo ;-) Gracias a tod@s!! Es increíble

ble las energías que este proyecto recibe. Han pasado ya muchos meses y los muros nos piden un techo ya ;-) !!

El fin de semana pasado hemos superado la barrera de "nivel" de bases de apoyo!! y hemos aprendido a usar el nivel de agua ;-) !! este fin de semana sería super genial montar 4 porticos con su chapa!!

Para ello este **miércoles** nos vemos para repasar la compra y avanzar con pedido estructura de madera contralaminada. El **viernes** trataremos de fijar al suelo el trabajo ya realizado y preparar para el día estelar del **Sábado** montaje vigas y chapa y fijar el primer tramo!

Podéis elegir vuestro día/horario aquí abajo!

¡Nos falta plomo!!

Haciendo



Montaje Estructura Tous

Fotos Evento 6.10 28|05|2014




• • • • •

Fotos Evento 6.11 30|05|2014



Fotos Evento 6.12 31|05|2014

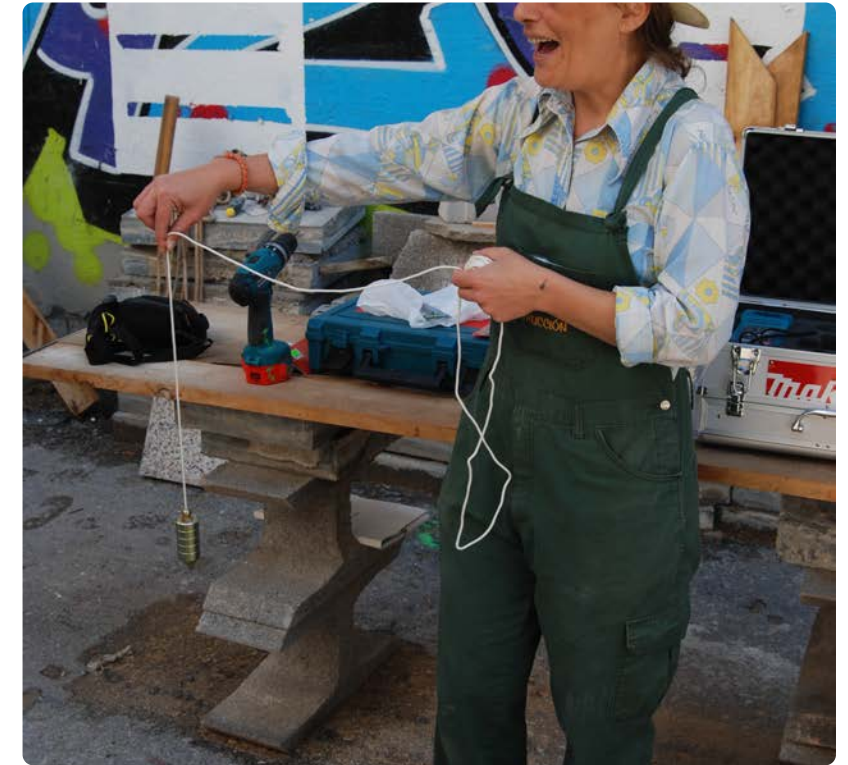

1 of 77

Section 5
07|06|2014
09.2 Mission Estructura

207 Invitaciones enviadas 17 registros 28 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Junio 03 (4 días antes del evento)



se pide a asistentes elegir los días en los cuales quiere participar. 28 y 30 son encuentros en el solar de preparación de 2h horas de duración. Miércoles 28 por la mañana de 8 a 10, Viernes 30 de 18 a 20h

El Sabado pasado conseguimos realizar un paso importante! montaje del modulo alfa de estructura re-nacida re-utilizada diseño de los 60! Un momento memorable!!

El **proximo sabado** queremos mostrar el modulo beta y..... realizar capa de acabado exterior del muro de paja por ello

contaremos con la inestimable ayuda de **Unai Martin** Autoconstructor!

Para preparar los eventos del **sabado** nos vemos este **miercoles** por la mañana a las 9 delante del **colectiu ronda** c/trafalgar 50 y el **viernes** por la tarde en el solar de 18 a 20. Elige el día o los días que quieres estar!! hasta pronto!!

Texto mail a los asistentes - Junio 06 (1 día antes del evento)

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

aquí tenéis el video del montaje del primer pórtico el sábado pasado nos vemos pronto!!

<http://youtu.be/rC6v6faVGfE>

Texto mail -web Crowdfunding - Junio 09

Avances y Videos pendientes

09 | 06 | 2014

Estimad@s co-financiadores ! Hace tiempo que no hay comunicación! ha habido un parón en la comunicación a causa de un accidente ocurrido el pasado 5 de abril en evento 06....que ha roto la nariz de valentina maini ..y a dado un gran susto a muchos....un accidente no relacionado con la obra pero que hemos vividos juntos en el solar...

.. un momento simbolicamente importante que otra vez ha dado visibilidad a la fragilidad y a la vez la fuerza de cada uno de nosotr@s y de este proyecto. Hemos avanzado mucho y estamos aprendiendo aún más.

Todo es posible gracias a vuestro apoyo y presencia de mas de 200 personas ya que han ido aportando su energía -tiempo y conocimiento en una fase u otra del proyecto.

Recordamos a tod@s que tenemos encuentros fijos en el solar los lunes y miercoles de 9 a 10.30 de la mañana, el viernes de 18 a 20 y el sabado todo el dia...

los libros ya se pueden recoger en el solar... las camisetas y el proyecto están en marcha..

en la lista de reproducción del canal youtube de BaM podéis ver las novedades publicadas ahora de:

- 07. ejecución Muro cal y cañamo
- 09. montaje estructura recuperada de los años 60
- 10 primera semana de junio seguimos con estructura y inicio acabado exterior muros

a breve llegaran los videos de :

- 06. Final ejecución de Tapial
- 08. Encuentro europeo grupo Leonardo

esperamos que os gusten y vernos pronto en el solar.

abajo el link a la lista de reproducción con toooooooodooooos los videos ;-)

www.youtube.com/playlist

Fotos Evento 6.13 Preparación 02|06



1 of 23

Fotos Evento 6.14 Evento 07|06



1 of 93

Section 6

14|06|2014

10.Siguiendo Los Muros

207 Invitaciones enviadas 17 registros 16 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Junio 09 (5 días antes del evento)



se pide a asistentes elegir los días en los cuales quiere participar. **Miércoles 11** por la mañana de 8 a 10, **Vier- nes 13** de 18 a 20h, **Sabado de 10 a 20h**

¡¡¡BioBui(L)t-Txema sigue casi imparabile ;-) Gracias a tod@s!!!!

Este Lunes empezado el mural!!

Este **miércoles** a las 9 nos vemos en collectiu Ronda para cargar mas material para acabados y hacia las 10.30 estaremos en el solar descargando y haciendo lista de la compra.

El **viernes** prepararemos el trabajo del sabado : preparar paredes para acabados y fijar Tous.

El **sabado** día de actividad : soldadura - paneles de arcilla y posiblemente acabado de cal y ¡celebraremos el mural de @Angeline!!

¡Elige tu día!

recordar que en el canal youtube de BaM podéis ir viendo los videos (que andan un poco atrasados pero vamos recuperando).... la web de BaM en cambio está sufriendo una incidencia que esperamos solucionar pronto!

aquí el video del monatje primer portico de E.Tous: <http://youtu.be/rC6v6faVGfE>

y el link de la lista

http://www.youtube.com/watch?v=rC6v6faVGfE&feature=share&list=PLaEELru1cJorNN6pP9j_jTJC_Eeluc49Y&index=38a

Texto mail -web Crowdfunding - Junio 15

Siguiendo los muros!

15 | 06 | 2014

La semana pasada vimos terminar el mural con silicato de **Angeline** nos emocionamos con propuesta mural Hemp de **Nuria**, seguimos consolidando la estructura recuperad de **E.Tous** gracias a imparabile **Cristian**! la próxima semana decisiva para las cubiertas!! hay varios días de encuentro si queréis estar-seguir-colaborar! para registrarse seguir este link! bioarquitecturamediterranea.eventbrite.es

Gracias!!! Seguimos!!

Fotos Evento 6.15 Preparación 09-10-11-12-13 Junio



1 of 30

Fotos Evento 6.16 14|06|2014 Evento: Colocación de Paneles de Arcilla y continuación montaje de estructura




Section 7
21|06|2014

11. Misión Cubierta y Cañamo

210 Invitaciones enviadas 38 registros 43 asistentes acreditados

Texto mail
Convocatoria - Junio
15 (6 días
antes del
evento)

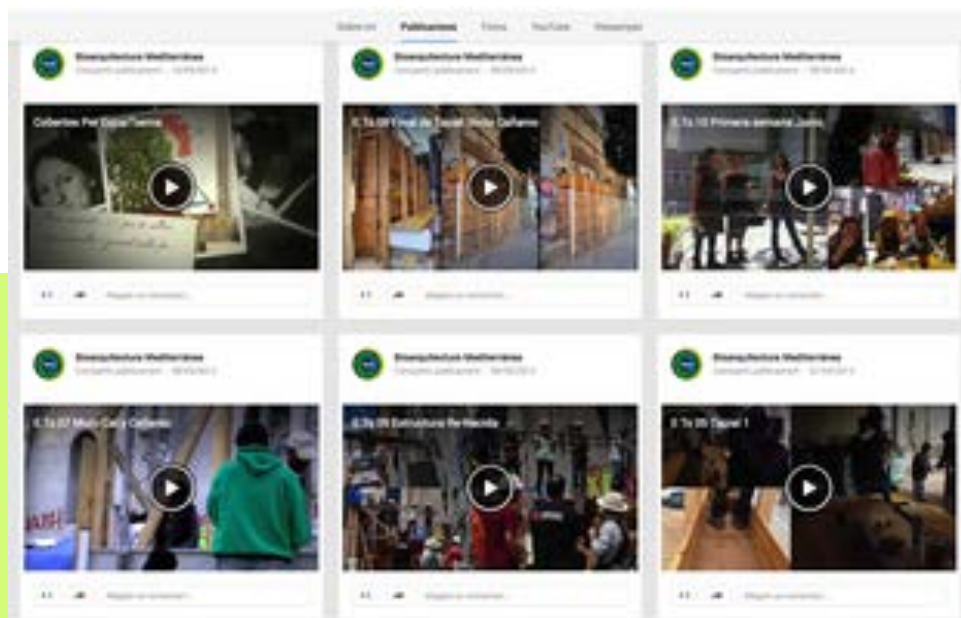

Increíbles murales y encunetros en BioBui(L)t-Txema!

http://youtu.be/PGt_wuEEzEY

Objetivo de la semana: Terminar Muro de Hemp, Preparar Montaje estructura de Madera!!

Lunes: replanteo proyecto de 9 a 11 encuentro con **Casal d'Infants y ComCal!**

Martes: ejecución acabado interior Greb con **escuela Origenes**

Miercoles y Viernes de 18 a 20 preparación de muros y preparación espacio para llegada de paneles de madera contralaminada

Sabado todo el día: Ejecución acabado Muro de Hemp, trasplante plantas! Repaso proyecto!!

Elige tu día para seguir el proyecto, colaborar, proponer!

Texto mail -web Crowdfunding - Junio 22

Semana Intensa. Argila-Cal-Verde-Estructura!!

22 | 06 | 2014

Aqui video de los 5 intensos-bellos días pasados en el BioBui(L)t-Txmea

Una semana riquissima de acción y reflexión. Preparada la base para acabado muro interior de Paja. Ideado y Realizado acabado exterior de muro de Cal y Cañamo (Un Malevic .-) organico).

Practicamente completado el montaje de estructura re-nacida de los 60. Y los Pittospourm ya tienen maceta!!

La próxima semana apuntar en vuestras agendas el 26-27 momento "oohhh"!! Llegar y se monta estructura de madera contralaminada!! Yuhuuuu... vamos a tener techo este verano!!

Fotos Evento 6.17 Preparación 16-17-20 Junio



1 of 58

Fotos Evento 6.18 Evento 21 Junio



1 of 154

Section 8
27|06|2014
12. ¡Verano Cubierto!

212 Invitaciones enviadas 7 registros 18 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Junio 22 (5 días antes del evento)



A por el verano!! Con cubierta en BioBui(L)t-Txema!!
aquí el video de la semana pasada donde conseguimos preparar la base acabado de muro de argila- se ha replanteado y preparado el exterior del muro de cal y cañamo y preparada la estructura!

<http://youtu.be/BcaNQn1uyuY>

El 8 de Marzo en el Pou nos pusimos como objetivo cubrir para San Joan! y "solo" teníamos murete de Ytong y Arco de prueba de Canya. Lo estamos consiguiendo! con creatividad, flexibilidad, capacidad y belleza de tod@s las personas que han pasado por el solar!

Este 26-27 momento "oohhh" montaje de estructura de madera contralaminada. El Lunes replanteo y preparación!. ¡Elegir vuestro día para venir a celebrar-apoyar!

Texto mail -web Crowdfunding - Junio 28

Limpieza! Descarga Madera! y Raíces!!

28 | 06 | 2014

La semana pasada en BioBui(L)t-Txema! Limpiando y preparando el montaje de la estructura contralaminada para la cubierta!. El montaje es previsto para este Lunes 30 y Martes 1! Aquí tenéis el video de los momentos vividos entre el pasado lunes y este viernes en que hemos colocado la preciosa encina de Nuria Armengol en el Muro de Cal y Cañamo. Un homenaje a las raíces de la vida que muestran toda su fuerza y belleza preciamiente cuando se quedan expuestas y frágiles como en la obra de Nuria.



Fotos Evento 6.19 Preparación 23-25-26 Junio



1 of 36

Fotos Evento 6.20 Evento 27 Junio



1 of 88

Section 9
30|06|2014

12. (a) ¡Verano Cubierto!

220 Invitaciones enviadas 4 registros 5 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Junio 28 (2 días antes del evento). Evento previsto de dos días de duración se alarga hasta el 02|07|2014



El 26 y 27 se realizó la descarga de materiales y montamos la magnífica Encina de **Nuria** en el muro de cal y cañamo!

este **Lunes 30** y **Martes 1** vamos a por colocación paneles de madera contralaminada con ayuda/colaboración de **Nix Profusta** y gracias a materiales donados por **KLH!** una ocasión única para participar y disfrutar de obra!

aquí el video de la semana pasada! otra semana increíble!

<http://youtu.be/Ed7Q2DUUSdM>

Texto mail -web Crowdfunding - Junio 29

Encuentro Europeo en BioBui(L)t-Txema!!

29 | 06 | 2014

El pasado 15 de Mayo hemos vivido la alegría de compartir el proyecto BioBui(L)t-Txema con los expertos de construcción en paja del proyecto Europeo Leonardo Partnership STEP (Strawbale Training for European Professionals). La visita al proyecto se ha realizado después de un micro workshop con técnica Greb en la UPC de Barcelona, gracias al apoyo de Montserrat Bosch y Oriol Roselló del Laboratorio de materiales.

Entre los colaboradores del proyecto BioBui(L)t-Txema y los representantes de las redes europeas de Austria, Alemania, Francia, Holanda, Slovakia, Ungeria, Portugal y España hemos podido observar la ejecución del revestimiento exterior del muro de paja con mortero aislante a base de arcillas diatomeas y corcho que nos ha donado Ramon Bruñon y Diasen.

Un momento de felicidad e intensidad técnica e humana!

Este próximo Lunes 30.6 se empieza el trabajo de estudio y monitorización del muro greb! Gracias a tod@s!!

Texto mail -web Crowdfunding - Julio 03

Ayer Se Cubrió espacio!!

03 | 07 | 2014

Querid@s! Ayer justo un año después del inicio de proceso de re-diseño colectivo del proyecto se cerró la cubierta!!

Estamos con muchas ganas de postear ya las fotos/video de momento mágico de ayer... pero es verdad que es más bonito compartir los momentos previos.. los primeros dos días de montaje que han coincidido con primer encuentro de colaboración con el **Casal dels Infants del Raval!**

Y ...¡Tenemos las **Camisetas** en marcha!! Mañana vamos a postear la invitación a celebrar Juntos! y con el Barrio del Raval que está de fiesta mayor y que vendrá a visitar el solar el próximo 13.7!

Gracias a tod@s! Sin vosotr@s esto nunca habría sido posible!

Fotos Evento 6.21 23|06 - Limpieza



1 of 22

Fotos Evento 6.22 01|07 - Primer dia
Montaje- Casal d'infants




1 of 260

Fotos Evento 6.23 02|07 - Segundo
dia Montaje



1 of 72

Fotos Evento 6.24 03|07|2014 3er día
de montaje

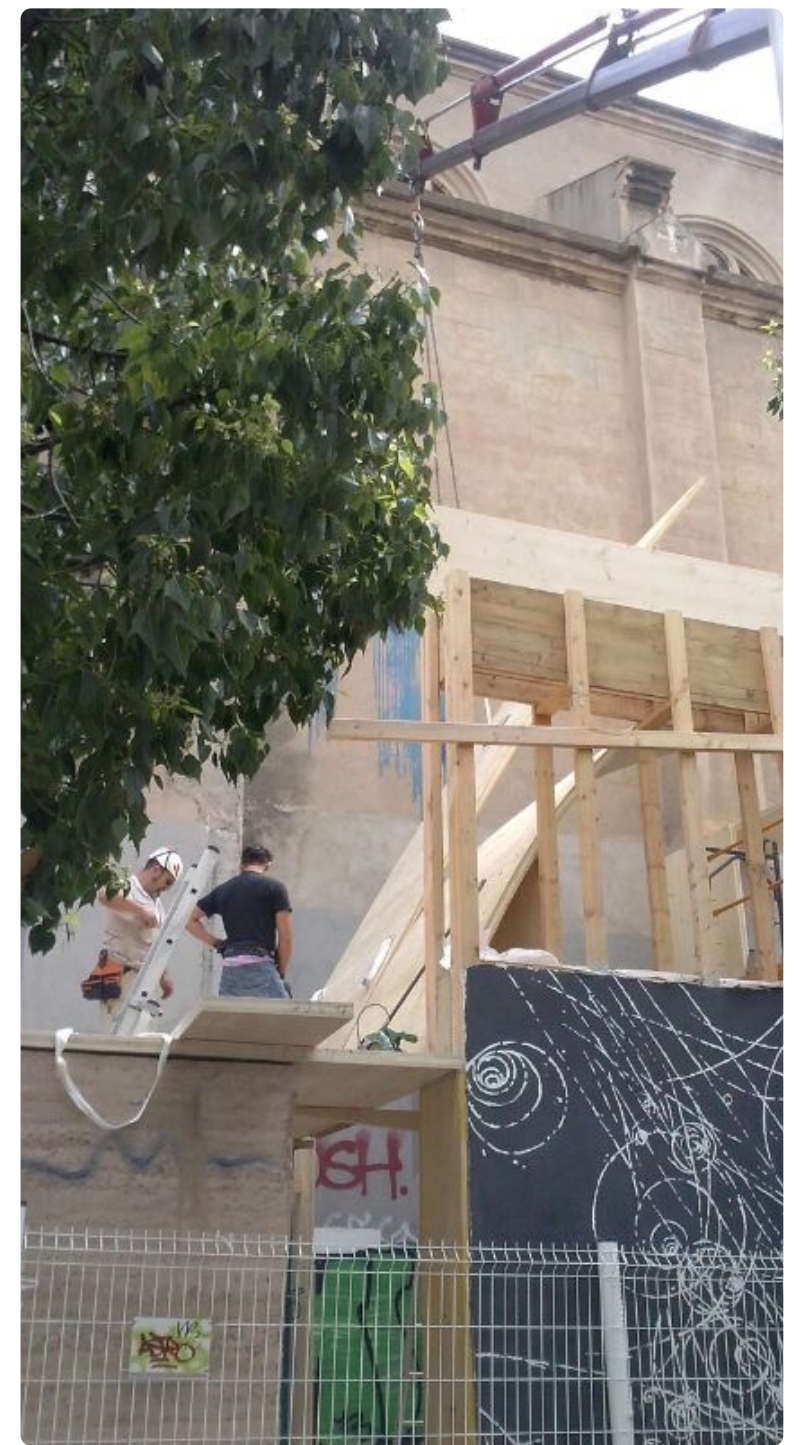

1 of 50

Section 10

04|07|2014

Encuentro Permacultura Barcelona

216 Invitaciones enviadas 0 registros 0 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Julio 03 (1 días antes del evento). Opción entrada:

a) soy parte de Permacultura Barcelona b) no soy parte de Permacultura Barcelona



Los viernes son los días de visualización de eventos en calendario.

Y la semana que viene tenemos evento importante: Encuentro/visita con el barrio

Y también:

Permacultura Barcelona ha propuesto ocuparse de la realización del inodoro en seco previsto en el proyecto. Mañana Viernes de 18 a 20 nos encontramos para valorar el calendario y las posibilidades...además de regar las plantas!!

Ayer 2.7 justo cuando se ha cumplido un año del inicio del proceso de re-diseño colectivo se ha conseguido cubrir!!! aquí tenéis el video de los dos días de preparación e inicio montaje. Tenemos ganas de compartir las fotos de la cubierta ya terminada pero también es muy bonito compartir la emoción del cierre de aguas compartiendo los momentos previos! aquí tenéis! ha sido imposible bajar de los 14 min...;-)

<http://youtu.be/2xdW6EAsdIE>

Texto mail Convocatoria - Julio 04 (3 días antes del evento).



La semana pasada empezamos una colaboración con el Casal dels Infants del Raval.

Con ellos y con la realizaremos el proyecto de diseño del esgrafiado de Cal para revestir la cara exterior del muro de Tapial que se ejecutará con la preciosísima colaboración de ComCal.

La actividad es destinada a los niños/adolescentes del casal pero publicamos aquí por si estáis interesados también en asistir como espectadores (no se admiten fotos de los niños)..

Texto mail -web Crowdfunding - Julio 04

El día que conseguimos cerrar!

04 | 07 | 2014

Estimad@s, aquí el video del tercer día de montaje que esperamos os permita disfrutar también de la belleza del proceso y la emoción de los momentos vividos!

Es una estructura que reduce al máximo la sección y la cantidad de materiales, un sistema prefabricado que no deja residuos de obra.

Una solución eficaz que ha sido posible gracias a la aportación de la empresa productora y la confianza de su responsable comercial para España, los técnicos especializados en montaje y los técnicos con experiencias de diseño.

Una solución que nos permite integrar en el proyecto la capacidad de "autoconstrucción" también de los profesionales que se abren y acogen los retos de esta obra, que supone un aprendizaje para tod@s los implicados.

esperamos que el video os guste y os invitamos a visitar el espacio este próximo domingo 13 de 12 a 14 en ocasión de las fiestas del barrio del Raval.. una bonita ocasión de celebrar juntos!!

Gracias a tod@s! sin vosotros nada de esto hubiese sido posible, no nos cansaremos de repetirlo!

Fotos Evento 6.25 Estado proyecto 03|07



1 of 12

Section 11
07|07|2014
Encuentro Arquitecturas Colectivas

0 Invitaciones enviadas 0 registros 2 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Julio 04 (3 días antes del evento). Opción entrada:
a) soy parte de Permacultura Barcelona b) no soy parte de Permacultura Bar-
celoana



Este Lunes habrá felicidad en el solar!!

Llegan: el aislamiento para cubierta plana y pane-
les de arcilla y tenemos el placer de recibir a **Arqui-
tecturas Colectivas** y Grupo de Estudiantes de
arquitectura de mali.

Recordar que si no hay registro a la actividad no
hay forma de que podamos organizar un poco la
misma en función del numero de participantes. El
solar es pequeño ;-)

Fotos Evento 6.26



1 of 59

Section 12
10|07|2014
13. Mission Caña

216 Invitaciones enviadas 3 registros 4 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Julio 08 (3 días antes del evento). Opción entrada:
Martes 08 por la tarde, Miercoles 09, Jueves 10, Viernes 11 por la mañana y por la tarde



Finalmente ahora que tenemos el soporte de madera es posible completar la boveda de canya esnayada este Invierno. aqui el video del ultimo día de monatje de la madera!

<http://youtu.be/iqNOW88Y3VI>

El equipo de Investigacio Canyera estara al frente de la ejecucion de la boveda y estaremos todos encantados de apoyar la obra y terminar la boveda para la fiesta del barrio del Domingo! Recordar que registrarse nos ayuda mucho a la organización y permitirá registrar vuestra participación en el proyecto apra futura dcumentación!

Fotos Evento 6.27




Section 13

11|07|2014

¡Vamos a poner guapo el espacio!

0 Invitaciones enviadas 3 registros 4 asistentes acreditados

Texto Convocatoria - Julio 08 (3 días antes del evento).

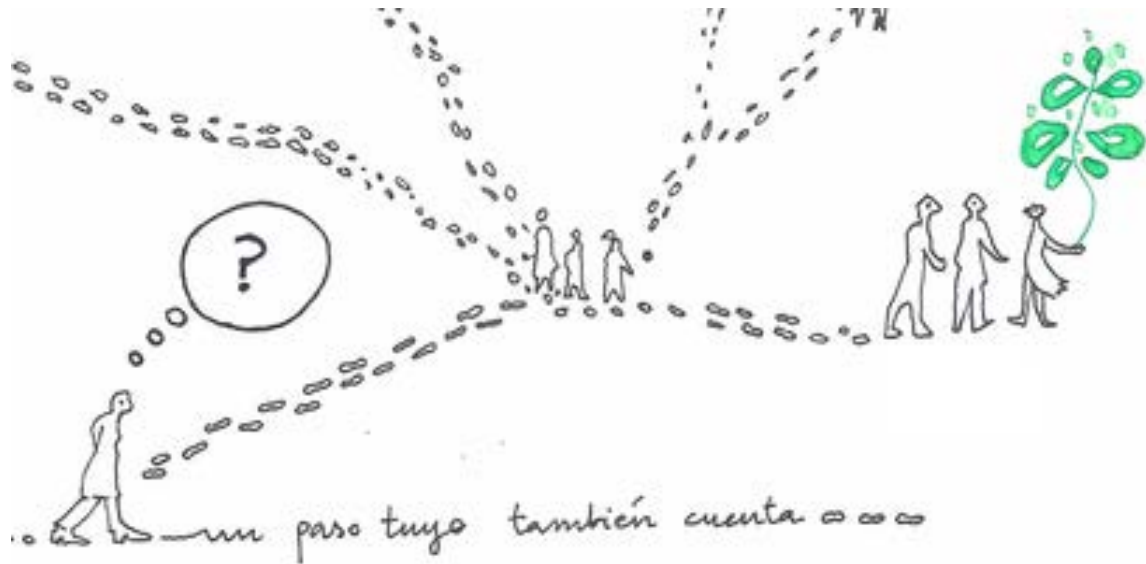


Evento Viernes de 18.00 a 21.00h Opción entrada: ayuda en espacio- ayuda on-line

Vamos a hacer todo lo posible para que para el domingo 13, día de visita del barrio, el espacio quede tan guap@ y emocionante como la mayoría de los momentos vividos en el último año!

Tenemos mucho material para exponer, carteles para colgar etc.. una ocasión para repasar y celebrar lo vivido hasta ahora y una ocasión para acercarse al proyecto y empezar a colaborar!

Recordar que el registro nos ayuda muchísimo a organizar! un abrazo a tod@s, hasta pronto.

Fotos Evento 6.28 Montaje de la boveda de caña

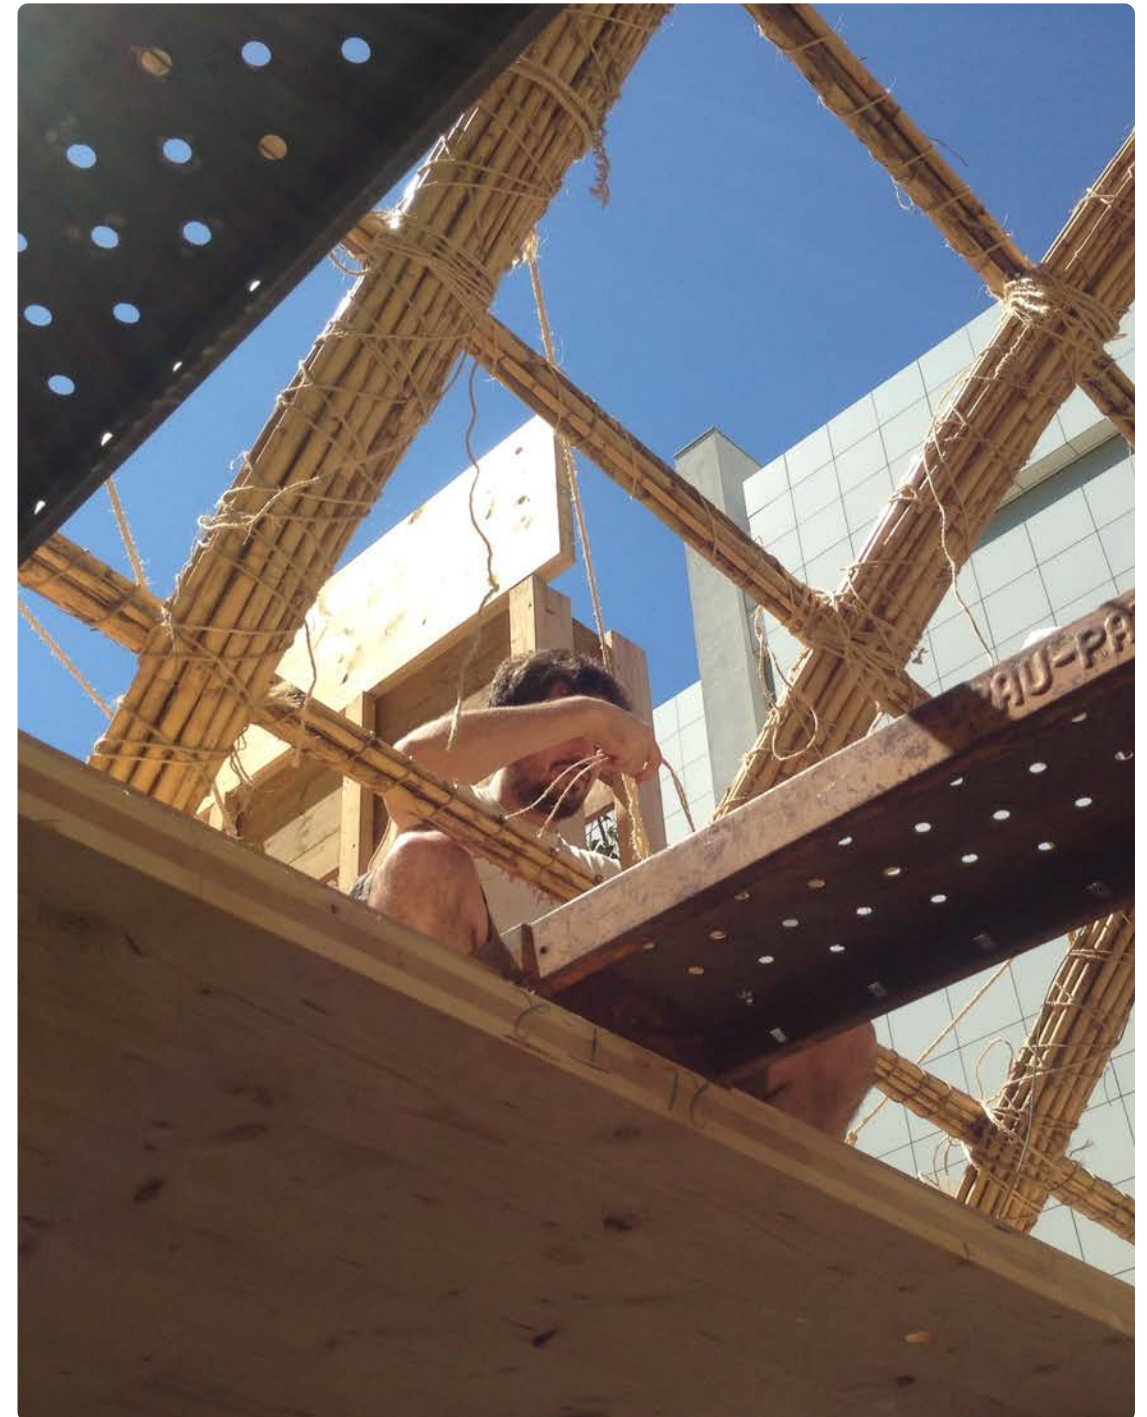

1 of 49

Section 14

13|07|2014

Visita al proyecto ¡Fiestas del Barrio!

0 Invitaciones enviadas 3 registros 4 asistentes acreditados

Texto Convocatoria - Julio 08 (3 días antes del evento).

Evento Viernes de 18.00 a 21.00h Opción entrada: ayudo en espacio- ayudo on-line

¡Un paso tuyo tambien cuenta! con esta frase que nos ha regalado @ClaraDiego queremos celebrar entre tod@s lo que se ha conseguido en un año de trabajo y invitar, abrir, acoger los vecin@s que se acerquen el próximo domingo al solar que está en el programa de actividades de la fiesta del barrio del Raval.

Y... tenemos muchas sopresas!! mas info en los proximos días para quien se registre. El registro nos ayuda mucho a organizar!!

Gracias a tod@s!! esperamos vernos y celebrar!!

Texto mail -web Crowdfunding - Julio 14

¡Semana Inolvidable!

14 | 07 | 2014

Estimad@s ! Esta semana pasada ha sido muy intensa y bonita.

Encuentros entre BioBui(L)t-Txema y Arquitecturas Colectivas en espai Germantes con debate sobre el pla de buit y Taller de Sistema Solar (mapeado de todos los proyectos del pla).

La colaboración emocionante de **Carmen** que nos ha preprado todos los QR y ha creado unas letras inspiradas en Espai Txema. Y la activación de los niños del Casal dels Infants del Raval que están preparando el esgrafiat. para el muro de tierra.

El inicio y final de montaje de la boveda de canya con Investigació Canyera en 4 días intensos de trabajo de muchos. La visita de **Ecoclay** y la preparación del espacio para el día de fiestas del barrio.

El domingo la fiesta ha culminado con las visitas muy especiales de Enric Tous diseñador de la estructura de los 60 que se ha recuperado y la actuación de la asociación Xamfrà que nos ha emocionado a much@s

Y..TENEMOS LAS CAMISETAS!!!!

podéis pasar a recogerlas por el espacio en calle montalegre 4 los viernes de Julio de 18 a 20!

esperamos que el pequeño monatje os guste!

Gracias a tod@s! sin vosotros nada de esto hubiese sido posible, no nos cansaremos de repetirlo!

Fotos Evento 6.29 Fiestas en el Barrio



1 of 99

Section 15

18|07|2014

Misión calendario Post Resaca!

194 Invitaciones enviadas 8 registros 8 asistentes acreditados

Texto Convocatoria - Julio 16 (2 días antes del evento).

Evento Viernes de 18.00 a 20.30h



Querid@s!! La semana pasada ha sido muy bonita e intensa!! Gracias a tod@s!!

aquí video resumen:
http://youtu.be/_hOPKmtzqgo

Felicidades a tod@s!! estamos sorprendiendo y sorprendiendonos!

Hemos terminado una etapa y nos acercamos hacia nueva estación. Para Septiembre Octubre hay momento evaluación con **Ayuntamiento** y entre Nostr@s.

Los muros necesitan ser protegidos y

Tenemos materiales para realizar la cubierta plana.

El 22.7 vendrá **ComCal** para ejecutar junto a los niños del **CasaldelsInfants** del Raval y hay que ir preparando el material previo.

Este viernes trataremos de visualizar un calendario con plazos de programación más amplios. Si estás por Barcelona este Julio- Agosto -Septiembre, quieres aprender construyendo y participar en la definición del calendario, esta es tu cita ;-)

Esperamos que os guste el video!

un abrazo a tod@s

Fotos Evento 6.30 18|07|2014



1 of 19

Fotos Evento 6.31 18|07|2014- Fet de Terra



1 of 12

Fotos Evento 6.32 El Taller con Casal d'Infants - Ejecución de esgrafiado de cal



1 of 265

Section 16
25|07|2014

Misión Cuidado Protección Limpieza

217 Invitaciones enviadas 5 registros 8 asistentes acreditados

Texto Convocatoria - Julio 24 (1 días antes del evento).

Evento Viernes de 18.00 a 20.30h

Hola!! esta pasado martes se ha realizado el esgrafiado en muro tapial con colaboración de Casal dels Infants y Com Cal .. aqui el video del proceso

<http://youtu.be/E68t1246pUk>

Este viernes vamos a trabajar entre tod@s la ejecución del mural para el muro de Cal y Cañamo y repasaremos los avances. Vamos a jugar con el magnífico arbol de Nuria. despedir la semana con una cervecita ;-)

Ven con tijeras y/o cervecita ;-)

de 18 a 19 creación montaje arbol de 19 a 20 repaso y visión próximas actividades.

Recordamos que registrarse nos ayuda a organizar!

Parking Day

Texto Convocatoria - Julio 24 (30 días antes del evento). Evento Periódico: 3

Opciones de entrada. 1. Participación a los tres encuentros de preparación.

2. Participación al montaje 3. Voy a ir el día del evento

Encuentro previos de preparación y montaje para colaboración BaM-BioBui(L)t amb Parking Day

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 170 ciutats de tot el món, on diverses entitats ambientals, artístiques, socials, i la ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d'aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d'espai públic, amb l'objectiu de donar a conèixer la necessitat d'un model de ciutat:

Texto mail -web Crowdfunding - Julio 27

¡Sueño esgrafiado ya está aquí!

27 | 07 | 2014

Estimad@s ..el verano pasado en fase de re-diseño surgió el sueño de realizar un esgrafiado "actual", utilizar esta técnica tradicional de aplicación de la cal con un diseño actual. Por mucho tiempo pareció que el sueño iba a quedar como tal ...solo un sueño. Hasta el viernes pasado 22.7 .

Hemos realizado esgrafiado de protección del muro de Tapial con una "tag cloud" - nube de etiquetas de palabras que los niños del casal dels infants del Raval han "sacado" de sus visitas al espacio. Cristina, David y Miquel de Com Cal y Chroma nos han apoyado con su profesionalidad y materiales. Ha sido momento muy especial y bonito escribir entre todos en la pared!

Ha sido muy especial vivir el proceso a contrareloj de ejecución antes de que la cal se secase, y cuando nos han empezado a faltar fuerzas y hemos tenido miedo de no conseguir terminar, han aparecido muchas manos-personas que se han sumado, una emoción muy grande!

Aquí tenéis el video de la jornada. A lo largo de agosto seguiremos con actividades .. trataremos de proteger la cubierta y preparar la ejecución más intensa para septiembre.

Os recordamos que si queréis participar activamente aquí está la lista de correo para recibir citas <http://eepurl.com/ilzlv>

Fotos Evento 6.33 Lorem Ipsum dolor amet, consectetur



1 of 96

Closing

Fase 5. Agosto 2014 Noviembre 2014

En esta fase el proyecto llega a su conclusión. Se termina la fase prevista en propuesta del concurso Pla de Buit. El ayuntamiento tiene que confirmar o menos la cesión del solar a la entidad ganadora. Se realizan evaluaciones entre los participantes, evaluación entre miembros de la asociación BaM y se responde a demanda de evaluación presentada por el ayuntamiento. A lo largo de esta fase madurará el cambio de la junta de la asociación BaM y la posterior dimisión de su presidente.

Los pasos y elementos significativos del proceso realizado en esta etapa son:

- Se mantiene calendario para cada evento (fin de semana: ejecución) se compondrá de otros tres eventos previos para preparar y organizar (lunes-miércoles-viernes).
- Se ofrece programación trimestral de talleres para ejecución de trabajos pendientes
- Se trata de definir, sin llegar a definición aceptada y compartida, el proceso de retorno económico para todos los participantes
- Se trata de definir proceso, sin llegar a implementar, de comprobación y autoevaluación de capacidades de los participantes para mejorar gestión de tomas de decisiones en situ

La situación del proyecto en el momento de iniciar esta fase se puede definir como resultados de los eventos y procesos acontecidos en la fase anterior. En el mes de Agosto sabemos que:

- La subvención pedida al ayuntamiento ha estado inicialmente aprobada.
- Todos los elementos estructurales de la obra están terminados.
- Disponemos de todos los materiales necesarios a la terminación y acabados del edificio con excepción de aislamiento de cubierta inclinada.
- La ejecución de partes de la obra en colaboración con entidades externas al grupo inicial de proyecto (firmas de cartas de compromiso) implica una gestión diferente de los procesos de convocatoria y de los resultados esperados: convocatorias no pueden ser abiertas y gestión y planificación de las mismas no puede realizarse mediante la plataforma on-line
- El proyecto será sometido a presión evaluación del ayuntamiento prevista para septiembre-octubre. El inicio posterior de la campaña electoral para

las elecciones municipales probablemente afectará a todos los proyectos del Pla de Buits.

A partir de final de Noviembre 2014 el proyecto se transforma en sus recursos y herramientas de gestión. La transición se realiza a lo largo de 3 meses hasta Febrero 2015 fecha en que se completa el retorno a co-financiadores.

Indice de decisiones elaboradas en eventos de esta fase

Agosto:

- diseño alternativas de acabados exteriores (carpintería exterior- Revestimientos y gestión de verde)
- debate y diseño alternativas para producir recursos recursos económicos para el proyecto: planes de inversión de subvención recibida

Septiembre:

- experimentación con soluciones alternativas para carpintería exterior y zona de vallado del área no cubierta del proyecto
- re-diseño de acabado de muro de Cal y Cañamo
- participación del proyecto en Dutch Design Week de Eindhoven

Octubre:

- experimentación con soluciones alternativas para carpintería exterior y cubiertas
- experimentación con actividades de intercambio: mercadillo-
- programación de actividades con planificación mensual en vez que semanal
- experimentación con integración de personas pagadas para realizar el seguimiento de gestión y preparación espacio para los eventos y apertura diaria en horarios establecidos

Noviembre:

- experimentación de programación actividades con planificación de actividades bimestrales
- elección de nueva junta de la asociación BaM

Transición:

- dimisión unilateral por decisión propia de la presidente de la junta de BaM
- diseño de soluciones para acabados de fachadas
- traspaso de administración de herramientas de gestión de proyecto: eventbrite-trello, mailchimp, web, modelo de cartel evento, datos materiales y empresas colaboradoras

Section 1

Agosto 014

Fotos Evento 7.1 Encuentros semanales en el solar



Section 2

Cierre Protección

210 Invitaciones enviadas 9 registros 39 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - septiembre (eventos periódicos).

Opciones de entrada: a) mañana b) tarde c) voy a pasar un rato

Fin de semanas de trabajo de preparación colectivo para proteger de la lluvia y poner en seguridad el espacio - la sala para su uso colectivo y para el barrio : aquí te puedes registrar ! El programa se definirá unos días antes en función de nº de personas inscritas y de los materiales que hayan llegado.

Los trabajos a realizar para poner en seguridad la obra son:

- impermeabilización de cubiertas
- remate muro de paja
- lucernario y protección estructura Tous
- uso o limpieza de materiales compostables en almacén

Texto mail -web Crowdfunding - Septiembre 22

Sorprendentes sábados de septiembre..

22 | 09 | 2014

Aquí el video de los dos últimos sorprendentes sábados...con **Delirium Mark-Bcn** y Vallas espaciales ... y queda pendiente video del genial parking day montado por **Cristina Casali y Beatriz Cristobal** el próximo sábado es el aniversario de Txema ..la emoción es grande...

Hola «Asistente»,

Te invitamos al siguiente evento:

CIERRE PROTECCIÓN

Evento que se celebrará a la hora y en la fecha y ubicación siguientes:

Varias fechas

BioBui(L)t-Txema

c/montalegre 4

08001 Barcelona

España



[Ver mapa](#)

Asistir al evento

Compartir:



Hola!! gracias a tod@s!! hemos conseguido proteger el muro Greb y empezado el muro de botellas!!

este sábado 13 hay prueba de colaboración mercadillo! el 19 quizá conseguimos participar en el Parking day..y el día 20 y 27 seguimos protegiendo del agua!! vamos a mirar como ejecutar cubierta plana con visrio celular y en seco!! acordaros que nos ayuda mucho el registro de presencias!! estamos construyendo entre todo@s. Vuestro registro y presencia os dará puntos y permitirá auto-acreditar vuestra aportación y formación! aquí el pequeño resumen de agosto y primer sábado de septiembre http://youtu.be/-wmhQk3eAd8?list=PLaEELru1cJorNN6pP9j_TJC_Eeluc49Y

Fin de semanas de trabajo de preparación colectivo para proteger de la lluvia y poner en seguridad el espacio - la sala para su uso colectivo y para el barrio : aquí te puedes registrar ! El programa se definirá unos días antes en función de nº de personas inscritas y de los materiales que hayan llegado. Los trabajos a realizar para poner en seguridad la obra son: impermeabilización de...

Comparte este evento en [Facebook](#) y [Twitter](#)

Esperamos que puedas venir.

Un saludo,

BaM Bioarquitectura Mediterrània

Fotos Evento 7.2 06|09|2014



1 of 55

Fotos Evento 7.3 13|09|2014



1 of 39

Fotos Evento 7.4 19|09|14



• • • • •

Fotos Evento 7.5 20|09|14



1 of 74

Fotos Evento 7.6 22|09|14 Parking Day



Section 3

Asamblea soci@s BaM

23|09|2014

132 Invitaciones enviadas 5 registros 7 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - septiembre 12 (11 días antes del evento).

Opciones de entrada: a) soci@ desde febrero 2013 b) soci@ desde congreso mayo 2013 c) soci@ desde flash/crowdfunding d) voluntari@



Estimad@s,

En febrero 2013, en el segundo año de vida de la asociación, empezamos a registrar la inscripción de soci@s que siguió en los días de II Congreso de Arquitectura i Salut i se ha ampliado con el crowdfunding.

¡Hacemos la primera asamblea anual con más invitaciones a enviar... no solamente la junta!

Están invitados los socios que ya tienen carnet y todas las personas que por haber participado en crowdfunding y/o flashunding son automáticamente soci@s para este año. También invi-

tamos los voluntari@s que hayan participado en más de cinco eventos del proyecto BioBui(L)t.

La Asamblea anual tendrá lugar el día 23 de septiembre a las 18.30h en primera convocatoria y a las 19h en segunda convocatoria en el espacio BioBui(l)T-Txema de la calle Montalegre 5 de Barcelona.

Para confirmar vuestra asistencia tenéis registro entrada abajo

Orden del día

- Lectura y aprobación acta anterior
- Estado actual de la Asociación
- Proyectos actuales

- Estado de cuentas
- Renovación de Junta
- Ruegos y preguntas

Fins aviat! salutacions cordials Junta BaM

Valentina, Elisabet, Silvia, Toni

Texto mail -web Crowdfunding - Septiembre 22

Agosto e inicio se Septiembre

22 | 09 | 2014

hola! estimados co-financiadores... la pagina se ha quedado sin actualizar este agosto- septiembre!

aqui los videos de avances de agosto (homenaje a los Ramones obligatorio este verano :-)

recordar que estamos este próximo sabado en el solar y que tenemos ya las camisetas además del libro.

Gracias a tod@s!!!!

Section 4

¡Un año! ¡Sin Vallas!

27|09|2014

224 Invitaciones enviadas 15 registros 38 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - septiembre 23 (4 días antes).

Opciones de entrada: a) paso a saludar b) estaré a las 13 por el brindis c) quiero participar en taller botellas 10-13h d) quiero ayudar en montaje de cubierta 15-20h e) quiero colaborar en lo que sea 10-13 f) quiero colaborar en lo que sea 15-20



Estimad@s! gracias, gracias gracias!! estas primeras semanas de septiembre han sido sorprendentes! aqui el ya clasico video! <http://youtu.be/0k9QxV7q5lw>
Este Sabado 27 es dia especial!

En 2 de Julio 2013 conseguimos entrar un dia para tomar medidas... justo un año después conseguimos colocar la cubierta. El 29 Septiembre 2013 con un proyecto diseñado entre tod@s y aun sin poder acceder al solar, nos encontramos en el solar para empezar la campaña de crowdfunding y vivimos una emoción muy grande e intensa junto a la familia de Txema, una emoción que nos abrió los corazones y las perspectivas. Un año después queremos celebrar la energía de tod@s y el ánimo de Txema quitando la valla!

¡Pasa a saludar-visitar- colaborar-conocer-imaginar!

Trae tu botella de Vichy-Catalan para construir junt@s una fachada de vidrio

¡Arnau de Caseta de palla nos mostrara como cortar el vidrio

Andrea nos enseñara como integrar el ganchillo en arquitectura!

Cristina y Bea nos enseñaran la experiencia vivida en el Parking Day

Con Angeline celebraremos el evento con un mural especial

Lucas y Stefania nos apoyan con musica y pica pica, trae algo para beber a las 13 haremos un brindis para todo@s, los que estan y los que no estan. (disculpar errores hay problemas de teclado)

Os esperamos! un abrazo!

Texto mail -retorno a los asistentes Septiembre 28

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

Ayer era un dia muy especial y ha sido un dia muy especial... lleno de una luz interior maravillosa! gracias a tod@s vosotr@s! y la belleza del camino hecho y el camino por hacer! ojala el video exprese esta bella energia! Felicidades a tod@s!!

<http://youtu.be/OT9NcreD6VM>

Texto mail -web Crowdfunding - Septiembre 28

First Anniversary

28 | 09 | 2014

Estiamd@s, Dear Co-financers, ayer fue un dia muy especial el aniversario de la salida a la calle del proyecto y el inicio de la campaña de crowdfunding...y el aniversario de la perdida de Txema.que nos abrio los corazones. aqui el video que esperamos os transmita la belleza de la luz interior y exterior que se ha creado tambien gracias a vosotr@s. Felicidades a todo@s!

aqui el texto del cartel de la actividad:

En 2 de Julio 2013 conseguimos entrar un dia para tomar medidas... justo un año después conseguimos colocar la cubierta. El 29 Septiembre 2013 con un proyecto diseñado entre tod@s y aun sin poder acceder al solar, nos encontramos en el solar para empezar la campaña de crowdfunding y vivimos una emoción muy grande e intensa junto a la familia de Txema, una emoción que nos abrió los corazones y las perspectivas. Un año después queremos celebrar la energía de tod@s y el ánimo de Txema quitando la valla!

¡Pasa a saludar-visitar- colaborar-conocer-imaginar!

Trae tu botella de Vichy-Catalan para construir junt@s una fachada de vidrio

¡Arnau de Caseta de palla nos mostrara como cortar el vidrio

Andrea nos enseñara como integrar el ganchillo en arquitectura!

Cristina y Bea nos enseñaran la experiencia vivida en el Parking Day


Con Angeline celebraremos el evento con un mural especial

Fotos Evento 7.7 24|09|14 Preparación



personal **col·lectiu** | bé comú = **Ri(NT)**

Fotos Evento 7.8 27|09| 14 Primer Aniversario

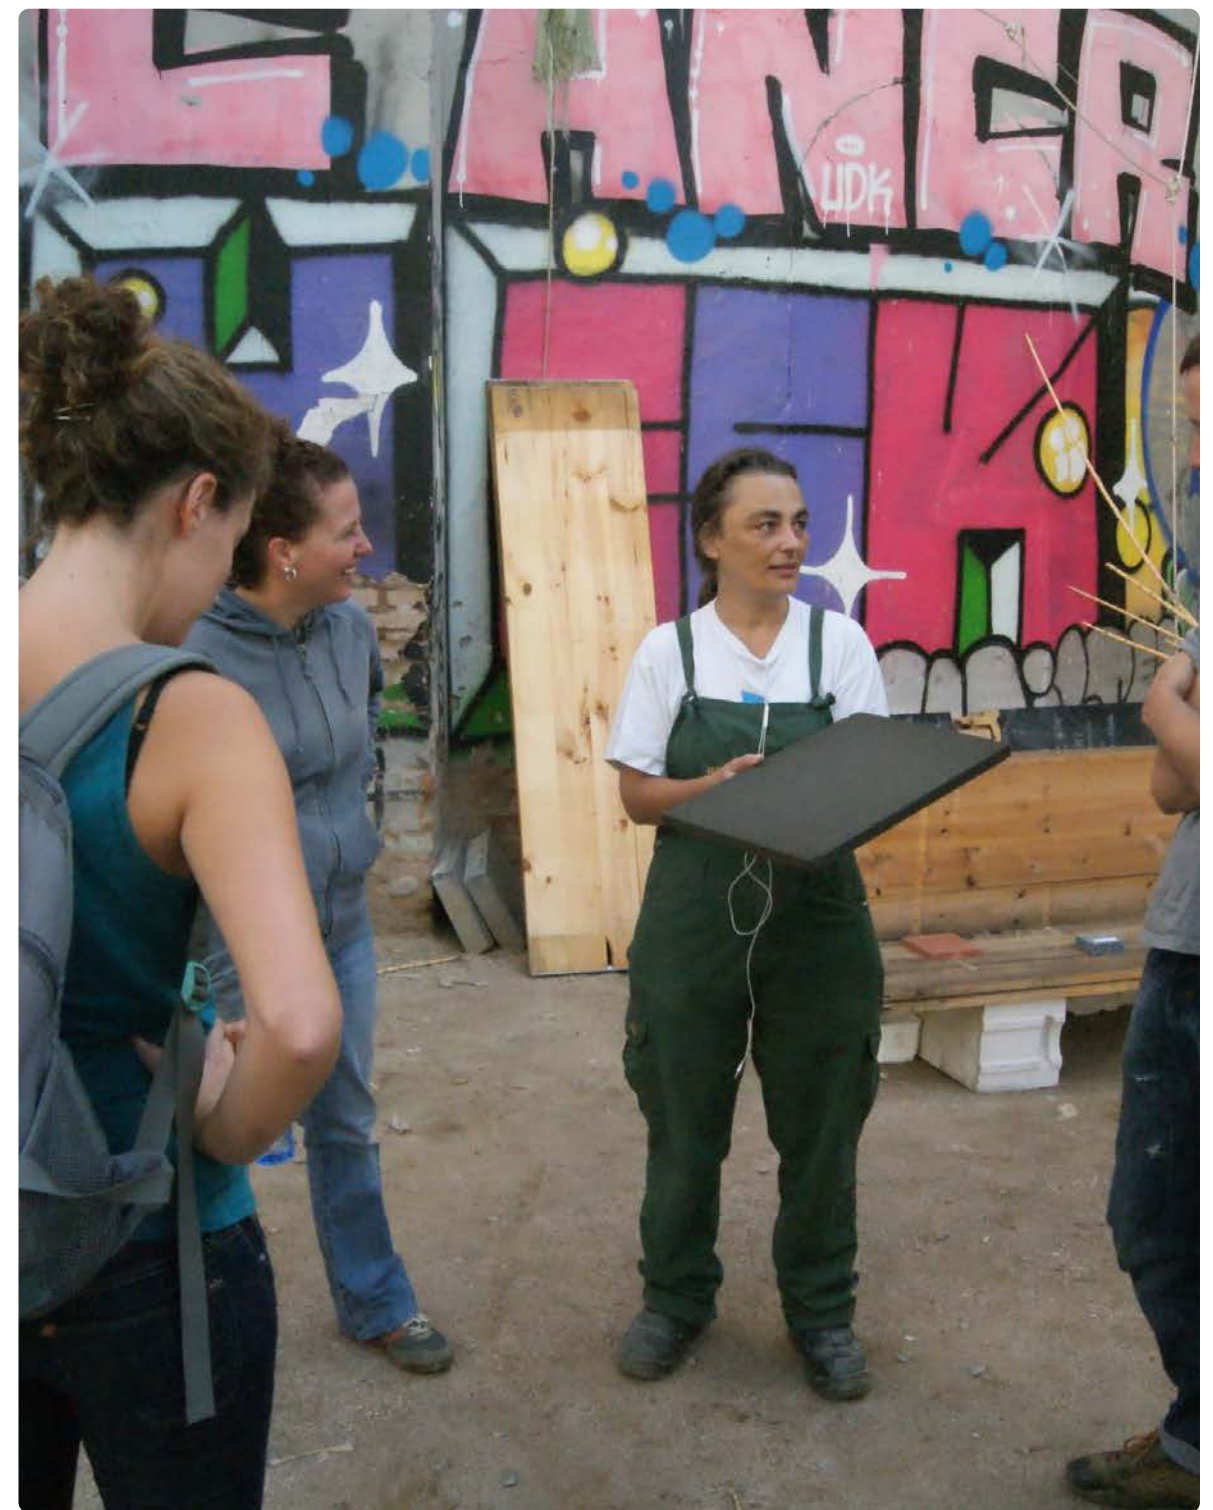

Section 5

Cubiertas·Fachadas·Crochet

232 Invitaciones enviadas 15 registros 38 asistentes acreditados



Texto mail Convocatoria - septiembre 30 (4 días antes).

Evento periodico Sábados:

04|10|2014: 11 asistentes registrados

25|10| 2014: 10 asistentes registrados

08|11|2014: 20 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en varios eventos c) solo quiero curiosear

Vamos a aprender a colocar aislamientos -laminas impermeables permeables al vapor y realizacion de pluviales!

232 Invitaciones enviadas 15 registros 38 asistentes acreditados



Texto mail Convocatoria - septiembre 30 (4 días antes).

Evento periodico Sábados:

04|10|2014: 10 asistentes registrados

25|10| 2014: 2 asistentes registrados

08|11|2014: 2 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en varios eventos c) solo quiero curiosear

Como re-utilizar vidrio, Proteger Muro de Greb y opciones de diseño de gran ventanal

232 Invitaciones enviadas 15 registros 38 asistentes acreditados



Texto mail Convocatoria - septiembre 30 (4 días antes).

Evento periodico Sábados:

04|10|2014: 11 asistentes registrados

11|10| 2014: 10 asistentes registrados

18|11|2014: 20 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en varios eventos c) solo quiero curiosear


la arquitecta **Andrea Castillo** y las **asociacion de puntaires** nos guiaran en la ejecución de una valla suave con crochet... trasformamos los conceptos y las herramientas de obra!

Fotos Evento 7.9 02|10|14 (preparación 02-03|10|14)



1 of 35

Fotos Evento 7.10 04|10|14

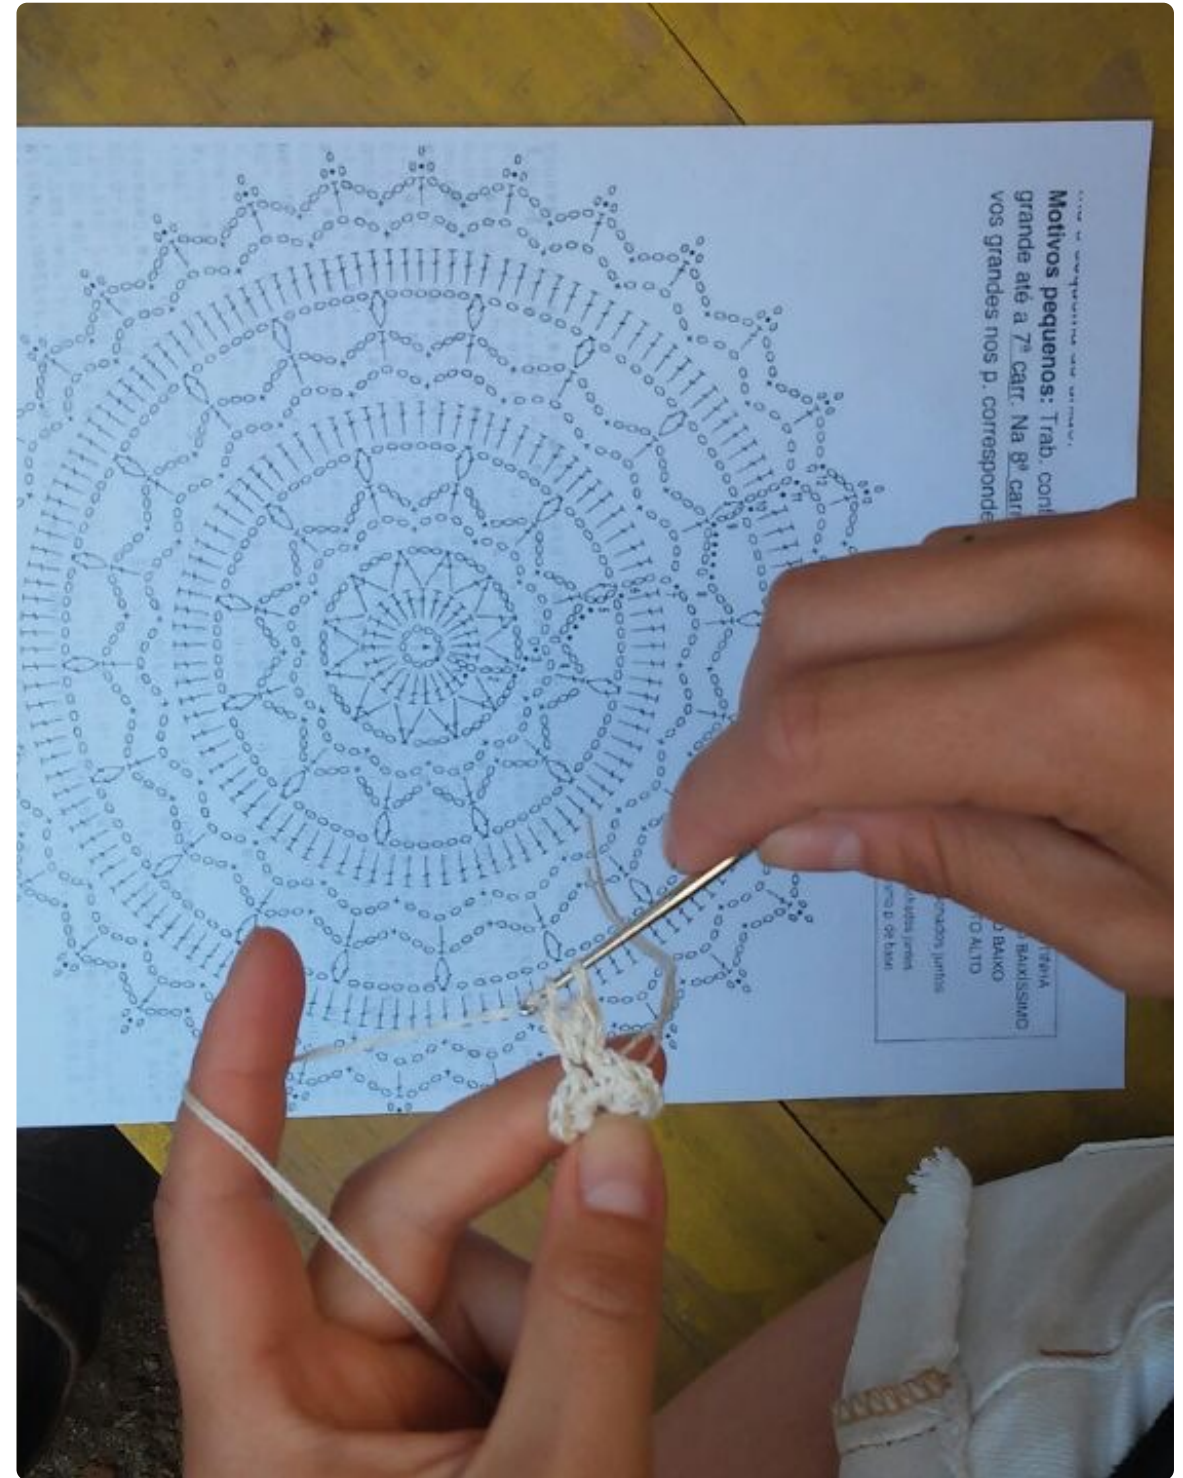

1 of 152

Fotos Evento 7.11 11|10|14 Preparación DDW



1 of 23

Fotos Evento 7.12 20|10|14 Pensando en acabados



• • • • • • • • • •

Section 6

Mercadillo

11|10|2014-25|12|2014

0 Invitaciones enviadas 0 registros 0 asistentes acreditados

Texto Convocatoria - septiembre 30 (4 días antes).

Opciones de entrada: a) quiero pasar a visitar b) quiero tener una parada c) quiero ayudar a BioBui(L)t

Con Delirium Market el espacio BioBui(L)t se llena de vida!! Si teneís algo para exponer.. registrar vuestro pedido de parada y os pondremos en contacto con Delirium Market.. el coste de la parada en esta fase inicial es de 15€ destinados al trabajo de difusión del mercadillo y la musica que nos acompaña!

También hay registro para persona que nos quieran ayudar a mantener la parada de BioBui(L)t en el mercadillo donde hay folletos informativos y los libros y camisetas del proyecto



Web : <http://bamconf.org>
Canal Youtube : <https://www.youtube.com/user/BAMconf>
Calendari: <http://bioarquitecturamediterranea.eventbrite.es>
Facebook: <https://www.facebook.com/BioarMed>
Twitter: @BAMconf


personal **n** col·lectiu **U** bé comú = Bui(L)t



DE 11 A 21H

11/10/14
01/11/14
06/12/14
24-25/12/14

ESPAI TXEMA
C/MONTALEGRE 4
08001
BARCELONA



Section 7

Mural Cal



232 Invitaciones enviadas 7 registros 19 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - septiembre 30 (20 días antes).

Evento periodico Sábados:

20|10|2014: 14 asistentes registrados

22|10| 2014: 5 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en varios eventos c) solo quiero curiosear

Acabado de muro de Cal y Cañamo con Pinturas a la Cal

Mural diseñado por Clara Diego

Con la colaboracion de Pere Juanola-Hemp Ecosystem

Dutch Design Week

Exposición del proyecto y de los materiales de BioBui(L)t-Txema en el evento Holandes en el marco de las iniciativas del colectivo Umbrella Network y gracias a S.Deher participante activa en la fase 1 y parte del grupo Permacultura Barcelona

Fotos Evento 7.13 22|10|14 DDW y Mural



Section 8

Terrazas

232 Invitaciones enviadas 7 registros 19 asistentes acreditados



Texto mail Convocatoria - septiembre 30 (20 días antes).

Evento periodico Sábados:

25|10|2014: 6 asistentes registrados

08|11| 2014: 4 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en varios eventos c) solo quiero curiosear

Estamos realizando una terraza desmontable con materiales re-utilizados!!!

Mensaje a los asistentes registrados Noviembre 7

Un mensaje de BaM Bioarquitectura Mediterránea:

hola!! ¡gracias por estar mañana a colaborar en la fase de cierre de la sala!

¡Ayuda muchísimo estar en el solar en horario para organizarse y compartir-- hay 18 personas apuntadas tendremos que organizar grupos etc.. es importante respetar horarios ;-)

inicio a la mañana 10h

pausa comida -reflexión de 14 a 15h

inicio por la tarde a las 15.30h

cierre previsto a las 19 h

fins demà!

Fotos Evento 7.14 25|10|14



1 of 64

Fotos Evento 7.15 27|10|14




Fotos Evento 7.16 03|11|14



Fotos Evento 7.17 05|11|14



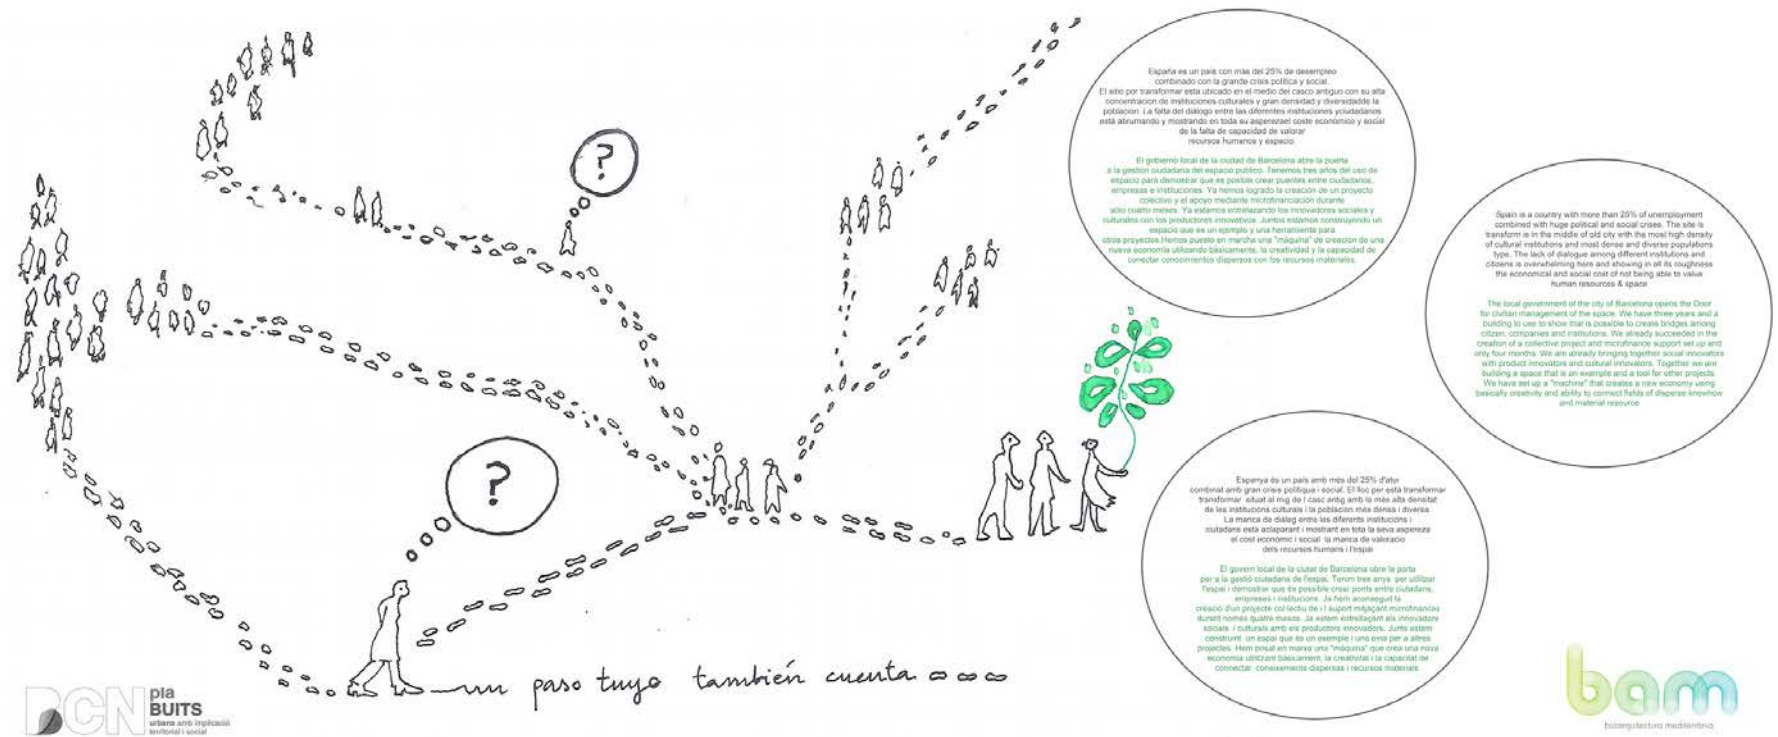

Fotos Evento 7.18 07|11|14



Section 9

Pavimentos Iluminación

254 Invitaciones enviadas 4 registros 35 asistentes acreditados



Texto mail Convocatoria - Noviembre 9 (6 días antes).

Evento periodico Sábados:

15|11|2014: 16 asistentes registrados

22|11| 2014: 12 asistentes registrados

29|11|2014: 07 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en varios eventos c) solo quiero curiosear

Paisaje Interior: Ejecucion de aislamiento-niveles y acabado de pavimento interior con corcho granular-cal y tableros de encofrado para posterior acabado con aceites naturales.

Mensaje a los asistentes registrados Noviembre 9

¡Hola! ayer otro esplendido día en el solar!! Geniales somos ;-) !! muchas visitas y mucho intercambio! aqui el pequeño [video](#) prueba de resumen..podemos compartir las fotos en el grupo voluntarios de Facebook ! la semana que viene estamos sabado y domingo! para terminar impermeabilizar con ayuda de instalador epdm. Y seguimos con recogida de botellas Vichy para muro y... Tapones corcho para evento paisaje interior -pavimento!! ..a beber vino por la causa ;-)) y es muy guay: la gente se para y se hace fotos delante de "nuestro" mural !

Paisaje Interior: Ejecucion de aislamiento-niveles y acabado de pavimento interior con corcho granular-cal y tableros de encofrado para posterior acabado con aceites naturales

254 Invitaciones enviadas 4 registros 35 asistentes acreditados



Texto mail Convocatoria - Noviembre 9 (6 días antes).

Evento periodico Sábados:

15|11|2014: 16 asistentes registrados

22|11| 2014: 12 asistentes registrados

29|11|2014: 07 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) soy profesional del sector b) no soy profesional del sector

Ejecucion de instalacion electrica de minimos para iluminacion interior y creacion de espacio sensorial.
Hablaemos de temas de contaminación electro-magnetica.
Considerada la delicadeza de este trabajo no se admite el registro de personas que no tengan disponibilidad para estar a lo largo del ciclo completo de ejecución..



Section 10

2ª Asamblea de soci@s

21|11|2014

264 Invitaciones enviadas 4 registros 11 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Octubre 9 y Noviembre 6.

Opciones de entrada: a) soci@ desde febrero 2013 b) soci@ desde congreso mayo 2013 c) soci@ desde flash/crowdfunding d) voluntari@



Estimad@s,

En febrero 2013, en el segundo año de vida de la asociación, empezamos a registrar la inscripción de soci@s que siguió en los días de II Congreso de Arquitectura i Salut i se ha ampliado con el crowdfunding.

Están invitados los socios que ya tienen carnet y todas las personas que por haber participado en crowdfunding y/o flashunding son automáticamente soci@s para este año. También invitamos los voluntari@s que hayan participado en más de cinco eventos del proyecto BioBui(L)t.

La Asamblea anual tendrá lugar el día 21 de Noviembre a las 18.30h en primera convocatoria

y a las 19h en segunda convocatoria en el espacio BioBui(l)T-Txema de la calle Montalegre 5 de Barcelona.

Para confirmar vuestra asistencia tenéis registro entrada abajo. Orden del día

Lectura y aprobación acta anterior

Estado actual de la Asociación

Proyectos actuales

Estado de cuentas

Renovación de Junta

Ruegos y preguntas

Fins aviat! salutacions cordials Junta BaM

Valentina, Elisabet, Silvia, Toni

Participació en Consell

27|11|2014

132 Invitaciones enviadas 2 registros 3 asistentes acreditados

Texto mail Convocatoria - Noviembre 25

Opciones de entrada: a) si me interesa participar activamente b) si me parece interesante que BaM participe c) no me parece interesante

Hola Tod*s, se ha presentado la posibilidad de participar a una iniciativa promovida por Barcelona Sostenible.

A seguir invio todos los detalles y las explicaciones para entender al asunto.

Hay tiempo hasta el día 28 de noviembre para presentar las candidaturas.

¿alguien se anima y está interesad*?

Saludos.

00> documentos adjuntos:

- > informe iniciativa Fem Xarxingb
- > ficha de candidatura

01> convocatoria

Benvolguts, benvolgudes,

Us fem arribar l'informe de la jornada Fem Xarxing, Fem Consell, que va tenir lloc el passat 4 de novembre a la Casa de Convalescència.

El document conté un resum de la jornada, els comentaris sorgits durant les dinàmiques de treball, el llistat de les organitzacions assistents i, finalment, les valoracions rebudes després de la sessió.

Us informem que ja són públiques les llistes definitives dels signants del Compromís classificats per sectors i us recordem que fins el 28 de novembre és obert el període de presentació de candidatures per formar part del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

Ben cordialment,

--

Secretaria Barcelona + Sostenible

c. Nil Fabra, 20. 08012 Barcelona

Tel. 93 256 25 93

A/e: bcnsostenible@bcn.cat

www.bcn.cat/bcnsostenible

02> resumen informe de la reunió escrito por Cristina Casali:

Fem Xarxing. Fem consell. Casa Convalescència, Barcelona

Assisteix Cristina Casali, en nom del Bam

- Transparència

El sector de les empreses considera que s'ha de treballar l'eficiència energètica i la mobilitat.

- El sector de les universitats:

El turisme, la mobilitat, els residus, la conscienciació i considera que s'ha de fer servir les universitats com un servei per a les ciutats.

- Els col·legis professionals:

el turisme, els residus, la contaminació, la mobilitat, la sensibilització ciutadana, altres maneres de consumir i l'eficiència energètica, tant en habitatge com en disseny urbà

La idea és presentar candidatures per a estar en el consell, les associacions o entitats que no estiguin en el consell crearan grups de treball per a poder participar.

Les candidatures es poden presentar des del 10 de novembre fins al 28 de novembre i s'aniran penjant les diferents candidatures que es presentin.

Han d'haver hi dues entitats signants del Compromís que recolzin la candidatura

Si hi ha més candidats dels que hi pot haver es farà un procés electiu.

Al gener hi haurà un decret de l'alcaldia amb la composició del consell.

Fotos Evento 7.20 21|11|2014



Section 11

Aislamientos-Acabados

0 Invitaciones enviadas 0 registros 0 asistentes acreditados



Texto Convocatoria Web - septiembre 30

Evento periodico Sábados:

13|12|2014: 0 asistentes registrados

20|12| 2014: 0 asistentes registrados

27|12| 2014: 0 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en todo el ciclo (3 eventos) c) solo quiero curiosear

Montaje de soluciones de aislamiento con materiales compostables para interiores-fachada interior del muro de Greb. Es prevista la colocacion de placas de viruta de madera- cañamo- celulosa en mantas



Evento periodico Sábados:

13|12|2014: 0 asistentes registrados

20|12| 2014: 0 asistentes registrados

27|12| 2014: 0 asistentes registrados

Opciones de entrada: a) voy a participar solo en un evento b) voy a participar en todo el ciclo (3 eventos) c) solo quiero curiosear

Diseño y Ejecucion de acabados interiores con arcilla-

Fotos Evento 7.21 05|12|2014



Fotos Evento 7.22 06|12|2014



1 of 74

Fotos Evento 7.24 12|12|2014




• • • • •

Fotos Evento 7.23 09|12|2014



• •

Fotos Evento 7.25 19|12|2014

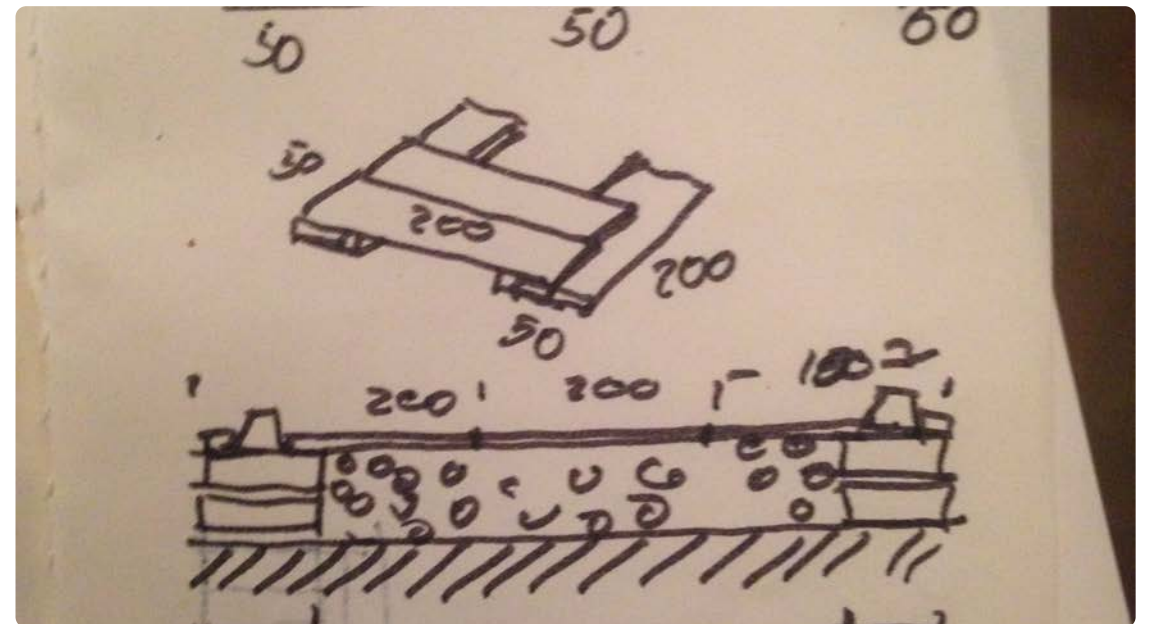

• • •

Fotos Evento 7.26 20|12|2014



Conclusiones

Con cada cambio de fase el proceso de desarrollo del proyecto adquiere un grado de complejidad mayor en cuanto a gestión de los recursos, gestión de las oportunidades y de los riesgos.

En cada fase hay momentos de crisis grave de disponibilidad de recursos materiales y/o personales. En cada fase estos momentos de crisis se han superado adaptando el proyecto por un lado a los recursos materiales y personales disponibles, por el otro a las nuevas oportunidades creadas y encontradas.

En cada fase se ha tratado de construir, sin éxito, un equipo estable que pudiese compartir de forma constante las responsabilidades asociadas a la comunicación, búsqueda y coordinación de recursos materiales y personales, organización y preparación del espacio para los eventos. Hasta la fase “Closing” el proyecto ha conseguido superar sus momentos de crisis y ha sabido integrar las nuevas oportunidades y recursos disponibles gracias a la respuesta creativa inmediata de los participantes en el espacio de la obra, en el espacio del trello y de la persona responsable de los “canales administrados” (web-facebook-mail de BaM)

La fase Closing inicia con el final de la obra estructural del espacio físico y coincide con la necesidad imperativa de dar estructura a un equipo de gestión que pueda asumir el reto/oportunidad/responsabilidad de la ayuda recibida hasta el momento, para terminar la obra y desarrollar el proyecto que ya no es “potencial” sino una realidad. Esta fase hay una sub-fase de estudio y re-ajuste, se desarrolla a lo largo de Agosto-Noviembre, mientras, se mantiene la base de la estructura de comunicación de las fases precedentes. A partir de noviembre y hasta febrero se consume la transformación del proceso de toma de decisiones y cambio en gestión de comunicación que pasa a ser finalmente gestionado por la nueva junta de la asociación BaM.

Los documentos aquí reunidos ayudan a recordar una vivencia compartida por muchos, creada por cada uno y hecha posible gracias a la asociación BaM y el proyecto Pla de Buits del Ayuntamiento de Barcelona.

Figura 8.1 Flujo Eventos-Participantes -Ficha Materia-

